


# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Diciembre / 2017**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/01/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,879,175.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,879,175.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	28,473,144.50	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31 62.65%	Monto por desembolsar USDS	1,448,734.69 37.35%

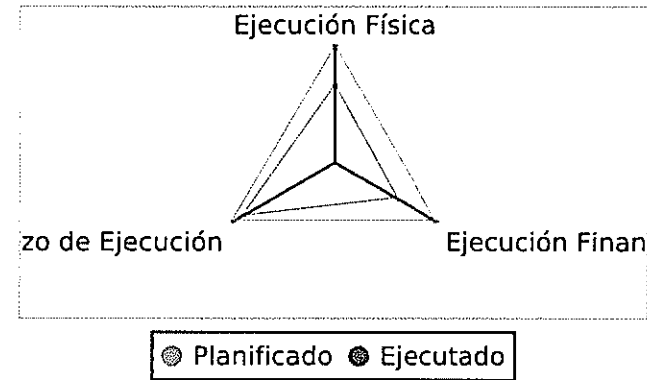

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



*Handwritten signature or initials.*

Ejecución Financiera Anual		Ejecución Financiera Dic 2017		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	43,636,371.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	47,507,152.48	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	4,128,463.07	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	8.69%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	101.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

9.0

## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	0		11		0	8	11	8
Informes de Supervision de Remozamientos	Unidad	6	6	6	3	0	3	12	12
Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	Unidad	0		1		0		1	
<b>Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>									
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	Unidad	0		15	2	15	13	30	15
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)	Unidad	0		1	1	0		1	1
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	0		1	1	0	0	1	1
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II	Unidad	0		1		0	1	1	1

g. d

## Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>											
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	18/01/2017	18/01/2017	24/03/2017	27/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	23/05/2017	26/05/2017	28/08/2017
<b>Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)</b>											
Bien	Licitación Pública Nacional	11/11/2016	11/11/2016	14/02/2017	15/05/2017	13/03/2017	13/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	30/05/2017	
<b>Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial</b>											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/10/2016	07/11/2016	13/12/2016	13/12/2016	04/01/2017	09/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	15/05/2017	26/06/2017
<b>Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II</b>											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/11/2016	16/12/2016	21/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	19/05/2017	28/04/2017	12/06/2017	15/05/2017	13/09/2017
<b>Administración</b>											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Bienes, insumos y/o Servicios	Comparación de Precios	04/01/2017	04/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	12/04/2017	12/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	05/05/2017

# Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>													
<b>Remozamiento de Juzgados de Paz</b>													
Servicios	0.00	347,610.00	2,863,432.00	195,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,394.00
<b>Informes de Supervision de Remozamientos</b>													
Servicios	0.00	102,000.00	81,600.00	20,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,007.00
<b>Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva</b>													
Servicios	4,807.00	0.00	0.00	50,625.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,807.00
<b>Total componente</b>	<b>4,807.00</b>	<b>449,610.00</b>	<b>2,945,032.00</b>	<b>266,384.00</b>	<b>30,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,696,208.00</b>
<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>													
<b>Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	555,989.00
<b>Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)</b>													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00
<b>Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	189,000.00
<b>Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II</b>													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,057.00	0.00	0.00	37,057.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	140,109.00	103,052.00	103,052.00	1,241,421.00
<b>Administración</b>													
<b>Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa</b>													
Bienes, insumos y/o Servicios	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
<b>Total componente</b>	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
<b>Total</b>	122,722.00	489,600.00	2,955,022.00	276,374.00	523,365.00	113,042.00	160,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00	5,207,741.00

### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Re...

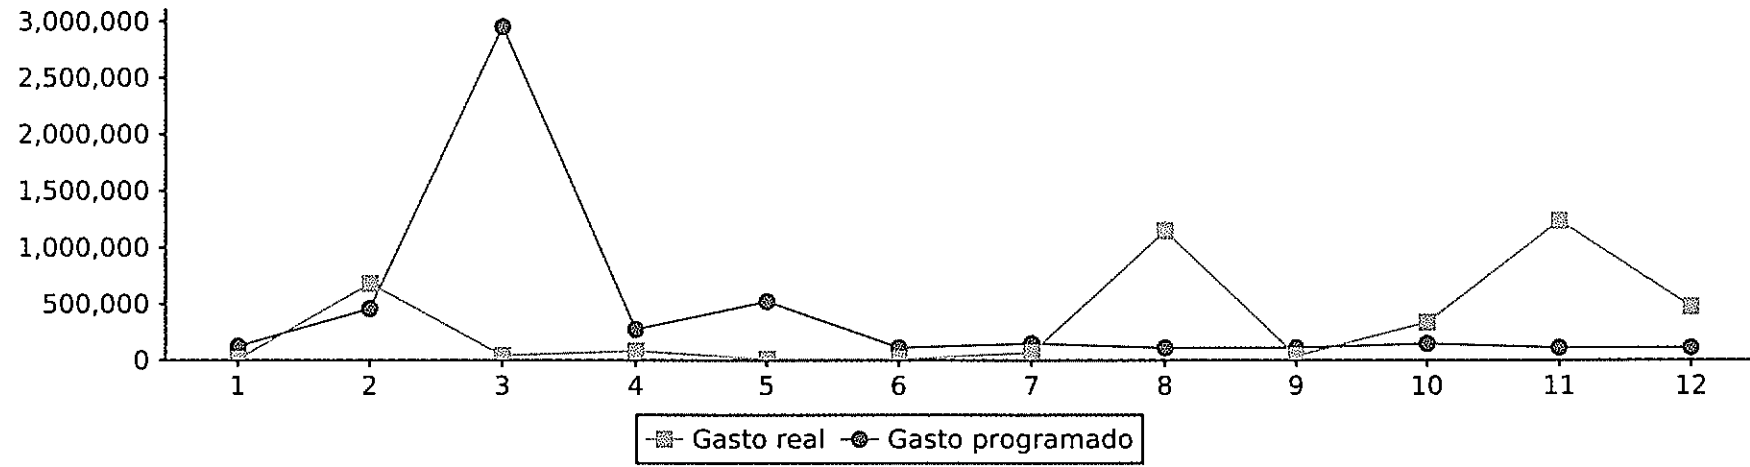

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	681,279.26	43,153.33	82,500.00	10,000.00	10,000.00	67,526.52	1,148,403.69	38,000.00	337,838.40	1,235,323.30	474,438.57
<b>Gasto programado</b>	127,529.00	459,600.00	2,955,022.00	276,374.00	523,365.00	113,042.00	150,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00
<b>Total Gasto real</b>												4,128,463.07
<b>Total Gasto programado</b>												5,207,741.00

*g.*

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
0	No 0		92%	PEP_SMART_1905,0	1342 días	mié 02/01/13	vie 29/03/18	mié 02/01/13		NOD	\$2,120,387 Fin	\$1,904,587	\$0
1	No 1		91%	Componente 1: Acceso a la Justicia	1334 días	mié 02/01/13	lun 19/03/18	mié 02/01/13		NOD	\$519,179 Fin	\$455,684	\$0
2	No 1.1		100%	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
3	No 1.1.1		100%	Centros Integrados de Justicia funcionando	1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
4	No 1.1.1.1		100%	CJ de Villa Nueva, Guatemala	1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
5	No 1.1.1.1.1		100%	Proceso de contratación: Consultores Dibujantes (2 consultores)	191 días	vie 17/03/16	mié 14/12/16	vie 17/03/16	mié 14/12/16		\$6,243 Fin	\$6,243	\$0
16	No 1.1.1.1.2		100%	Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)	152 días	vie 20/05/16	lun 26/12/16	vie 20/05/16	lun 26/12/16		\$689 Fin	\$689	\$0
30	No 1.1.1.1.3		100%	Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y/o)	410 días	mié 02/01/13	mar 29/07/14	mié 02/01/13	mar 29/07/14		\$11,509 Fin	\$11,509	\$0
38	No 1.2		91%	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	603 días	mar 03/11/11	lun 19/03/18	mar 03/11/15		NOD	\$500,738 Fin	\$437,243	\$0
39	No 1.2.1		91%	Juzgados de Paz funcionando	603 días	mar 03/11/11	lun 19/03/18	mar 03/11/15		NOD	\$500,738 Fin	\$437,243	\$0
40	No 1.2.1.1		100%	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	30 días	lun 07/12/15	lun 25/01/16	lun 07/12/15	lun 25/01/16		\$0 Fin	\$0	\$0
41	No 1.2.1.2		90%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	1603 días	mar 03/11/11	lun 19/03/18	mar 03/11/15		NOD	\$479,551 Fin	\$416,056	\$0
42	No 1.2.1.2.1		100%	Etapas de Adquisición:	284 días	mar 03/11/11	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
51	No 1.2.1.2.2		100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	392 días	vie 13/05/16	lun 30/11/17	vie 13/05/16	lun 30/11/17		\$107,727 Fin	\$107,727	\$0
64	No 1.2.1.2.3		29%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,438 Fin	\$52,943	\$0
65	Si 1.2.1.2.3.1		29%	KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,438 Fin	\$52,943	\$0
66	No 1.2.1.2.3.1		100%	Publicación / Invitación	20 días	vie 13/05/16	vie 09/06/16	vie 13/05/16	vie 09/06/16		\$0 Fin	\$0	\$0
67	No 1.2.1.2.3.1		10%	Juzgado de Paz, Lano El Pino, -90.6271937711941,15.106291	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
68	No 1.2.1.2.3.1		10%	Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115,15.091	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
69	No 1.2.1.2.3.1		10%	Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.8705552920673, 91	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
70	No 1.2.1.2.3.1		100%	Firma de contrato	69 días	mar 06/09/16	mar 13/12/16	mar 06/09/16	mar 13/12/16	66	\$0 Fin	\$0	\$0
71	No 1.2.1.2.3.1		100%	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San	7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17		\$0 Fin	\$0	\$0
72	No 1.2.1.2.3.1		100%	Orden de Inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Ch	5 días	lun 07/08/17	vie 11/08/17	lun 07/08/17	vie 11/08/17	71	\$0 Fin	\$0	\$0
73	No 1.2.1.2.3.1		100%	Anticipo	7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17	72	\$21,981 Fin	\$21,981	\$0
74	No 1.2.1.2.3.1		100%	Primer pago conforme a contrato	2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	73FC+1	\$19,095 Fin	\$19,095	\$0
75	No 1.2.1.2.3.1		100%	Segundo Pago conforme a contrato	2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	74	\$11,867 Fin	\$11,867	\$0
76	No 1.2.1.2.3.1		100%	Entrega y Recepción Final	2 días	jue 15/03/18	vie 16/03/18			NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
77	No 1.2.1.2.3.1		10%	Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18			NOD	\$63,495 Fin	\$0	\$0
78	No 1.2.1.2.4		100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	392 días	vie 13/05/16	lun 30/11/17	vie 13/05/16	lun 30/11/17		\$132,994 Fin	\$132,994	\$0
92	No 1.2.1.2.5		100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	392 días	vie 13/05/16	lun 30/11/17	vie 13/05/16	lun 30/11/17		\$122,392 Fin	\$122,392	\$0
106	No 1.2.1.3		100%	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	512 días	mar 08/12/15	vie 15/12/17	mar 08/12/15	vie 15/12/17		\$21,187 Fin	\$21,187	\$0
137	No 2		95%	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	962 días	mar 20/05/14	mié 28/02/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,810 Fin	\$1,198,674	\$0
138	No 2.1		95%	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas la	962 días	mar 20/05/14	mié 28/02/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,810 Fin	\$1,198,674	\$0
139	No 2.1.1		95%	Interconexión en OJ	962 días	mar 20/05/14	mié 28/02/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,810 Fin	\$1,198,674	\$0
140	No 2.1.1.1		95%	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionanc	962 días	mar 20/05/14	mié 28/02/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,810 Fin	\$1,198,674	\$0
141	No 2.1.1.1.1		100%	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/17	vie 26/09/14	vie 29/07/17		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
149	No 2.1.1.1.2		100%	Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Mic	317 días	mar 20/05/14	jue 06/08/15	mar 20/05/14	jue 06/08/15		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
156	No 2.1.1.1.3		100%	Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	247 días	mar 08/11/16	mar 31/10/17	mar 08/11/16	mar 31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
167	No 2.1.1.1.4		81%	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	342 días	mar 25/10/16	mié 28/02/18	mar 25/10/16		NOD	\$28,450 Fin	\$21,314	\$0
168	No 2.1.1.1.4.1		100%	Etapas de Adquisición:	165 días	mar 25/10/16	mar 20/06/17	mar 25/10/16	mar 20/06/17		\$0 Fin	\$0	\$0
175	No 2.1.1.1.4.1		47%	Etapas de Ejecución de Pago:	151 días	vie 28/07/17	mié 28/02/18	vie 28/07/17		NOD	\$28,450 Fin	\$21,314	\$0
176	No 2.1.1.1.4.1		100%	Producto 1	2 días	vie 28/07/17	lun 31/07/17	vie 28/07/17	lun 31/07/17	174	\$4,120 Fin	\$4,120	\$0
177	No 2.1.1.1.4.1		100%	Producto 2	5 días	vie 25/08/17	jue 31/08/17	vie 25/08/17	jue 31/08/17	176	\$3,022 Fin	\$3,022	\$0

Project: PEP_SMART_1905,0 Date: jue 04/01/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Margin de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
178	No 2.1.1.1.4.7		100%	Producto 3	17 días	vie 06/10/17	mar 31/10/17	vie 06/10/17	mar 31/10/17	177	\$2,861 Fin	\$2,861	\$0
179	No 2.1.1.1.4.7		100%	Producto 4	0 días	mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	178	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
180	No 2.1.1.1.4.7		100%	Producto 5	6 días	mié 08/11/17	mié 15/11/17	mié 08/11/17	mié 15/11/17	179	\$2,864 Fin	\$2,864	\$0
181	No 2.1.1.1.4.7		100%	Producto 6	6 días	jue 23/11/17	jue 30/11/17	jue 23/11/17	jue 30/11/17	180	\$2,997 Fin	\$2,997	\$0
182	No 2.1.1.1.4.7		100%	Producto 7	0 días	vie 08/12/17	mié 13/12/17	vie 08/12/17	mié 13/12/17	181FC+	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
183	No 2.1.1.1.4.7		0%	Producto 8	20 días	jue 04/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	182FC+	\$3,129 Fin	\$0	\$0
184	No 2.1.1.1.4.7		0%	Producto 9	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	183	\$4,006 Fin	\$0	\$0
185	No 2.1.1.1.5		100%	Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	265 días	lun 28/11/16	jue 14/12/17	lun 28/11/16	jue 14/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
195	No 2.1.1.1.6		100%	Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
205	No 2.1.1.1.7		100%	Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia	77 días	jue 05/05/16	mar 23/08/16	jue 05/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
214	No 2.1.1.1.8		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	235 días	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17	jue 14/12/17		\$5,722 Fin	\$5,722	\$0
225	No 2.1.1.1.9		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	240 días	lun 16/01/17	jue 21/12/17	lun 16/01/17	jue 21/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
239	No 2.1.1.1.10		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
253	No 2.1.1.1.11		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
265	No 2.1.1.1.12		0%		57 días	mié 29/11/17	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$70,000 Fin	\$0	\$0
266	No 2.1.1.1.12		0%	Etapas de Adquisición:	50 días	mié 29/11/17	mié 07/02/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
267	No 2.1.1.1.12		0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
268	No 2.1.1.1.12		0%	Especificaciones revisados	3 días	mié 13/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	267	\$0 Fin	\$0	\$0
269	No 2.1.1.1.12		0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	268	\$0 Fin	\$0	\$0
270	No 2.1.1.1.12		0%	Publicación / Invitación	5 días	mar 26/12/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	269	\$0 Fin	\$0	\$0
271	No 2.1.1.1.12		0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	10 días	mar 02/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	270	\$0 Fin	\$0	\$0
272	No 2.1.1.1.12		0%	NOB evaluación	9 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	271	\$0 Fin	\$0	\$0
273	No 2.1.1.1.12		0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	3 días	lun 29/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	272	\$0 Fin	\$0	\$0
274	No 2.1.1.1.12		0%	Realización de taller	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	273	\$0 Fin	\$0	\$0
275	No 2.1.1.1.12		0%	Etapas de Ejecución de pagos:	7 días	jue 08/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$70,000 Fin	\$0	\$0
277	No 3		91%	Administración	1203 días	mar 16/07/13	jue 29/03/18	mar 16/07/13			\$325,399 Fin	\$250,228	\$0
278	No 3.1		91%	Gastos indirectos e Imprevistos (OJ)	1203 días	mar 16/07/13	jue 29/03/18	mar 16/07/13			\$325,399 Fin	\$250,228	\$0
279	No 3.1.1		100%	Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
280	No 3.1.1.1		100%	Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
295	No 3.1.2		89%	Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	952 días	vie 27/06/14	lun 26/03/18	vie 27/06/14			\$147,204 Fin	\$76,729	\$0
296	No 3.1.2.1		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	278 días	mar 30/12/14	mar 09/02/16	mar 30/12/14	mar 09/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
309	No 3.1.2.2		100%	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2016	139 días	mar 30/12/14	lun 13/07/15	mar 30/12/14	lun 13/07/15		\$276 Fin	\$276	\$0
322	No 3.1.2.3		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	256 días	mar 22/12/14	lun 26/12/16	mar 22/12/15	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
334	No 3.1.2.4		100%	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 20: 84 días	84 días	mar 08/07/14	vie 31/10/14	mar 08/07/14	vie 31/10/14		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
347	No 3.1.2.5		100%	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 20: 98 días	98 días	lun 08/08/16	lun 26/12/16	lun 08/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0
360	No 3.1.2.6		100%	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	106 días	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
374	No 3.1.2.7		100%	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	82 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
387	No 3.1.2.8		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	255 días	mar 12/01/11	mié 11/01/17	mar 12/01/11	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0
399	No 3.1.2.9		100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2014	127 días	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
413	No 3.1.2.10		100%	Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año 2014	202 días	vie 01/08/14	lun 22/12/14	vie 01/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: jue 04/01/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	D	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	E	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	F	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progress manual	G	

9.0

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
427	No 3.1.2.11	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015,	68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0
440	No 3.1.2.12	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015,	72 días	lun 21/09/15	mié 06/01/16	lun 21/09/15	mié 06/01/16		\$322 Fin	\$322	\$0
453	No 3.1.2.13	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015,	80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16		\$934 Fin	\$934	\$0
466	No 3.1.2.14	100%		Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15		\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
479	No 3.1.2.15	100%		Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15		\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
492	No 3.1.2.16	100%		Proceso de Adquisición: Toner 2016	101 días	mar 02/08/16	lun 26/12/16	mar 02/08/16	lun 26/12/16		\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
505	No 3.1.2.17	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	98 días	mar 02/08/16	mar 20/12/16	mar 02/08/16	mar 20/12/16		\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
518	No 3.1.2.18	100%		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	24 días	lun 03/11/14	vie 05/12/14	lun 03/11/14	vie 05/12/14		\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
524	No 3.1.2.19	100%		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15		\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
531	No 3.1.2.20	100%		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	216 días	lun 01/02/16	mié 30/11/16	lun 01/02/16	mié 30/11/16		\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
543	No 3.1.2.21	100%		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	21 días	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17		\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
551	No 3.1.2.22	100%		Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	17 días	mié 08/11/17	jue 30/11/17	mié 08/11/17	jue 30/11/17		\$4,525 Fin	\$4,525	\$0
556	No 3.1.2.23	0%		Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2018	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$10,476 Fin	\$0	\$0
561	No 3.1.2.24	100%		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	113 días	lun 03/07/17	lun 11/12/17	lun 03/07/17	lun 11/12/17		\$13,621 Fin	\$13,621	\$0
568	No 3.1.2.25	100%		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		\$0 Fin	\$0	\$0
578	No 3.1.2.26	100%		Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	39 días	lun 06/11/17	vie 29/12/17	lun 06/11/17	vie 29/12/17		\$4,084 Fin	\$4,084	\$0
590	No 3.1.2.27	0%		Proceso de Adquisición: Dos vehículos tipo Pick Up	81 días	mié 22/11/17	jue 15/03/18		NOD	NOD	\$60,000 Fin	\$0	\$0
602	No 3.1.3	93%		Personal de la Unidad Coejecutora	1203 días	mar 16/07/13	jue 29/03/18	mar 16/07/13		NOD	\$72,855 Fin	\$68,160	\$0
603	No 3.1.3.1	100%		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2014)	158 días	vie 29/11/13	mar 08/07/14	vie 29/11/13	mar 08/07/14		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
616	No 3.1.3.2	100%		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	118 días	jue 07/07/16	lun 26/12/16	jue 07/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
629	No 3.1.3.3	100%		Proceso de Contratación: Especialista en infraestructura (año 2014)	203 días	mar 16/07/13	jue 24/04/14	mar 16/07/13	jue 24/04/14		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
642	No 3.1.3.4	100%		Proceso de contratación: Contable financiero 2015	244.88 días	mar 06/01/15	mié 23/12/15	mar 06/01/15	mié 23/12/15		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
665	No 3.1.3.5	100%		Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	238 días	vie 22/01/16	jue 22/12/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
680	No 3.1.3.6	100%		Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	273 días	lun 21/11/16	mar 19/12/17	lun 21/11/16	mar 19/12/17		\$15,545 Fin	\$15,545	\$0
698	No 3.1.3.7	8%		Proceso de Contratación: Contable Financiero 2018	78 días	lun 11/12/17	jue 29/03/18	lun 11/12/17		NOD	\$4,695 Fin	\$0	\$0
699	No 3.1.3.7.1	23%		Etapas de Adquisición:	26 días	lun 11/12/17	mar 16/01/18	lun 11/12/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
700	No 3.1.3.7.1.1	100%		Solicitud de Reconstrucción	2 días	lun 11/12/17	mar 12/12/17	lun 11/12/17	mar 12/12/17		\$0 Fin	\$0	\$0
701	No 3.1.3.7.1.2	100%		No Objeción a reconstrucción	4 días	mié 13/12/17	lun 18/12/17	mié 13/12/17	lun 18/12/17	700	\$0 Fin	\$0	\$0
702	No 3.1.3.7.1.3	100%		Contratación	20 días	mar 19/12/17	mar 16/01/18	mar 19/12/17		NOD 701	\$0 Fin	\$0	\$0
703	No 3.1.3.7.2	0%		Etapas de ejecución de pagos	52 días	mié 17/01/18	jue 29/03/18		NOD	NOD	\$4,695 Fin	\$0	\$0
704	No 3.1.3.7.2.1	10%		Pago 1 enero	10 días	mié 17/01/18	mar 30/01/18		NOD	NOD 702	\$1,565 Fin	\$0	\$0
705	No 3.1.3.7.2.2	10%		Pago 2 febrero	20 días	mié 31/01/18	mar 27/02/18		NOD	NOD 704	\$1,565 Fin	\$0	\$0
706	No 3.1.3.7.2.3	10%		Pago 3 marzo	22 días	mié 28/02/18	jue 29/03/18		NOD	NOD 705	\$1,565 Fin	\$0	\$0

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: jue 04/01/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	D	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	E	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	F	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	G	

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Francisco Rafael González Flores



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Angel Arnaldo Pineda Avila / Secretario de Área /  
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

9/1/2018 - 8:54 AM
