


## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado | Febrero  
<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal | 2017  
<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Apoyo al Sector Justicia Penal  
<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

<sup>5</sup> Número de Préstamo	BID 1905/OC-GU
<sup>6</sup> Código Presupuestario	52402104
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	OJ
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	OJ
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	US\$
<sup>11</sup> Monto aprobado	3,879,175.00
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	29,028,603.57
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	2,430,440.31 62.65 %

<sup>13</sup> Fecha de última actualización	27/02/2017
<sup>14</sup> Fecha del decreto	07/12/2011
<sup>15</sup> Fecha de suscripción	14/12/2011
<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	08/12/2011
<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/12/2007
<sup>18</sup> Fecha de cierre	14/12/2016
<sup>19</sup> Meses de Prórroga	12 meses
<sup>20</sup> Plazo de ejecución	84.72%
<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	1,448,734.69 37.35 %

Tipo de cambio: 7.48319 Q x 1 USD

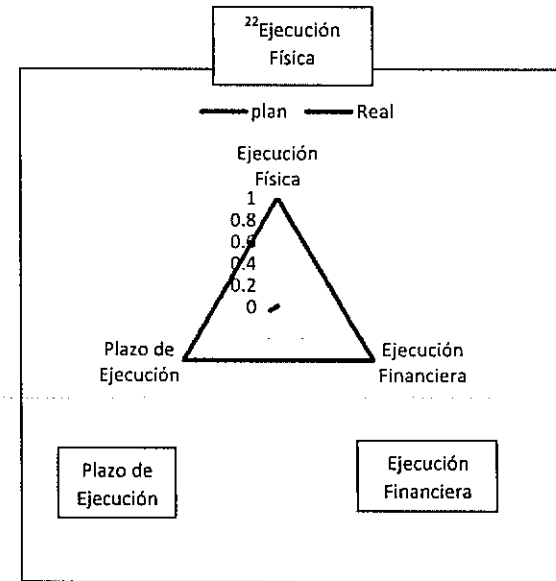

<sup>23</sup>Suscripción    Con. Previas    Ejecución    Cierre

		Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	43,636,371.00	Desembolso planificado	0.00	Ejecución Financiera	0% / %	Ejecución Financiera	0%
Presupuesto Vigente anual	43,636,371.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	0% / %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	0.00				
		Presupuesto planificado próximo	3,523,588.00				

19.

<sup>A1</sup>METAS AÑO FISCAL 2017


COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1. Acceso a la Justicia	Remozamiento de Juzgados de Paz	11						11	
	Informes de Supervisión de remozamientos	4						4	
	Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	1						1	
2. Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Informes de Consultorías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	10		15		15		40	
	Adquisición de Software especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)			1				1	
	Consultoría individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial			1				1	
	Capacitación para la Administración de la Base de Datos			1				1	

<sup>A2</sup>Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017 (en anexo adjunto)

<sup>A3</sup>Ejecución Financiera Anual (en anexo adjunto)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto programado	19,003.84	70,755.21	469,811.79	42,649.67	84,380.67	14,366.67	17,132.00	12,797.00	15,467.00	17,073.00	11,197.00	1,332.00	775,965.85

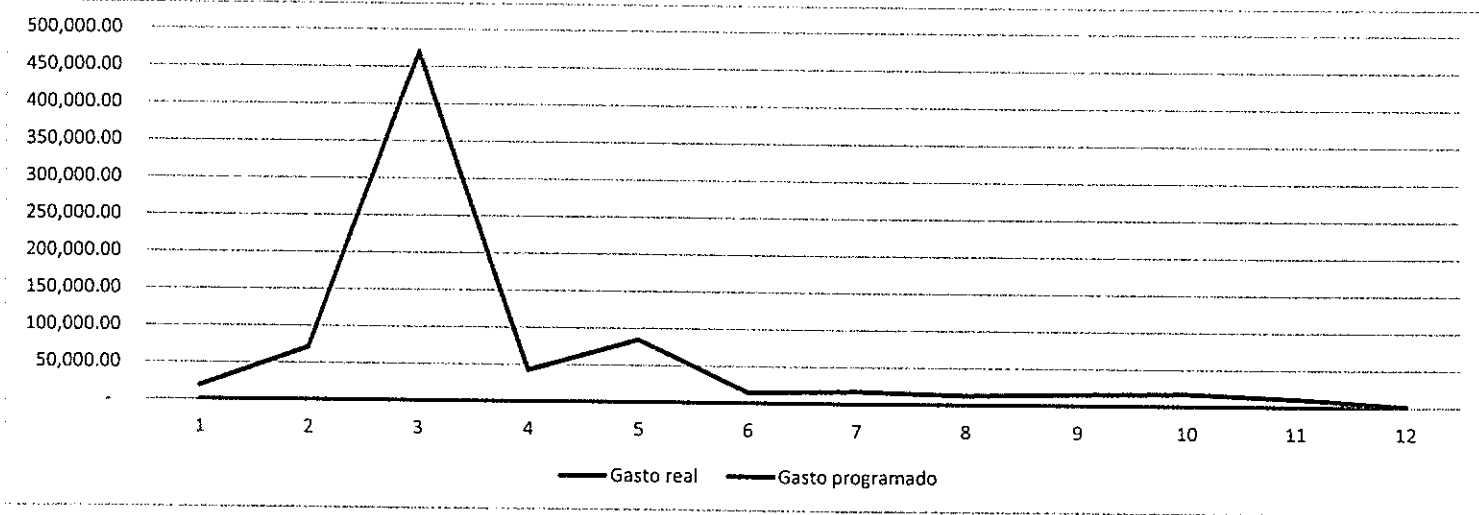

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado													

19.

<sup>A6</sup> Plan de Ejecución (en formato PEP adjunto)


1/9

A7 Observaciones/Desafíos


A8 Riesgos:


Elaborado por: (nombre y firma)

Lic. Napoleón Porfirio Güix Zárate (Coordinador Área de Ejecución de Proyectos Específicos)



Aprobado por: (nombre y firma)

Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez (Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia)

Fecha de actualización 27/02/2017



**Dian de Adquisiciones**  
 Unidad Co ejecutora del Organismo Judicial  
 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal  
 Prestamo No. 1905/OC-GU  
 Año: 2,017

Process	Referencia #	Category	Method	Base Document	Estimated Amount	Component	Estimated Documents Date	Estimated PP Date	Estimated No. Objection 1 Date	Estimated Licitacion Date	Estimated Opening Date	Estimated Evaluation Date	Estimated No. Objection 2 Date	Estimated Negotiation Date	Estimated No. Objection 3 Date	Estimated Bidding Date	Estimated End Date
Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para OJ	PASIP-216-SCC-CF-1-OJ	Consultoría - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Términos de Referencia	\$35,000.00	2 Gestión y seguimiento de la Info al SIP	04/03/2016	01/06/2016	08/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	04/07/2016	07/07/2016	30/12/2016
Capacitación para la Administración de la Base de Datos	PASIP-238-CCN-CF-1-OJ	Consultoría - Firmas	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$4,941.00	2 Gestión y seguimiento de la Info al SIP	29/01/2016	11/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	15/06/2016	30/06/2016	29/07/2016	01/08/2016	03/08/2016	05/08/2016	29/12/2016
Contratación de 1 Ingeniero Ambiental	PASIP-228-IC-OJ-1-OJ	Consultoría - Individuos	Selection of Individual Consultants	Términos de Referencia	\$12,000.00	1 Acceso a la Justicia			14/04/2016							10/05/2016	31/10/2016
Supervisión para Remozamiento de 14 Juzgados de Paz (Grupo 1, 2, 3, 4 y 5)	PASIP-229-IC-OJ-3-OJ	Consultoría - Individuos	Selection of Individual Consultants	Términos de Referencia	\$30,000.00	1 Acceso a la Justicia			30/03/2016							09/06/2016	31/08/2016
Mantenimiento y reparación de equipo (cómputo y de oficina)	PASIP-66-CP-5-5-OJ	Servicios de No Consultoría	Comparación de precios	Adquisición de Servicios de no Consultoría	\$7,000.00	4 Administración	02/02/2015		03/02/2015	06/02/2015	26/02/2015	03/03/2015	04/03/2015			23/05/2016	14/12/2016
Consultores para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial (2016)	PASIP-84-CCN-OJ-5-OJ	Consultoría - Individuos	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$88,500.00	2 Gestión y seguimiento de la Info al SIP			03/10/2014							30/08/2016	30/12/2016
Adquisición de software para el uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	PASIP-264-PN-5-1-OJ	Bienes	Licitación Pública Nacional	Documento Estándar para Adquisición de Bienes	\$61,250.00	2 Gestión y seguimiento de la Info al SIP	06/05/2015		13/05/2015	20/05/2015	19/06/2015	29/07/2015	06/08/2015			20/06/2016	30/06/2016
Publicaciones en prensa	PASIP-62-CP-5-1-OJ	Servicios de No Consultoría	Comparación de precios	Adquisición de servicios de no Consultoría	\$5,500.00	4 Administración	04/08/2014		05/08/2014	08/08/2014	28/08/2014	02/09/2014	03/09/2014			23/05/2016	30/06/2016
Personal de la Unidad Coejecutora OJ (Contable Financiero)	PASIP-91-CCN-OJ-12-OJ	Consultoría - Individuos	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$15,400.00	4 Administración			22/07/2014							01/01/2016	30/12/2016
Remodelación, ampliación de 11 Juzgados de Paz (Grupo 1,2,3 y 4)	PASIP-160-CP-OJ-6-OJ	Obras	Comparación de precios	Contratación de Obras Menores	\$321,360.00	1 Acceso a la Justicia	29/10/2015		03/11/2015	10/11/2015	10/12/2015	19/01/2016	27/01/2016			01/02/2016	24/07/2017

# Plan Financiero (PF): Mejorar el acceso a la justicia / Proyecto Organismo Judicial

SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN

AREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS / Unidad Coejecutora del Prestamo BID 1905 OC/GU "Apoyo al Sector Justicia Penal"

## Plan de Pagos y Desembolsos

	2017												Total 2017
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>1905 PEP SMART Con TO Integrado</b>	<b>\$ 17,003.84</b>	<b>\$ 70,755.21</b>	<b>\$ 409,811.79</b>	<b>\$ 41,483.00</b>	<b>\$ 72,714.00</b>	<b>\$ 13,200.00</b>	<b>\$ 17,132.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 11,467.00</b>	<b>\$ 17,073.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 1,332.00</b>	<b>\$ 694,365.84</b>
Componente 1: Acceso a la Justicia	\$ 640.90	\$ 59,948.00	\$ 399,421.00	\$ 32,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,827.90
Componente 1: Acceso a la Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
Centros Integrados de Justicia funcionando	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Centros Integrados de Justicia funcionando	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
CIJ de Villa Nueva, Guatemala	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
P3. Juzgados de Paz remodelados (OJ)	\$ -	\$ 59,948.00	\$ 392,671.00	\$ 28,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P3. Juzgados de Paz remodelados (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,387.00
Juzgados de Paz funcionando	\$ -	\$ 59,948.00	\$ 392,671.00	\$ 28,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Juzgados de Paz funcionando	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,387.00
Proceso de Contratación: Remozamiento de 11 Juzgados de	\$ -	\$ 46,348.00	\$ 381,791.00	\$ 26,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Supervisión de 11 remozamientos	\$ -	\$ 13,600.00	\$ 10,880.00	\$ 2,721.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454,186.00
Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Sect	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ 27,201.00
Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Sec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
P1. Sistema de información interconectado y alimentado por tod	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
P1. Sistema de información interconectado y alimentado por t	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
Interconexión en OJ	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
Interconexión en OJ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcio	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Software especializado (Sistemas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,250.00
Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos	\$ -	\$ 2,667.00	\$ 1,467.00	\$ 1,333.00	\$ 2,933.00	\$ 2,667.00	\$ 2,800.00	\$ 2,933.00	\$ 2,667.00	\$ 2,800.00	\$ 2,933.00	\$ -	\$ 25,200.00
Proceso de Contratación: Capacitación (Administración de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,941.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,609.21	\$ 1,990.79	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,600.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Administración	\$ 16,362.94	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 6,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 36,014.94
Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	\$ 16,362.94	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 6,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 36,014.94
Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Servicio de Reparación y Mantenim	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	\$ 15,030.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,030.94
Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	\$ 4,265.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,265.92
Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	\$ 1,018.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,018.02



# Plan Financiero (PF): Mejorar el acceso a la justicia / Proyecto Organismo Judicial

SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN

AREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS / Unidad Coejecutora del Prestamo BID 1905 OC/GU "Apoyo al Sector Justicia Penal"

## Plan de Pagos y Desembolsos

	2017												Total 2017	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2016	\$ 9,747.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,747.00
Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de eq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Personal de la Unidad Coejecutora	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 15,984.00
Personal de la Unidad Coejecutora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Contable Financiero año 2017	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 15,984.00
IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total general</b>	<b>\$ 17,003.84</b>	<b>\$ 70,755.21</b>	<b>\$ 409,811.79</b>	<b>\$ 41,483.00</b>	<b>\$ 72,714.00</b>	<b>\$ 13,200.00</b>	<b>\$ 17,132.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 11,467.00</b>	<b>\$ 17,073.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 1,332.00</b>	<b>\$ 694,365.84</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS 01  
Operación BID 1905/OC-GU

## PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	1905 REP. SMART Con TC. Integrado	2625 días	mié 24/10/07	Jun 21/12/12	\$3,134,439
1.1.1	Componente 1: Acceso a la Justicia	1102 días	mié 02/01/13	Jun 24/04/17	\$508,250
1.1.1.1	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	1093 días	mié 02/01/13	mar 11/04/17	\$27,869
1.1.1.1.1	Centros Integrados de Justicia Fundamento	1093 días	mié 02/01/13	mar 11/04/17	\$27,863
1.1.1.1.1.1	Ciudad Villa Nueva, Guatemala	1093 días	mié 02/01/13	mar 11/04/17	\$27,863
1.1.1.1.1.1.1	Proceso de contratación: Consultores Dibujantes (2 consultores) Villa Nueva	166 días	mar 15/03/16	vie 04/11/16	\$5,381
1.1.1.1.1.1.1.1	Proceso de adjudicación:	49 días	mar 15/03/16	vie 20/05/16	\$0
1.1.1.1.1.1.1.1.1	TR para consultores dibujantes Villa Nueva	2 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	\$0
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Evaluación CVs	1 día	mar 17/03/16	jun 17/03/16	\$0
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	No objeción a TOR 1 y a la evaluación	4 días	Jun 28/03/16	Jun 30/03/16	\$0
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contratación consultores dibujantes	41 días	vie 25/03/16	vie 20/05/16	\$0
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Proceso de Ejecución de Pagos	99 días	mié 15/06/16	vie 04/11/16	\$5,381
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Primer pago	33 días	mié 15/06/16	Jun 07/08/16	\$1,756
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Segundo pago	1 día	Jun 01/09/16	Jun 01/09/16	\$1,636
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Tercer pago: Planos Finales de los Centros Integrados de Justicia (1)	7 días	Jun 20/10/16	vie 28/10/16	\$947
1.1.1.1.1.1.4	Tercer pago: Planos Finales de los Centros Integrados de Justicia (2)	8 días	mié 16/10/16	vie 04/11/16	\$949
1.1.1.1.1.1.5	Pago de Retenciones (IVA Alibujante 1 y 2 producto 1	1 día	mar 23/08/16	mar 23/08/16	\$93
1.1.1.1.1.2	Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)	232 días	Jun 09/05/16	mar 11/04/17	\$11,441
1.1.1.1.1.2.1	Etapas de Adquisición:	86 días	Jun 09/05/16	mié 07/09/16	\$0
1.1.1.1.1.2.1.1	TOR para consultor ambiental	2 días	Jun 09/05/16	mar 10/05/16	\$0
1.1.1.1.1.2.1.1.1	Invitación	7 días	mié 11/05/16	Jun 19/05/16	\$0
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1	Evaluación CV	46 días	vie 20/05/16	vie 22/07/16	\$0
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1	No Objeción a los TOR y a la evaluación	16 días	Jun 25/07/16	mié 17/08/16	\$0
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1	Contratación consultor ambiental	14 días	vie 19/08/16	mié 07/09/16	\$0
1.1.1.1.1.2.2	Etapas de Ejecución de Pago:	130 días	Jun 03/10/16	mar 11/04/17	\$0
1.1.1.1.1.2.2.1	Pago No. 1	64 días	Jun 03/10/16	vie 06/01/17	\$11,441
1.1.1.1.1.2.2.1.1	Pago No. 2	44 días	Jun 09/01/17	vie 06/01/17	\$641
1.1.1.1.1.2.2.1.1.1	Pago No. 2	22 días	vie 10/03/17	Jun 09/03/17	\$6,750
1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1	Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y/o 1 Ingeniero)	410 días	mié 02/01/13	mar 29/07/14	\$10,541
1.1.1.1.1.3	Etapas de Adquisición:	7 días	mié 02/01/13	Jun 10/01/13	\$0
1.1.1.1.1.3.1	TR para consultor revisor	5 días	mié 02/01/13	mar 08/01/13	\$0
1.1.1.1.1.3.1.1	No Objeción a TOR 1	1 día	mié 09/01/13	mié 09/01/13	\$0
1.1.1.1.1.3.1.1.1	Evaluación CV	1 día	mié 09/01/13	mié 09/01/13	\$0
1.1.1.1.1.3.2	Contratación consultor revisor	1 día	Jun 10/01/13	Jun 10/01/13	\$0
1.1.1.1.1.3.2.1	Etapas de Ejecución de pagos:	20 días	mié 02/07/14	mar 29/07/14	\$10,541
1.1.1.1.1.3.2.1.1	Diseño finales de los Centros Integrados de Justicia (5)	20 días	mié 02/07/14	mar 29/07/14	\$10,541
1.2	P3. Jugadores de Par/remodelados (OJ)	372 días	mar 03/11/15	Jun 24/04/17	\$481,387
1.2.1	Jugadores de Par funcionamiento	372 días	mar 03/11/15	Jun 24/04/17	\$481,387
1.2.1.1	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Jugados)	30 días	Jun 07/12/15	Jun 25/01/16	\$0
1.2.1.1.1	Proceso de Contratación: Remozamiento de 11 Jugadores de Par	372 días	mar 03/11/15	Jun 24/04/17	\$454,186
1.2.1.1.1.1	Etapas de Adquisición:	284 días	mar 03/11/15	mar 13/12/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1	Documentos bases elaborados	45 días	mar 03/11/15	vie 29/01/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1.1	No Objeción a Documentos base y proceso	14 días	mar 12/01/16	vie 29/01/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1.1.1	Publicación / Invitación	25 días	mié 09/03/16	vie 08/04/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Adjudicación	20 días	vie 13/05/16	Jun 09/06/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Apertura ofertas remozamientos Jugados	15 días	mié 22/06/16	Jun 12/07/16	\$0
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	NDB evaluación	37 días	mié 13/07/16	Jun 05/09/16	\$0
1.2.1.1.1.8	Firma de contrato	69 días	mar 08/09/16	mar 13/12/16	\$0
1.2.1.1.2	Etapas de Ejecución de pago 3 Remozamientos: LOTE 1	56 días	Jun 30/01/17	mar 18/04/17	\$104,424
1.2.1.1.2.1	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Semahu A.V. y Morales, Izabal	1 día	Jun 30/01/17	Jun 30/01/17	\$0
1.2.1.1.2.2	Orden de Inicio 3 Remozamientos Usipandí, Cubulco y San Miguel Chical	5 días	mar 31/01/17	Jun 06/02/17	\$0
1.2.1.1.2.2.1	Primer pago conforme a contrato	20 días	mar 07/02/17	Jun 06/02/17	\$36,409
1.2.1.1.2.2.2	Segundo Pago conforme a contrato	10 días	mar 07/03/17	Jun 20/03/17	\$59,770
1.2.1.1.2.2.3	Entrega y Recepción Final	10 días	mar 21/03/17	mar 04/04/17	\$0
1.2.1.1.2.2.6	Tercer Pago final/ fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	mié 05/04/17	mar 28/04/17	\$8,245
1.2.1.1.2.3	Etapas de Ejecución de pago 3 remozamientos: LOTE 2	57 días	Jun 02/02/17	Jun 24/04/17	\$107,561
1.2.1.1.2.3.1	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Usipandí, Cubulco y San Miguel Chical	2 días	Jun 02/02/17	Jun 02/02/17	\$0
1.2.1.1.2.3.2	Orden de Inicio 3 Remozamientos Usipandí, Cubulco y San Miguel Chical	5 días	Jun 06/02/17	vie 10/02/17	\$0
1.2.1.1.2.3.3	Primer pago conforme a contrato	20 días	Jun 13/02/17	vie 10/03/17	\$53,999
1.2.1.1.2.3.4	Segundo Pago conforme a contrato	10 días	Jun 13/03/17	vie 24/03/17	\$51,804
1.2.1.1.2.3.6	Tercer Pago final/ fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	Jun 27/03/17	Jun 10/04/17	\$0
1.2.1.1.2.4	Etapas de Ejecución de pago 3 remozamientos: LOTE 3	54 días	mar 17/01/17	Jun 24/04/17	\$124,957
1.2.1.1.2.4.1	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Taxico, Sanarate y San Antonio La Paz	1 día	mar 17/01/17	mar 17/01/17	\$0
1.2.1.1.2.4.2	Orden de Inicio 3 Remozamientos Taxico, Sanarate y San Antonio La Paz	3 días	mié 18/01/17	vie 20/01/17	\$0
1.2.1.1.2.4.3	Primer pago conforme a contrato	20 días	Jun 23/01/17	Jun 17/02/17	\$46,346
1.2.1.1.2.4.4	Segundo Pago conforme a contrato	10 días	Jun 20/02/17	vie 03/03/17	\$62,014
1.2.1.1.2.4.6	Tercer Pago final/ fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	Jun 06/03/17	vie 17/03/17	\$0
1.2.1.1.2.5	Etapas de Ejecución de pago 3 remozamientos: LOTE 4	63 días	mar 24/01/17	Jun 21/04/17	\$117,244
1.2.1.1.2.5.1	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos San Pedro Sac., Tacaná y Tecón Uman	3 días	mar 24/01/17	Jun 26/01/17	\$0
1.2.1.1.2.5.2	Orden de Inicio 3 Remozamientos San Pedro Sac., Tacaná y Tecón Uman	5 días	vie 17/01/17	Jun 02/02/17	\$0
1.2.1.1.2.5.3	Primer pago conforme a contrato	20 días	vie 03/02/17	Jun 02/03/17	\$33,995
1.2.1.1.2.5.4	Segundo Pago conforme a contrato	10 días	vie 03/03/17	Jun 16/03/17	\$67,295
1.2.1.1.2.5.6	Entrega y Recepción Final	15 días	vie 17/03/17	Jun 07/04/17	\$0
1.2.1.1.3	Proceso de Contratación: Supervisión de 11 remozamientos en Jugadores de Par	343 días	mar 04/12/15	mié 19/04/17	\$27,201
1.2.1.1.3.1	Etapas de Adquisición:	255 días	mar 04/12/15	Jun 08/12/16	\$0

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OI  
Operación BID 1905/OC-GU

PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDI	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1.2.1.3.1.1	TDR elaborados	23 días	mar 08/12/15	vie 15/01/16	\$0
1.2.1.3.1.2	TDR revisados	10 días	jun 18/01/16	vie 29/01/16	\$0
1.2.1.3.1.3	No Objeción a TDR y proceso de Publicación / Invitación	36 días	vie 29/07/16	mie 16/03/16	\$0
1.2.1.3.1.4	Ofertas recibidas	18 días	vie 15/07/16	vie 11/08/16	\$0
1.2.1.3.1.5	Abertura	20 días	vie 12/08/16	vie 08/09/16	\$0
1.2.1.3.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	1 día	vie 22/09/16	vie 22/09/16	\$0
1.2.1.3.1.7	NOB evaluados	1 día	vie 23/09/16	vie 23/09/16	\$0
1.2.1.3.1.8	Firma de contrato	5 días	jun 26/09/16	jun 03/10/16	\$0
1.2.1.3.1.9	Ejemplo de Ejecución de Pago: Supervisor Lote 1	47 días	mar 04/10/16	vie 08/12/16	\$0
1.2.1.3.2	Ejemplo de Ejecución de Pago: Supervisor Lote 2	87 días	vie 09/12/16	mar 19/04/17	\$7,600
1.2.1.3.2.1	40% avance	40 días	vie 09/12/16	vie 09/02/17	\$760
1.2.1.3.2.2	40% avance	10 días	vie 10/02/17	vie 23/03/17	\$3,040
1.2.1.3.2.3	40% avance	20 días	vie 24/02/17	vie 23/03/17	\$3,040
1.2.1.3.2.4	40% avance	17 días	vie 24/03/17	mar 18/04/17	\$760
1.2.1.3.3	Ejemplo de Ejecución de Pago: Supervisor Lote 2	50 días	vie 09/12/16	vie 23/03/17	\$6,533
1.2.1.3.3.1	40% avance	10 días	vie 10/02/17	vie 23/03/17	\$2,613
1.2.1.3.3.2	40% avance	20 días	vie 24/02/17	vie 23/03/17	\$2,613
1.2.1.3.3.3	40% avance	18 días	vie 24/03/17	mie 19/04/17	\$664
1.2.1.3.4	Ejemplo de Ejecución de Pago: Supervisor Lote 3	80 días	vie 09/12/16	vie 07/04/17	\$6,668
1.2.1.3.4.1	40% avance	50 días	vie 09/12/16	vie 23/03/17	\$667
1.2.1.3.4.2	40% avance	10 días	vie 10/02/17	vie 23/03/17	\$2,667
1.2.1.3.4.3	40% avance	20 días	vie 24/02/17	vie 23/03/17	\$2,667
1.2.1.3.4.4	40% avance	10 días	vie 24/03/17	vie 07/04/17	\$667
1.2.1.3.5	Ejemplo de Ejecución de Pago: Supervisor Lote 4	83 días	vie 09/12/16	mie 12/04/17	\$6,408
1.2.1.3.5.1	40% avance	50 días	vie 09/12/16	vie 23/02/17	\$640
1.2.1.3.5.2	40% avance	10 días	vie 10/02/17	vie 23/03/17	\$1,560
1.2.1.3.5.3	40% avance	20 días	vie 24/02/17	vie 23/03/17	\$1,560
1.2.1.3.5.4	40% avance	13 días	vie 24/03/17	mie 12/04/17	\$640
2	Componente 2: Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	897 días	mar 20/05/14	vie 01/12/17	\$1,269,013
2.1	Pl. sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones interconectadas en OI	897 días	mar 20/05/14	vie 01/12/17	\$1,269,013
2.1.1.1	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal (fundamento OI)	897 días	mar 20/05/14	vie 01/12/17	\$1,269,013
2.1.1.1.1	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	468 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	\$586,282
2.1.1.1.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	430 días	vie 26/09/14	jun 05/06/16	\$0
2.1.1.1.1.2	No Objeción a las especificaciones técnicas y documentos base	50 días	vie 26/09/14	vie 04/12/16	\$0
2.1.1.1.1.3	Publicación y evaluación	73 días	vie 05/12/14	jun 16/03/15	\$0
2.1.1.1.1.4	No Objeción a la evaluación y adjudicación	94 días	jun 27/04/15	vie 21/09/15	\$0
2.1.1.1.1.5	Adjudicación y contratación	85 días	vie 29/09/15	vie 29/01/16	\$0
2.1.1.1.2	Entrega del Bien	93 días	jun 01/07/16	jun 05/06/16	\$0
2.1.1.1.2.1	Ejemplo de Ejecución de Pago:	4 días	jun 25/07/16	vie 29/07/16	\$586,282
2.1.1.1.2.2	Pago	316 días	mar 20/05/14	vie 29/07/16	\$586,282
2.1.1.1.2.3	Ejemplo de Adquisición: 2 bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	376 días	mar 20/05/14	jun 19/01/15	\$471,962
2.1.1.1.2.4	Elaboración de Especificaciones Técnicas	55 días	mar 29/05/14	jun 04/08/14	\$0
2.1.1.1.2.5	Publicación y evaluación	60 días	mar 05/08/14	jun 27/10/14	\$0
2.1.1.1.2.6	Adjudicación y contratación	61 días	jun 27/10/14	jun 19/01/15	\$0
2.1.1.1.2.7	Ejemplo de Ejecución de Pago:	51 días	vie 28/05/15	vie 06/08/15	\$471,962
2.1.1.1.2.8	Entrega del Bien	51 días	vie 28/05/15	vie 06/08/15	\$471,962
2.1.1.1.3	Proceso de Adquisición: Software especializado (Sistemas estadísticos, Business Intelligence, etc.) Tablen	130 días	mar 08/11/16	mie 17/05/17	\$61,250
2.1.1.1.3.1	Ejemplo de Adquisición:	130 días	mar 08/11/16	mar 18/04/17	\$0
2.1.1.1.3.2	Preparación de bases de licitación	3 días	mar 08/11/16	vie 10/11/16	\$0
2.1.1.1.3.3	No Objeción a las bases y al proceso	13 días	vie 11/11/16	jun 29/11/16	\$0
2.1.1.1.3.4	Aprobación y Publicación	20 días	mar 29/11/16	jun 02/01/17	\$0
2.1.1.1.3.5	Nombramiento de Junta receptora	15 días	mar 03/01/17	jun 23/05/17	\$0
2.1.1.1.3.6	Revisión y Evaluación	20 días	mar 24/01/17	jun 20/02/17	\$0
2.1.1.1.3.7	No Objeción a la adjudicación	10 días	mar 21/02/17	jun 06/03/17	\$0
2.1.1.1.3.8	Contratación	30 días	mar 07/03/17	mar 18/04/17	\$0
2.1.1.1.3.9	Ejemplo de Ejecución de Pago:	20 días	mie 19/04/17	mie 17/05/17	\$61,250
2.1.1.1.3.10	Entrega del Bien	275 días	mar 25/10/16	mar 28/11/17	\$35,200
2.1.1.1.4	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Pse 1	70 días	mar 25/10/16	jun 06/02/17	\$0
2.1.1.1.4.1	Ejemplo de Adquisición:	10 días	mar 25/10/16	jun 07/11/16	\$0
2.1.1.1.4.2	Preparación de TDR's	2 días	mar 08/11/16	mie 16/11/16	\$0
2.1.1.1.4.3	No Objeción a TDR's	5 días	vie 10/11/16	vie 07/12/16	\$0
2.1.1.1.4.4	Aprobación y Nombramiento de Comisión	2 días	vie 01/12/16	mie 07/12/16	\$0
2.1.1.1.4.5	Evaluación CV's	3 días	jun 05/12/16	jun 06/02/17	\$0
2.1.1.1.4.6	No Objeción a Evaluación	38 días	vie 08/12/16	jun 06/02/17	\$0
2.1.1.1.4.7	Contratación	205 días	mar 07/02/17	mar 28/11/17	\$35,200
2.1.1.1.4.8	Ejemplo de Ejecución de Pago:	16 días	mar 07/02/17	mar 28/02/17	\$2,667
2.1.1.1.4.9	Primer pago	38 días	mar 07/02/17	vie 30/03/17	\$1,467
2.1.1.1.4.10	Segundo pago	58 días	mar 07/02/17	vie 28/04/17	\$1,333
2.1.1.1.4.11	Tercer pago	80 días	mar 07/02/17	mie 31/05/17	\$2,933
2.1.1.1.4.12	Cuarto pago	101 días	mar 07/02/17	vie 29/06/17	\$2,667
2.1.1.1.4.13	Quinto pago	122 días	mar 07/02/17	jun 31/07/17	\$2,800
2.1.1.1.4.14	Sexto pago	144 días	mar 07/02/17	vie 31/08/17	\$2,933
2.1.1.1.4.15	Séptimo pago	164 días	mar 07/02/17	vie 29/09/17	\$2,667
2.1.1.1.4.16	Octavo pago	184 días	mar 07/02/17	jun 30/10/17	\$2,800
2.1.1.1.4.17	Noveno pago	205 días	mar 07/02/17	mar 28/11/17	\$2,933
2.1.1.1.4.18	Décimo pago	214 días	jun 28/11/16	vie 06/10/17	\$4,941
2.1.1.1.5	Proceso de Contratación: Capacitación (Administrador de Base de Datos, Herramienta Estadística y BI)	194 días	jun 28/11/16	mie 06/09/17	\$0
2.1.1.1.5.1	Ejemplo de Adquisición:	15 días	jun 28/11/16	vie 16/12/16	\$0
2.1.1.1.5.2	Preparación de TDR's	14 días	jun 19/12/16	vie 12/01/17	\$0
2.1.1.1.5.3	Solicitud y No Objeción a TDR's	15 días	vie 13/01/17	vie 07/02/17	\$0
2.1.1.1.5.4	Publicación	10 días	vie 03/02/17	vie 16/02/17	\$0
2.1.1.1.5.5	Evaluación y adjudicación	10 días	vie 17/02/17	vie 07/03/17	\$0
2.1.1.1.5.6	Solicitud de No Objeción a la adjudicación	10 días	vie 17/02/17	vie 07/03/17	\$0



# Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OI  
Operación BID 1905/OC-GU

## PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDI	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2.1.1.1.1.2.8	Octavo pago	161 días	lue 09/02/17	lue 28/09/17	\$1,867
2.1.1.1.1.2.9	Noveno pago	182 días	lue 09/02/17	lun 30/10/17	\$3,000
2.1.1.1.1.2.10	Décimo pago	205 días	lue 09/02/17	lue 30/11/17	\$1,733
3	Administración	2377 días	mie 24/10/07	lue 09/08/17	\$356,676
3.1	Gastos indirectos e Imprentas (OI)	2577 días	mie 24/10/07	lue 09/08/17	\$356,676
3.1.1	Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	295 días	lue 25/09/15	mar 22/11/16	\$102,493
3.1.1.1	Proceso de Adquisición: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del Edificio Palacio de Justicia	295 días	lue 25/09/15	mar 22/11/16	\$102,493
3.1.1.1.1	Etapas de Adquisición:	115 días	lue 25/09/15	lue 11/03/16	\$0
3.1.1.1.1.1	Elaboración documentos base	14 días	lue 25/09/15	lue 29/10/15	\$0
3.1.1.1.1.2	Revisión documentos base	4 días	lue 09/10/15	lue 15/10/15	\$0
3.1.1.1.1.3	No Objeción documentos bases	24 días	lue 16/10/15	mar 12/11/15	\$0
3.1.1.1.1.4	Publicación / Invitación	8 días	mar 24/11/15	lue 03/12/15	\$0
3.1.1.1.1.5	Evaluación y Adjudicación	36 días	lue 04/12/15	lun 01/02/16	\$0
3.1.1.1.1.6	NOB evaluación	13 días	mar 02/02/16	lue 18/02/16	\$0
3.1.1.1.1.7	Firma de contrato	16 días	lue 18/02/16	lue 11/03/16	\$0
3.1.1.1.1.2	Etapas de Ejecución de pagos:	41 días	lun 28/09/16	mar 22/11/16	\$102,493
3.1.1.1.1.2.1	Pago 1	8 días	lun 28/09/16	lue 05/10/16	\$7,285
3.1.1.1.1.2.2	Pago 2	7 días	mie 19/10/16	lue 27/10/16	\$86,409
3.1.1.1.1.2.3	Pago 3	20 días	mie 26/10/16	mar 22/11/16	\$8,878
3.1.2	Bienes y servicios apoyo a la Unidad Coleccionera	811 días	lue 27/06/14	lue 08/09/17	\$199,880
3.1.2.3	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	277 días	mar 30/12/14	mar 09/02/16	\$9,947
3.1.2.3.1	Etapas de Adquisición:	120 días	mar 30/12/14	mie 17/06/15	\$0
3.1.2.3.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	13 días	mar 30/12/14	lue 15/01/15	\$0
3.1.2.3.1.2	Especificaciones revisadas	20 días	lue 16/01/15	lue 12/02/15	\$0
3.1.2.3.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	43 días	lue 13/02/15	lue 17/04/15	\$0
3.1.2.3.1.4	Publicación / Invitación	1 día	lue 24/04/15	lue 24/04/15	\$0
3.1.2.3.1.5	Orientar recibidas	1 días	lue 24/04/15	lue 24/04/15	\$0
3.1.2.3.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	15 días	lue 23/04/15	lue 15/05/15	\$0
3.1.2.3.1.7	NOB evaluación	5 días	lue 14/05/15	lue 21/05/15	\$0
3.1.2.3.1.8	Firma de contrato	15 días	lue 28/05/15	mie 17/06/15	\$0
3.1.2.3.2	Etapas de Ejecución de pagos:	149 días	mar 30/06/15	lun 09/02/16	\$9,947
3.1.2.3.2.1	Pago 1	10 días	mar 30/06/15	lun 13/07/15	\$8,378
3.1.2.3.2.2	Recepciones	1 día	mar 09/07/16	mar 09/07/16	\$599
3.1.2.4	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	118 días	mar 30/12/14	lun 13/07/15	\$276
3.1.2.4.1	Etapas de Adquisición:	116 días	mar 30/12/14	lue 11/06/15	\$0
3.1.2.4.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	13 días	mar 30/12/14	lue 15/01/15	\$0
3.1.2.4.1.2	Especificaciones revisadas	20 días	lue 16/01/15	mie 11/02/15	\$0
3.1.2.4.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	8 días	lue 13/02/15	mar 24/02/15	\$0
3.1.2.4.1.4	Publicación / Invitación	20 días	mie 25/02/15	mie 25/03/15	\$0
3.1.2.4.1.5	Orientar recibidas	19 días	mie 25/03/15	lue 23/04/15	\$0
3.1.2.4.1.6	Apertura	1 día	lue 24/04/15	lue 24/04/15	\$0
3.1.2.4.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	15 días	lun 27/04/15	lun 18/05/15	\$0
3.1.2.4.1.8	NOB evaluación	9 días	lun 18/05/15	lue 28/05/15	\$0
3.1.2.4.1.9	Firma de contrato	10 días	lue 29/05/15	lue 11/06/15	\$0
3.1.2.4.2	Etapas de Ejecución de pagos:	10 días	mar 30/06/15	lun 13/07/15	\$276
3.1.2.4.2.1	Pago 1	10 días	mar 30/06/15	lun 13/07/15	\$276
3.1.2.5	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	264 días	mar 22/12/15	mie 11/01/17	\$4,266
3.1.2.5.1	Etapas de Adquisición:	243 días	mar 22/12/15	mie 02/12/16	\$0
3.1.2.5.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 22/12/15	mar 12/01/16	\$0
3.1.2.5.1.2	Especificaciones revisadas	6 días	mar 05/01/16	mar 13/09/16	\$0
3.1.2.5.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	7 días	mar 27/09/16	lue 30/09/16	\$0
3.1.2.5.1.4	Publicación / Invitación	4 días	mar 27/09/16	lue 30/09/16	\$0
3.1.2.5.1.5	Presentación de cotización y evaluación	9 días	lun 14/10/16	lue 24/11/16	\$0
3.1.2.5.1.6	NOB evaluación	5 días	lue 25/11/16	lue 01/12/16	\$0
3.1.2.5.1.7	Elaboración y Firma de Orden de Compra	1 día	lue 02/12/16	lue 02/12/16	\$0
3.1.2.5.1.8	Entrega del Equipo de computo	23 días	lun 05/12/16	mie 11/01/17	\$4,266
3.1.2.5.2	Etapas de Ejecución de pagos:	23 días	lun 05/12/16	mie 11/01/17	\$4,266
3.1.2.5.2.1	Pago 1	23 días	lun 05/12/16	mie 11/01/17	\$4,266
3.1.2.6	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2014	88 días	mar 08/07/14	lue 06/11/14	\$2,457
3.1.2.6.1	Etapas de Adquisición:	60 días	mar 08/07/14	lun 29/09/14	\$0
3.1.2.6.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 08/07/14	lun 21/07/14	\$0
3.1.2.6.1.2	Especificaciones revisadas	10 días	mar 08/07/14	mar 05/08/14	\$0
3.1.2.6.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	mar 05/08/14	mar 12/08/14	\$0
3.1.2.6.1.4	Publicación / Invitación	5 días	mar 12/08/14	mar 19/08/14	\$0
3.1.2.6.1.5	Orientar recibidas	1 día	mar 19/08/14	mie 20/08/14	\$0
3.1.2.6.1.6	Apertura y recomendación adjudicación	1 día	mie 20/08/14	lue 21/08/14	\$0
3.1.2.6.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días	lue 21/08/14	lue 28/08/14	\$0
3.1.2.6.1.8	NOB evaluación	8 días	lue 28/08/14	mar 09/09/14	\$0
3.1.2.6.1.9	Firma de contrato	15 días	mar 09/09/14	lun 29/09/14	\$0
3.1.2.6.2	Etapas de Ejecución de pagos:	13 días	mar 21/10/14	lue 06/11/14	\$2,457
3.1.2.6.2.1	Pago 1	13 días	mar 21/10/14	lue 06/11/14	\$2,457
3.1.2.7	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2016	97 días	lun 01/08/16	lue 22/12/16	\$1,167
3.1.2.7.1	Etapas de Adquisición:	92 días	lun 01/08/16	lue 19/12/16	\$0
3.1.2.7.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 08/08/16	lue 11/08/16	\$0
3.1.2.7.1.2	Especificaciones revisadas	2 días	lun 08/08/16	lun 15/08/16	\$0
3.1.2.7.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	4 días	lue 12/08/16	lue 18/08/16	\$0
3.1.2.7.1.4	Publicación / Invitación	1 día	lue 02/09/16	lue 02/09/16	\$0
3.1.2.7.1.5	Orientar recibidas	41 días	lun 12/09/16	mie 09/11/16	\$0
3.1.2.7.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	8 días	lun 12/09/16	mie 23/11/16	\$0
3.1.2.7.1.7	NOB evaluación	15 días	lue 24/11/16	lue 14/12/16	\$0
3.1.2.7.1.8	Elaboración y Firma de Orden Compra	1 día	lue 15/12/16	lue 15/12/16	\$0
3.1.2.7.1.9	Entrega de mobiliario	5 días	lue 16/12/16	lue 22/12/16	\$1,167
3.1.2.7.2	Etapas de Ejecución de pagos:	5 días	lue 16/12/16	lue 22/12/16	\$1,167
3.1.2.7.2.1	Pago 1	5 días	lue 16/12/16	lue 22/12/16	\$1,167
3.1.2.8	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	74 días	lun 25/07/16	lue 07/10/16	\$5,447
3.1.2.8.1	Etapas de Adquisición:	52 días	lun 25/07/16	lue 07/10/16	\$0
3.1.2.8.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 25/07/16	lue 29/07/16	\$0
3.1.2.8.1.2	Especificaciones revisadas	2 días	lun 01/08/16	mie 03/08/16	\$0
3.1.2.8.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	4 días	mar 11/08/16	mar 16/08/16	\$0
3.1.2.8.1.4	Publicación / Invitación	1 día	mar 23/08/16	mar 23/08/16	\$0

Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OJ  
Operación BID 1905/OC-GU

PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
3.1.2.8.1.5	Orientas recibidas/ apertura	1 día lun 29/08/16		lun 29/08/16	\$0
3.1.2.8.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	10 días mar 30/08/16		lun 12/09/16	\$0
3.1.2.8.1.7	NOB adjudicación	7 días mar 13/09/16		lue 27/09/16	\$0
3.1.2.8.1.8	Elaboración y Firma de Orden Compra	6 días lun 26/09/16		lun 03/10/16	\$0
3.1.2.8.1.9	Entrega e instalación de software	4 días mar 04/10/16		vie 07/10/16	\$0
3.1.2.8.2	Etapa de Ejecución de pagos:	11 días mié 26/10/16		mié 09/11/16	\$5,447
3.1.2.8.2.1	Pago 1	11 días mié 26/10/16		mié 09/11/16	\$5,447
3.1.2.9	Proceso de Adquisición: fotocopiadora multifuncional				
3.1.2.9.1.1	Etapa de Adquisición:	82 días vie 24/04/15		lun 20/07/15	\$4,718
3.1.2.9.1.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	61 días vie 24/04/15		vie 08/05/15	\$0
3.1.2.9.1.2	Especificaciones revisadas	10 días lun 11/05/15		vie 22/05/15	\$0
3.1.2.9.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días lun 25/05/15		vie 29/05/15	\$0
3.1.2.9.1.4	Publicación / Invitación	5 días lun 01/06/15		vie 05/06/15	\$0
3.1.2.9.1.5	Orientas recibidas	3 días lun 08/06/15		mié 10/06/15	\$0
3.1.2.9.1.6	Apertura	3 días jue 11/06/15		lun 15/06/15	\$0
3.1.2.9.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días mar 16/06/15		lun 22/06/15	\$0
3.1.2.9.1.8	NOB evaluación	10 días mar 23/06/15		lun 06/07/15	\$0
3.1.2.9.1.9	Firma de contrato	10 días mar 07/07/15		lun 20/07/15	\$0
3.1.2.9.2	Etapa de Ejecución de pagos:	2 días mié 13/08/15		mar 26/08/15	\$4,718
3.1.2.9.2.1	Pago 1	2 días mié 13/08/15		mar 26/08/15	\$4,718
3.1.2.10	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2015				
3.1.2.10.1	Etapa de Adquisición:	258 días mar 12/01/16		lun 16/01/17	\$4,718
3.1.2.10.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	236 días mar 12/01/16		lue 08/12/16	\$1,018
3.1.2.10.1.2	Especificaciones revisados	10 días mar 12/01/16		lun 23/03/16	\$0
3.1.2.10.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	10 días mar 26/01/16		mar 09/02/16	\$0
3.1.2.10.1.4	Publicación / Invitación	6 días mar 06/09/16		mar 13/09/16	\$0
3.1.2.10.1.5	Orientas recibidas y apertura / adjudicación	5 días mar 27/09/16		lun 03/10/16	\$0
3.1.2.10.1.6	Solicitud de NOB evaluación	26 días mar 04/10/16		mié 09/11/16	\$0
3.1.2.10.1.7	Elaboración y Firma de Orden Compra	9 días lun 14/11/16		lue 24/11/16	\$0
3.1.2.10.1.8	Entrega del Equipo	3 días lun 05/12/16		mié 07/12/16	\$0
3.1.2.10.2	Etapa de Ejecución de pagos:	22 días vie 09/12/16		lun 16/01/17	\$1,018
3.1.2.10.2.1	Pago 1	22 días vie 09/12/16		lun 16/01/17	\$1,018
3.1.2.11	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2014				
3.1.2.11.1	Etapa de Adquisición:	97 días vie 27/06/14		lun 10/11/14	\$1,374
3.1.2.11.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	52 días vie 27/06/14		lun 08/09/14	\$0
3.1.2.11.1.2	Especificaciones revisados	10 días vie 27/06/14		lue 10/07/14	\$0
3.1.2.11.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	9 días vie 11/07/14		lue 24/07/14	\$0
3.1.2.11.1.4	Publicación / Invitación	4 días vie 25/07/14		lue 31/07/14	\$0
3.1.2.11.1.5	Orientas recibidas	4 días vie 01/08/14		lue 07/08/14	\$0
3.1.2.11.1.6	Apertura	2 días mié 08/08/14		mar 12/08/14	\$0
3.1.2.11.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	4 días lun 18/08/14		vie 15/08/14	\$0
3.1.2.11.1.8	NOB evaluación	9 días lun 25/08/14		vie 05/09/14	\$0
3.1.2.11.1.9	Firma de contrato	1 días lun 08/09/14		lun 08/09/14	\$0
3.1.2.11.2	Etapa de Ejecución de pagos:	18 días mié 15/10/14		lun 10/11/14	\$1,374
3.1.2.11.2.1	Pago 1	18 días mié 15/10/14		lun 10/11/14	\$1,374
3.1.2.12	Proceso de Adquisición: Sellos y tarjetas de presentación, año 2014				
3.1.2.12.1	Etapa de Adquisición:	79 días vie 01/08/14		mié 19/11/14	\$146
3.1.2.12.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días vie 01/08/14		lue 14/08/14	\$0
3.1.2.12.1.2	Especificaciones revisadas	9 días vie 15/08/14		mié 27/08/14	\$0
3.1.2.12.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días vie 29/08/14		lue 04/09/14	\$0
3.1.2.12.1.4	Publicación / Invitación	5 días vie 05/09/14		lue 11/09/14	\$0
3.1.2.12.1.5	Orientas recibidas	3 días vie 12/09/14		mar 16/09/14	\$0
3.1.2.12.1.6	Apertura	3 días vie 17/09/14		vie 19/09/14	\$0
3.1.2.12.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días lun 22/09/14		vie 26/09/14	\$0
3.1.2.12.1.8	NOB evaluación	10 días lun 29/09/14		vie 10/10/14	\$0
3.1.2.12.1.9	Firma de contrato	28 días lun 13/10/14		vie 19/11/14	\$0
3.1.2.12.2	Etapa de Ejecución de pagos:	61 días jue 20/11/14		mié 11/02/15	\$146
3.1.2.12.2.1	Pago 1	61 días jue 20/11/14		mié 11/02/15	\$146
3.1.2.13	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 1				
3.1.2.13.1	Etapa de Adquisición:	68 días lun 21/09/15		mié 30/12/15	\$939
3.1.2.13.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	63 días lun 21/09/15		mar 15/12/15	\$0
3.1.2.13.1.2	Especificaciones revisadas	10 días lun 21/09/15		vie 02/10/15	\$0
3.1.2.13.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	9 días lun 05/10/15		vie 16/10/15	\$0
3.1.2.13.1.4	Publicación / Invitación	5 días lun 19/10/15		vie 02/10/15	\$0
3.1.2.13.1.5	Orientas recibidas	3 días mar 03/11/15		lue 05/11/15	\$0
3.1.2.13.1.6	Apertura	3 días vie 06/11/15		mar 10/11/15	\$0
3.1.2.13.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días mié 11/11/15		lun 16/11/15	\$0
3.1.2.13.1.8	NOB evaluación	10 días mar 17/11/15		lun 30/11/15	\$0
3.1.2.13.1.9	Firma de contrato	11 días mar 01/12/15		mar 15/12/15	\$0
3.1.2.13.2	Etapa de Ejecución de pagos:	0 días mar 29/12/15		mié 30/12/15	\$939
3.1.2.13.2.1	Fin del contrato	0 días mar 29/12/15		mié 30/12/15	\$939
3.1.2.14	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 2				
3.1.2.14.1	Etapa de Adquisición:	72 días lun 21/09/15		mié 06/01/16	\$322
3.1.2.14.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	62 días lun 21/09/15		mar 15/12/15	\$0
3.1.2.14.1.2	Especificaciones revisadas	10 días lun 21/09/15		vie 02/10/15	\$0
3.1.2.14.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	9 días lun 05/10/15		vie 16/10/15	\$0
3.1.2.14.1.4	Publicación / Invitación	1 día lun 19/10/15		mié 06/01/16	\$322
3.1.2.14.1.5	Orientas recibidas	3 días mar 03/11/15		lue 05/11/15	\$0
3.1.2.14.1.6	Apertura	3 días vie 06/11/15		mar 10/11/15	\$0
3.1.2.14.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días mar 16/11/15		lun 10/11/15	\$0
3.1.2.14.1.8	NOB evaluación	10 días mar 23/11/15		lun 30/11/15	\$0
3.1.2.14.1.9	Firma de contrato	11 días mar 01/12/15		mar 15/12/15	\$0
3.1.2.14.2	Etapa de Ejecución de pagos:	1 día mié 06/01/16		mié 06/01/16	\$322
3.1.2.14.2.1	Pago 1	1 día mié 06/01/16		mié 06/01/16	\$322
3.1.2.15	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 3				
3.1.2.15.1	Etapa de Adquisición:	80 días lun 21/09/15		lun 18/01/16	\$934
3.1.2.15.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	62 días lun 21/09/15		mar 15/12/15	\$0
3.1.2.15.1.2	Especificaciones revisados	10 días lun 21/09/15		vie 02/10/15	\$0
3.1.2.15.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	9 días lun 05/10/15		vie 16/10/15	\$0
3.1.2.15.1.4	Publicación / Invitación	1 día vie 02/10/15		vie 23/10/15	\$0
3.1.2.15.1.5	Orientas recibidas	3 días mar 03/11/15		lue 05/11/15	\$0

**Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial**  
**UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OI**  
**Operación BID 1905/OC-GU**

PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL								
EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo			
3.1.2.15.1.6	Apertura	3 días	vie 06/11/15	mar 10/11/15	\$0			
3.1.2.15.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días	mié 11/11/15	lun 16/11/15	\$0			
3.1.2.15.1.8	NOB evaluación	10 días	mar 17/11/15	lun 30/11/15	\$0			
3.1.2.15.1.9	Firma de contrato	11 días	mar 01/12/15	mar 15/12/15	\$0			
3.1.2.15.2.1	Etapa de Ejecución de pagos:	8 días	lue 07/01/16	mar 18/01/16	\$934			
3.1.2.15.2.1	Pago 1	8 días	lue 07/01/16	lun 18/01/16	\$934			
3.1.2.16	Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4255, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	70 días	vie 24/07/15	mar 30/11/15	\$2,877			
3.1.2.16.1	Etapa de Adquisición:	56 días	lue 24/07/15	mié 21/10/15	\$0			
3.1.2.16.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	lue 24/07/15	vie 07/08/15	\$0			
3.1.2.16.1.2	Especificaciones revisadas	10 días	vie 24/07/15	vie 07/08/15	\$0			
3.1.2.16.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	lue 21/08/15	vie 28/08/15	\$0			
3.1.2.16.1.4	Publicación / Invitación	5 días	lue 28/08/15	vie 04/09/15	\$0			
3.1.2.16.1.5	Ofertas recibidas	3 días	lue 28/08/15	vie 04/09/15	\$0			
3.1.2.16.1.6	Apertura	3 días	vie 04/09/15	lun 14/09/15	\$0			
3.1.2.16.1.7	NOB evaluación	5 días	lun 14/09/15	mar 22/09/15	\$0			
3.1.2.16.1.8	NOB evaluación	9 días	lun 21/09/15	vie 02/10/15	\$0			
3.1.2.16.1.9	Firma de contrato	11 días	lun 05/10/15	mié 11/10/15	\$0			
3.1.2.16.2	Etapa de Ejecución de Pagos:	5 días	mar 03/11/15	mar 10/11/15	\$4,877			
3.1.2.16.2.1	Fin del contrato	5 días	mar 03/11/15	mar 10/11/15	\$2,877			
3.1.2.17	Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	\$1,321			
3.1.2.17.1	Etapa de Adquisición:	56 días	vie 24/07/15	mié 21/10/15	\$0			
3.1.2.17.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	vie 24/07/15	vie 07/08/15	\$0			
3.1.2.17.1.2	Especificaciones revisadas	10 días	vie 07/08/15	vie 28/08/15	\$0			
3.1.2.17.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	lue 21/08/15	vie 28/08/15	\$0			
3.1.2.17.1.4	Publicación / Invitación	5 días	lue 28/08/15	vie 04/09/15	\$0			
3.1.2.17.1.5	Ofertas recibidas	3 días	lue 04/09/15	mié 09/09/15	\$0			
3.1.2.17.1.6	Apertura	3 días	lue 09/09/15	lun 14/09/15	\$0			
3.1.2.17.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días	lun 14/09/15	mar 22/09/15	\$0			
3.1.2.17.1.8	NOB evaluación	10 días	lun 21/09/15	lun 05/10/15	\$0			
3.1.2.17.1.9	Firma de contrato	11 días	lun 05/10/15	mié 11/10/15	\$0			
3.1.2.17.2	Etapa de Ejecución de pagos:	6 días	mar 03/11/15	mié 11/11/15	\$1,321			
3.1.2.17.2.1	Fin del contrato	6 días	mar 03/11/15	mié 11/11/15	\$1,321			
3.1.2.18	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2016	109 días	mar 07/08/16	mié 11/01/17	\$9,747			
3.1.2.18.1	Etapa de Adquisición:	76 días	mar 02/08/16	lue 18/11/16	\$0			
3.1.2.18.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	2 días	mar 02/08/16	lue 04/08/16	\$0			
3.1.2.18.1.2	Especificaciones revisadas	2 días	vie 05/08/16	lun 08/08/16	\$0			
3.1.2.18.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	9 días	mar 09/09/16	vie 19/09/16	\$0			
3.1.2.18.1.4	Publicación / Invitación	9 días	lun 22/09/16	lue 01/09/16	\$0			
3.1.2.18.1.5	Ofertas recibidas	1 día	lue 02/09/16	lue 02/09/16	\$0			
3.1.2.18.1.6	Apertura	1 día	lun 05/09/16	lun 05/09/16	\$0			
3.1.2.18.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	23 días	mar 06/09/16	vie 07/10/16	\$0			
3.1.2.18.1.8	NOB evaluación	9 días	lun 10/10/16	vie 21/10/16	\$0			
3.1.2.18.1.9	Contratación	1 día	vie 18/11/16	vie 18/11/16	\$0			
3.1.2.18.2	Etapa de Ejecución de pagos:	22 días	mar 06/12/16	mié 11/01/17	\$9,747			
3.1.2.18.2.1	Pago 1	22 días	mar 06/12/16	mié 11/01/17	\$9,747			
3.1.2.19.2.2	Fin del contrato	0 días	mié 11/01/17	mié 11/01/17	\$0			
3.1.2.21	Proceso de Adquisición: Publicaciones en prensa año 2014	68 días	lun 09/11/14	mié 04/02/15	\$1,231			
3.1.2.21.1	Etapa de Adquisición:	13 días	lun 09/11/14	lue 20/11/14	\$0			
3.1.2.21.1.1	Solicitud de proforma	5 días	lun 09/11/14	lue 20/11/14	\$0			
3.1.2.21.1.2	Etapa de Ejecución de pagos:	55 días	lue 20/11/14	mié 04/02/15	\$1,231			
3.1.2.21.2.1	Pago 1 Prensa libre	11 días	lue 20/11/14	vie 05/12/14	\$870			
3.1.2.21.2.2	Pago 2 Otro Centroamerica	44 días	vie 05/12/14	mié 04/02/15	\$352			
3.1.2.22.1	Etapa de Adquisición: Publicaciones en prensa año 2015	134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	\$1,859			
3.1.2.22.1.1	Etapa de Adquisición:	13 días	lun 11/05/15	mié 27/05/15	\$0			
3.1.2.22.1.2	Solicitud de proforma	120 días	vie 29/05/15	vie 20/11/15	\$1,859			
3.1.2.22.2.1	Pago 1 Prensa Libre HARDWARE	9 días	lue 29/05/15	lue 20/11/15	\$794			
3.1.2.22.2.2	Pago 2 Diario Centroamerica	1 día	lue 11/06/15	lue 11/06/15	\$267			
3.1.2.22.2.3	Pago 1 Prensa Libre EUROS	1 día	vie 20/11/15	vie 20/11/15	\$798			
3.1.2.23	Proceso de Adquisición: Publicaciones en prensa año 2016	216 días	lun 01/02/16	mié 30/11/16	\$3,234			
3.1.2.23.1	Etapa de Adquisición:	21 días	lun 01/02/16	lun 29/02/16	\$0			
3.1.2.23.1.1	Solicitud de proforma	21 días	lun 01/02/16	lun 29/02/16	\$0			
3.1.2.23.1.2	Etapa de Ejecución de pagos:	195 días	mar 01/09/16	mié 30/11/16	\$3,234			
3.1.2.23.2.1	Pago 1 Diario Centroamerica	150 días	vie 29/04/16	mié 30/11/16	\$914			
3.1.2.23.2.2	Pago 2 Diario Centroamerica	23 días	vie 29/04/16	mar 31/05/16	\$269			
3.1.2.23.2.3	Pago 1 Prensa Libre	18 días	vie 29/02/16	mié 24/08/16	\$273			
3.1.2.23.2.4	Publicación de 11 centros de maestros, juegadores de paz	6 días	vie 29/11/16	mié 30/11/16	\$273			
3.1.2.23.2.5	Publicación de software unidad coleccionera	193 días	mar 01/09/16	lun 29/11/16	\$2,420			
3.1.2.23.2.6	Publicación de 2 vehículos para uso de la unidad coleccionera	21 días	mar 29/11/16	mar 13/12/16	\$0			
3.1.2.23.2.7	Publicación en prensa, cubos estadísticos fase 1	5 días	mar 22/11/16	mar 29/11/16	\$812			
3.1.2.24	Proceso de Adquisición: Boletines para uso de la unidad coleccionera	68 días	mar 01/09/16	mar 31/05/16	\$800			
3.1.2.24.1	Etapa de Adquisición:	2 días	mar 01/09/16	mié 24/08/16	\$0			
3.1.2.24.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	2 días	mié 30/11/16	lun 05/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.2	Especificaciones revisadas	2 días	mié 30/11/16	lun 05/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.3	No Objeción a Especificaciones y proceso	1 día	mar 06/12/16	mar 06/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.4	Publicación / Invitación	1 día	mié 07/12/16	lue 08/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.5	Apertura, evaluación	1 día	lue 08/12/16	vie 09/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	1 día	vie 09/12/16	vie 09/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.7	NOB evaluación	1 día	lun 12/12/16	lun 12/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.8	Elaboración y Firma de Orden Compra	1 día	mar 13/12/16	mar 13/12/16	\$0			
3.1.2.24.1.9	Entrega de Boletines serios	10 días	mié 14/12/16	mar 03/01/17	\$2,000			
3.1.2.24.2.1	Pago 1	10 días	mié 14/12/16	mar 03/01/17	\$2,000			
3.1.2.25	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo computo y de oficina	379 días	mar 12/01/16	lue 06/07/17	\$5,000			
3.1.2.25.1	Adquisición	60 días	mié 01/03/17	lue 29/05/17	\$0			
3.1.2.25.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	mié 01/03/17	mar 14/03/17	\$0			
3.1.2.25.1.2	Especificaciones revisadas	20 días	mié 15/03/17	mar 28/03/17	\$0			

Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OJ  
Operación BID 1905/OC-GU

PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
3.1.3.25.1.3	No Obedeció a Especificaciones y proceso	6 días	mié 29/03/17	lue 06/04/17	\$0
3.1.3.25.1.4	Publicación / Invitación	5 días	lue 07/04/17	lue 13/04/17	\$0
3.1.3.25.1.5	Oferitas recibidas y apertura / adjudicación	15 días	lue 14/04/17	vie 09/05/17	\$0
3.1.3.25.1.6	Solicitud de NOB evaluación	8 días	lun 08/05/17	mié 17/05/17	\$0
3.1.3.25.1.7	Elaboración y Firma de Orden Compra	5 días	lue 18/05/17	mié 24/05/17	\$0
3.1.3.25.1.8	Entrega de Equipo con mantenimiento y reparación	1 día	lue 25/05/17	lue 25/05/17	\$0
3.1.3.25.1.9	Etapas de Ejecución de pagos:	30 días	lue 26/05/17	lue 06/07/17	\$5,000
3.1.3	Pago 1	30 días	lue 26/05/17	lue 06/07/17	\$5,000
3.1.3.1	Personal de la Unidad Colectora	1131 días	mar 16/07/13	lue 21/12/14	\$69,303
3.1.3.1.1	Etapas de Contratación: Especialista en planificación (año 2014)	283 días	lue 29/11/13	mar 30/12/14	\$19,254
3.1.3.1.1.1	TDR elaborados	137 días	lue 29/11/13	lun 09/06/14	\$0
3.1.3.1.1.2	TDR revisados	22 días	lue 29/11/13	lun 30/12/13	\$0
3.1.3.1.1.3	No Obedeció a TDR y proceso	14 días	lue 03/01/14	mié 01/01/14	\$0
3.1.3.1.1.4	Publicación / Invitación	15 días	lue 23/01/14	lue 13/02/14	\$0
3.1.3.1.1.5	Oferitas recibidas	19 días	lue 24/02/14	lue 13/03/14	\$0
3.1.3.1.1.6	Apertura	1 día	lue 14/03/14	lue 17/03/14	\$0
3.1.3.1.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	23 días	lun 17/03/14	lue 17/04/14	\$0
3.1.3.1.1.8	NOB evaluación	10 días	lue 18/03/14	lue 01/05/14	\$0
3.1.3.1.1.9	Firma de contrato	26 días	lun 03/05/14	lun 09/06/14	\$0
3.1.3.1.1.2	Etapas de Ejecución de pagos:	196 días	mar 01/04/14	mar 30/12/14	\$19,254
3.1.3.1.2.1	Pago 1 - Abril	11 días	mar 01/04/14	mar 15/04/14	\$1,304
3.1.3.1.2.2	Pago 2	24 días	lue 05/06/14	mar 08/07/14	\$16,400
3.1.3.1.2.3	Pago de retenciones sobre contrato (2014)	22 días	lun 01/12/14	mar 30/12/14	\$1,550
3.1.3.2	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	118 días	lue 07/07/16	lue 29/12/16	\$5,695
3.1.3.2.1	TDR elaborados	2 días	lue 07/07/16	vie 08/07/16	\$0
3.1.3.2.2	TDR revisados	1 día	lun 11/07/16	lun 11/07/16	\$0
3.1.3.2.3	No Obedeció a TDR y proceso	6 días	mar 12/07/16	mar 19/07/16	\$0
3.1.3.2.4	Obedeció de CV	2 días	vie 22/07/16	lun 26/07/16	\$0
3.1.3.2.5	Evaluación y recomendación adjudicación	4 días	mié 27/07/16	lun 01/08/16	\$0
3.1.3.2.6	NOB evaluación	11 días	mar 02/08/16	mié 17/08/16	\$0
3.1.3.2.7	Firma y aprobación del contrato	7 días	lue 22/08/16	vie 30/08/16	\$0
3.1.3.2.8	Pagos 2016 Especialista de Planificación	22 días	lue 24/11/16	lue 29/12/16	\$5,695
3.1.3.2.8.1	Primer pago	5 días	lue 24/11/16	mié 30/11/16	\$76
3.1.3.2.8.2	Segundo pago	5 días	lue 24/11/16	mié 30/11/16	\$2,289
3.1.3.2.8.3	Tercer pago	10 días	mar 06/12/16	lun 19/12/16	\$2,287
3.1.3.2.8.4	Cuarto pago y fin del contrato	7 días	lue 15/12/16	lue 29/12/16	\$1,032
3.1.3.3	Etapas de Adquisición: Especialista en infraestructura (año 2014)	106 días	mar 16/07/13	mié 22/01/14	\$2,195
3.1.3.3.1	TDR elaborados	10 días	mar 16/07/13	lun 29/07/13	\$0
3.1.3.3.1.2	TDR revisados	10 días	mar 30/07/13	lun 12/08/13	\$0
3.1.3.3.1.3	No Obedeció a TDR y proceso	20 días	mar 13/08/13	lun 09/09/13	\$0
3.1.3.3.1.4	Publicación / Invitación	14 días	mar 10/09/13	lue 27/09/13	\$0
3.1.3.3.1.5	Oferitas recibidas	6 días	lun 30/09/13	lun 07/10/13	\$0
3.1.3.3.1.6	Apertura	1 día	mar 08/10/13	mar 08/10/13	\$0
3.1.3.3.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	9 días	mié 09/10/13	lun 04/11/13	\$0
3.1.3.3.1.8	NOB evaluación	10 días	mar 22/10/13	lun 21/11/13	\$0
3.1.3.3.1.9	Firma de contrato	26 días	mar 05/11/13	mar 10/12/13	\$0
3.1.3.3.2	Etapas de Ejecución de pagos:	15 días	lue 02/01/14	mié 22/01/14	\$2,195
3.1.3.3.2.1	Ejecución de contrato	15 días	lue 02/01/14	mié 22/01/14	\$2,195
3.1.3.4	Proceso de contratación: Contable financiero 2015	243.88 días	mar 06/01/15	mié 23/12/15	\$10,320
3.1.3.4.1	Etapas de Adquisición:	77 días	mar 06/01/15	vie 24/04/15	\$0
3.1.3.4.1.1	TDR elaborados	10 días	mar 06/01/15	mar 20/01/15	\$0
3.1.3.4.1.2	TDR revisados	10 días	mar 20/01/15	lun 02/02/15	\$0
3.1.3.4.1.3	No Obedeció a TDR y proceso	13 días	mar 17/02/15	lue 05/03/15	\$0
3.1.3.4.1.4	Publicación / Invitación	10 días	mar 03/03/15	lue 17/03/15	\$0
3.1.3.4.1.5	Oferitas recibidas	6 días	lue 03/03/15	vie 13/03/15	\$0
3.1.3.4.1.6	Apertura	1 día	lue 13/03/15	lue 13/03/15	\$0
3.1.3.4.1.7	Evaluación y recomendación adjudicación	9 días	lun 16/03/15	vie 27/03/15	\$0
3.1.3.4.1.8	NOB evaluación	10 días	vie 27/03/15	mar 14/04/15	\$0
3.1.3.4.1.9	Firma de contrato	10 días	lue 10/04/15	vie 24/04/15	\$0
3.1.3.4.2	Etapas de Ejecución de Pagos	167 días	vie 24/04/15	mié 23/12/15	\$10,720
3.1.3.4.2.1	Pago 1 abril	23 días	vie 24/04/15	mié 27/05/15	\$330
3.1.3.4.2.1.1	TDR elaborados	5 días	mar 02/06/15	lun 08/06/15	\$1,235
3.1.3.4.2.1.2	TDR revisados	18 días	mar 09/06/15	vie 03/07/15	\$1,247
3.1.3.4.2.1.3	No Obedeció a TDR y proceso	25 días	lun 06/07/15	vie 28/08/15	\$1,244
3.1.3.4.2.1.4	Publicación / Invitación	10 días	lun 16/08/15	vie 28/08/15	\$1,237
3.1.3.4.2.1.5	Apertura	22 días	mar 01/09/15	lue 01/10/15	\$1,233
3.1.3.4.2.1.6	Evaluación y recomendación adjudicación	20 días	vie 02/10/15	lue 30/10/15	\$1,240
3.1.3.4.2.1.7	NOB evaluación	23 días	lun 02/11/15	mar 01/12/15	\$1,250
3.1.3.4.2.1.8	Firma de contrato	15 días	mié 02/12/15	mar 22/12/15	\$1,247
3.1.3.4.2.1.9	Retenciones año 2015 del contable financiero	1 día	mié 23/12/15	mié 23/12/15	\$498
3.1.3.4.2.1.10	Retenciones año 2015 del contable financiero	238 días	vie 22/01/16	lue 22/12/16	\$15,454
3.1.3.5	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	238 días	vie 22/01/16	lue 22/12/16	\$15,454
3.1.3.5.1	Pagos año 2016 Recontratación	6 días	vie 22/01/16	lue 29/01/16	\$1,237
3.1.3.5.1.1	Pago 1 enero 2016	5 días	mar 23/01/16	lun 29/02/16	\$1,238
3.1.3.5.1.2	Pago 2 febrero 2016	7 días	mié 23/01/16	lue 31/03/16	\$1,230
3.1.3.5.1.3	Pago 3 marzo 2016	6 días	lue 22/04/16	vie 29/04/16	\$1,227
3.1.3.5.1.4	Pago 4 abril 2016	6 días	mar 24/05/16	mar 31/05/16	\$1,245
3.1.3.5.1.5	Pago 5 mayo 2016	5 días	lue 24/06/16	lue 30/06/16	\$1,244
3.1.3.5.1.6	Pago 6 junio 2016	5 días	vie 24/07/16	vie 29/07/16	\$1,257
3.1.3.5.1.7	Pago 7 julio 2016	7 días	mar 23/08/16	mié 31/08/16	\$1,258
3.1.3.5.1.8	Pago 8 agosto 2016	6 días	vie 23/09/16	vie 30/09/16	\$1,263
3.1.3.5.1.9	Pago 9 septiembre 2016	5 días	lun 24/10/16	vie 28/10/16	\$1,265
3.1.3.5.1.10	Pago 10 octubre 2016	6 días	mié 23/11/16	lue 22/12/16	\$1,270
3.1.3.5.1.11	Pago 11 noviembre 2016	16 días	lue 01/12/16	lun 31/10/16	\$497
3.1.3.5.1.12	Pago 12 diciembre 2016	193 días	mar 02/02/16	lue 21/12/17	\$15,984
3.1.3.6	Proceso de Contratación: Contable Financiero año 2017	255 días	lue 15/12/16	lue 22/01/17	\$0
3.1.3.6.1	Etapas de Adquisición:	16 días	lue 15/12/16	lue 15/12/16	\$0
3.1.3.6.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lue 15/12/16	lue 15/12/16	\$0



Plan de Ejecución Pluri Anual (PEP): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIFICOS OI  
Operación BID 1905/OC-GU

PLAN DE EJECUCIÓN PLURI-ANUAL

EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
3.1.3.6.1.2	No Objeción a recontabilidad	5 días	vie 16/12/16	lue 22/12/16	\$0
3.1.3.6.1.3	Firma de contrato	10 días	lun 26/12/16	lue 13/01/17	\$0
3.1.3.6.2	Etapas de ejecución de pagos	248 días	lun 02/01/17	lue 21/12/17	\$15,984
3.1.3.6.2.1	Pago 1 enero	22 días	lun 02/01/17	mar 31/01/17	\$1,332
3.1.3.6.2.2	Pago 2 febrero	20 días	mie 01/02/17	mar 28/02/17	\$1,332
3.1.3.6.2.3	Pago 3 marzo	23 días	mie 01/03/17	vie 31/03/17	\$1,332
3.1.3.6.2.4	Pago 4 abril	19 días	mar 04/04/17	vie 28/04/17	\$1,332
3.1.3.6.2.5	Pago 5 mayo	22 días	mar 02/05/17	mie 31/05/17	\$1,332
3.1.3.6.2.6	Pago 6 junio	22 días	lue 01/06/17	vie 30/06/17	\$1,332
3.1.3.6.2.7	Pago 7 julio	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	\$1,332
3.1.3.6.2.8	Pago 8 agosto	22 días	mar 01/08/17	lue 31/08/17	\$1,332
3.1.3.6.2.9	Pago 9 septiembre	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1,332
3.1.3.6.2.10	Pago 10 octubre	21 días	lun 02/10/17	mar 31/10/17	\$1,332
3.1.3.6.2.11	Pago 11 noviembre	22 días	mie 01/11/17	lue 30/11/17	\$1,332
3.1.3.6.2.12	Pago 12 diciembre	15 días	vie 01/12/17	lue 21/12/17	\$1,332
3.1.4	IMPRESUNTOS	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	\$45,000
3.1.4.1	Impresuntos	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	\$45,000
