


## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado: Marzo  
<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal: 2017  
<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Apoyo al Sector Justicia Penal  
<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

<sup>5</sup> Número de Préstamo	BID 1905/OC-GU	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	27/02/2017
<sup>6</sup> Código Presupuestario	52402104	<sup>14</sup> Fecha del decreto	07/12/2011
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	14/12/2011
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	OJ	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	08/12/2011
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	OJ	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/12/2007
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	US\$	<sup>18</sup> Fecha de cierre	14/12/2016
<sup>11</sup> Monto aprobado	3,879,175.00	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	12 meses
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	29,028,603.57	<sup>20</sup> Plazo de ejecución	84.72%
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	2,430,440.31	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	1,448,734.69
	62.65 %		37.35 %

Tipo de cambio: 7.48319 Q x 1 USD

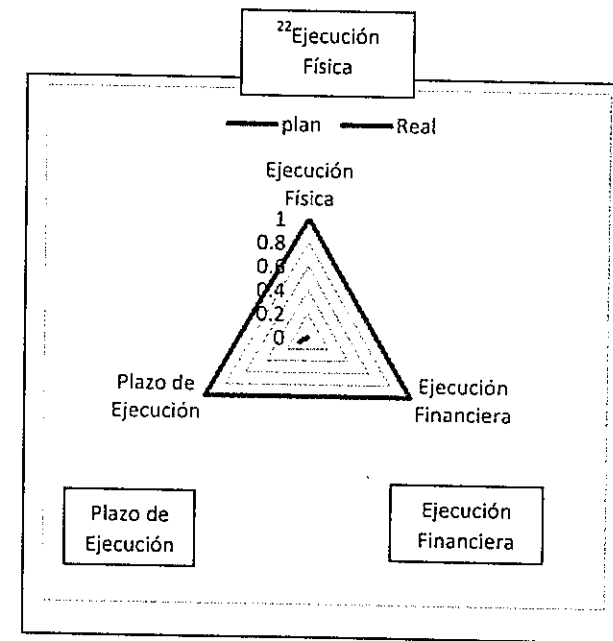

<sup>23</sup>Suscripción    Con. Previas    Ejecución    Cierre

			Mensual	Anual		Total	
<sup>24</sup> Asignación Presupuestaria anual	43,636,371.00	Desembolso planificado	0.00	Ejecución Financiera	0% / %	Ejecución Financiera	0.02%
Presupuesto Vigente anual	43,636,371.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	0% / %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria	0.02	Próximo desembolso del mes	0.00				
		Presupuesto planificado próximo	3,523,588.00				

9

w

A<sup>1</sup> METAS AÑO FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1. Acceso a la Justicia	Remozamiento de Juzgados de Paz	11						11	
	Informes de Supervisión de remozamientos	4						4	
	Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	1						1	
2. Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Informes de Consultorías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	10		15		15		40	
	Adquisición de Software especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)			1				1	
	Consultoría individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial			1				1	
	Capacitación para la Administración de la Base de Datos			1				1	


A<sup>2</sup> Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017 (en anexo adjunto)

A<sup>3</sup> Ejecución Financiera Anual (en anexo adjunto)

9

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	97,403.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,403.15
Gasto programado	19,003.84	70,755.21	469,811.79	42,649.67	84,380.67	14,366.67	17,132.00	12,797.00	15,467.00	17,073.00	11,197.00	1,332.00	775,965.85

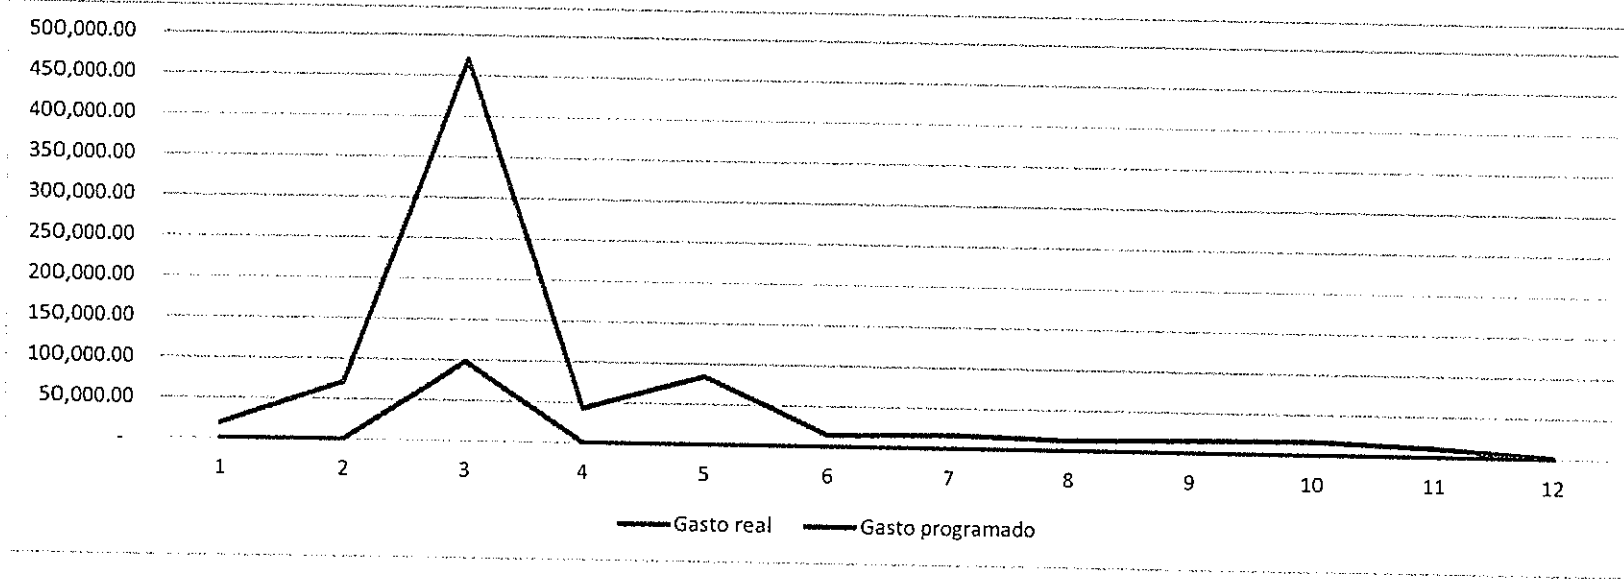

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado													

9


<sup>A6</sup>Plan de Ejecución (en formato PEP adjunto)

9.


<sup>A7</sup> Observaciones/Desafíos


<sup>A8</sup> Riesgos:



Elaborado por: (nombre y firma)



Lic. Francisco Rafael González Flores (Especialista Financiero / Coordinador en funciones - artículo 7 del ROP - Área de Ejecución de Proyectos Específicos)



Aprobado por: (nombre y firma)



Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez (Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia)



Fecha de actualización \_\_\_\_ 29/03/2017 \_\_\_\_





## Plan de Compras

Unidad Co ejecutora del Organismo Judicial

Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal

Prestamo No. 1905/OC-GU

Año: 2,017

Process	Reference #	Category	Method	Base Document	Estimated Amount	Component	REGION	CATEGORIA
Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para OJ	PASJP-226-SCC-CF-1-OJ	Consultoría - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Términos de Referencia	\$35,000.00	2 Gestión y seguimiento de la info al SJP	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Capacitación para la Administración de la Base de Datos	PASJP-238-CCIN-CF-1-OJ	Consultoría - Firmas	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$4,941.00	2 Gestión y seguimiento de la info al SJP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Contratación de 1 Ingeniero Ambiental	PASJP-228-IC-CI-2-OJ	Consultoría - Individuos	Selection of Individual Consultants	Términos de Referencia	\$12,000.00	1 Acceso a la Justicia	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
Supervisión para Remozamiento de 14 Juzgados de Paz (Grupo 1, 2, 3, 4 y 5)	PASJP-229-IC-CI-3-OJ	Consultoría - Individuos	Selection of Individual Consultants	Términos de Referencia	\$30,000.00	1 Acceso a la Justicia	188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Mantenimiento y reparación de equipo (cómputo y de oficina)	PASJP-66-CP-S-5-OJ	Servicios de No Consultoría	Comparación de precios	Adquisición de Servicios de no Consultoría	\$2,000.00	4 Administración	162 / 168	MANT Y REP. EQ. DE OFICINA / MANT. Y REP. EQ. COMPUTO
Consultores para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial (2016)	PASJP-84-CCIN-CI-5-OJ	Consultoría - Individuos	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$88,500.00	2 Gestión y seguimiento de la info al SJP	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
Adquisición de software para el uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	PASJP-26-LPN-B-1-OJ	Bienes	Licitación Pública Nacional	Documento Estándar para Adquisición de Bienes	\$61,250.00	2 Gestión y seguimiento de la info al SJP	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Publicaciones en prensa	PASJP-62-CP-S-1-OJ	Servicios de No Consultoría	Comparación de precios	Adquisición de Servicios de no Consultoría	\$5,500.00	4 Administración	121 / 195	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN / IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
Personal de la Unidad Coejecutora OJ (Contable Financiero)	PASJP-91-CCIN-CI-12-OJ	Consultoría - Individuos	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales	Términos de Referencia	\$15,400.00	4 Administración	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO
Remodelación, ampliación de 11 Juzgados de Paz (Grupo 1,2,3 y 4)	PASJP-160-CP-O-6-OJ	Obras	Licitación Pública Nacional	Contratación de Obras Menores	\$321,360.00	1 Acceso a la Justicia	171	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

9.

# Plan Financiero (PF): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN

ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS / Unidad Coejecutora del Prestamo BID 1905 OC/GU "Apoyo al Sector Justicia Penal"

## Plan de Pagos y Desembolsos

	2017												Total 2017
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>1905 PEP SMART Con TIC Integrado</b>	<b>\$ 19,003.84</b>	<b>\$ 70,755.21</b>	<b>\$ 469,811.79</b>	<b>\$ 42,649.67</b>	<b>\$ 84,380.67</b>	<b>\$ 14,366.67</b>	<b>\$ 17,132.00</b>	<b>\$ 12,797.00</b>	<b>\$ 15,467.00</b>	<b>\$ 17,073.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 1,332.00</b>	<b>\$ 775,965.85</b>
Componente 1: Acceso a la Justicia	\$ 640.90	\$ 59,948.00	\$ 399,421.00	\$ 32,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,827.90
Componente 1: Acceso a la Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
Centros Integrados de Justicia funcionando	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Centros Integrados de Justicia funcionando	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
CIJ de Villa Nueva, Guatemala	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor	\$ 640.90	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,440.90
P3. Juzgados de Paz remodelados (OJ)	\$ -	\$ 59,948.00	\$ 392,671.00	\$ 28,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P3. Juzgados de Paz remodelados (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,387.00
Juzgados de Paz funcionando	\$ -	\$ 59,948.00	\$ 392,671.00	\$ 28,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Juzgados de Paz funcionando	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,387.00
Proceso de Contratación: Remozamiento de 11 Juzgados de	\$ -	\$ 46,348.00	\$ 381,791.00	\$ 26,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Supervisión de 11 remozamientos	\$ -	\$ 13,600.00	\$ 10,880.00	\$ 2,721.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454,186.00
Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Sect	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ 27,201.00
Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Ser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
P1. Sistema de información interconectado y alimentado por tod	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
P1. Sistema de información interconectado y alimentado por tr	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
Interconexión en OJ	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
Interconexión en OJ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcio	\$ -	\$ 9,475.21	\$ 9,058.79	\$ 7,333.00	\$ 71,382.00	\$ 11,868.00	\$ 10,800.00	\$ 9,865.00	\$ 10,135.00	\$ 15,741.00	\$ 9,865.00	\$ -	\$ -
Sistema Integrado de Información y Estadística Penal func	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,523.00
Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Software especializado (Sistemas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos	\$ -	\$ 2,667.00	\$ 1,467.00	\$ 1,333.00	\$ 2,933.00	\$ 2,667.00	\$ 2,800.00	\$ 2,933.00	\$ 2,667.00	\$ 2,800.00	\$ 2,933.00	\$ -	\$ 61,250.00
Proceso de Contratación: Capacitación (Administración de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,941.00	\$ -	\$ -	\$ 25,200.00
Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,941.00
Proceso de contratación: 2 Consultor para Módulos de Inte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,609.21	\$ 1,990.79	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,600.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Intercon	\$ -	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ 1,867.00	\$ 2,000.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ 18,533.00
Administración	\$ 18,362.94	\$ 1,332.00	\$ 61,332.00	\$ 2,498.67	\$ 12,998.67	\$ 2,498.67	\$ 6,332.00	\$ 2,932.00	\$ 5,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 117,614.95
Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	\$ 18,362.94	\$ 1,332.00	\$ 61,332.00	\$ 2,498.67	\$ 12,998.67	\$ 2,498.67	\$ 6,332.00	\$ 2,932.00	\$ 5,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 117,614.95
Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



# Plan Financiero (PF): Mejorar el acceso a la Justicia / Proyecto Organismo Judicial

SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN

AREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS / Unidad Coejecutora del Prestamo BID 1905 OC/GU "Apoyo al Sector Justicia Penal"

## Plan de Pagos y Desembolsos

	2017												Total 2017
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Proceso de Adquisición: Servicio de Reparación y Mantenim	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	\$ 17,030.94	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 1,166.67	\$ 11,666.67	\$ 1,166.67	\$ 5,000.00	\$ 1,600.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Vehículos para el Equipamiento de	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Adquisición de Combustibles y lubri	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	\$ 4,265.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	\$ 1,018.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	\$ 9,747.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Alimentos para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Llantas (Neumaticos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Boletos aereos internacionales 2016	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de eqi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Servicios para vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166.67	\$ 3,666.67	\$ 166.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Adquisición: Primas, seguros y fianzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Personal de la Unidad Coejecutora	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00
Personal de la Unidad Coejecutora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceso de Contratación: Contable Financiero año 2017	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00
IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total general</b>	<b>\$ 19,003.84</b>	<b>\$ 70,755.21</b>	<b>\$ 469,811.79</b>	<b>\$ 42,649.67</b>	<b>\$ 84,380.67</b>	<b>\$ 14,366.67</b>	<b>\$ 17,132.00</b>	<b>\$ 12,797.00</b>	<b>\$ 15,467.00</b>	<b>\$ 17,073.00</b>	<b>\$ 11,197.00</b>	<b>\$ 1,332.00</b>	<b>\$ 775,965.85</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP)  
Programa de Apoyo al Sector Judicial Penal (BID 1905/OC-GU)  
En USD

Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Inicio real	Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
<b>Componente 1: Acceso a la Justicia</b>															
<b>P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)</b>															
Centros Integrados de Justicia funcionando	1093 días	mié 02/01/13	mar 11/04/17	mié 02/01/13	NOD	73%			27,363.00		16,563.00	0.60530644			
CJ de Villa Nueva, Guatemala	1093 días	mié 02/01/13	mar 11/04/17	mié 02/01/13	NOD	73%			27,363.00		16,563.00	0.60530644			
Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)	223 días	vie 20/05/16	mar 11/04/17	vie 20/05/16	NOD	56%			11,441.00		641.00	0.60530644			
<b>Etapas de Adquisición:</b>															
TR para consultor ambiental	93 días	vie 20/05/16	vie 30/09/16	vie 20/05/16	vie 30/09/16	100%						0.05602657			
Solicitud de No Objeción	32 días	vie 20/05/16	lun 04/07/16	vie 20/05/16	lun 04/07/16	100%									
No Objeción a TDR	10 días	mar 05/07/16	lun 18/07/16	mar 05/07/16	lun 18/07/16	100%									
Invitación	1 día	mar 19/07/16	mar 19/07/16	mar 19/07/16	mar 19/07/16	100%	19								
Evaluación CV	5 días	mié 27/07/16	mié 03/08/16	mié 27/07/16	mié 03/08/16	100%	21								
Solicitud de No Objeción	5 días	jue 04/08/16	mié 10/08/16	jue 04/08/16	mié 10/08/16	100%	22								
No Objeción	4 días	jue 11/08/16	mar 16/08/16	jue 11/08/16	mar 16/08/16	100%	23								
Contratación consultor ambiental	0 días	mié 17/08/16	mié 17/08/16	mié 17/08/16	mié 17/08/16	100%	24								
Contratación consultor ambiental	5 días	lun 26/09/16	vie 30/09/16	lun 26/09/16	vie 30/09/16	100%	25								
<b>Etapas de Ejecución de Pago:</b>															
Pago No. 1	88 días	jue 01/12/16	mar 11/04/17	jue 01/12/16	NOD	25%			11,441.00		641.00	0.05602657			
Pago No. 2	22 días	jue 01/12/16	vie 06/01/17	jue 01/12/16	vie 06/01/17	100%	26		641.00		641.00	1			
Pago No.3	44 días	lun 09/01/17	jue 09/03/17	NOD	NOD	0%	28		6,750.00		0.00	0			
P3. Juzgados de Paz remodelados (OJ)	22 días	vie 10/03/17	mar 11/04/17	NOD	NOD	0%	29		4,050.00		0.00	0			
Juzgados de Paz funcionando	378 días	mar 03/11/15	mié 03/05/17	mar 03/11/15	NOD	56%			427,441.00		70,006.00	0.16377933			
Juzgados de Paz funcionando	378 días	mar 03/11/15	mié 03/05/17	mar 03/11/15	NOD	56%			427,441.00		70,006.00	0.16377933			
Proceso de Contratación: Remozamiento de 11 Juzgados de Paz	372 días	mar 03/11/15	lun 24/04/17	mar 03/11/15	NOD	65%			406,759.00		69,325.00	0.17043261			
<b>Etapas de Adquisición:</b>															
TDR elaborados	284 días	mar 03/11/15	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16	100%									
TDR revisados	45 días	mar 03/11/15	lun 11/01/16	mar 03/11/15	lun 11/01/16	100%									
No Objeción a TDR y proceso	14 días	mar 12/01/16	vie 29/01/16	mar 12/01/16	vie 29/01/16	100%	237								
Publicación / Invitación	25 días	mié 09/03/16	vie 08/04/16	mié 09/03/16	vie 08/04/16	100%									
Publicación / Invitación	20 días	vie 13/05/16	jue 09/06/16	vie 13/05/16	jue 09/06/16	100%									
Adjudicación	1 día	mié 22/06/16	mié 22/06/16	mié 22/06/16	mié 22/06/16	100%	240								
Apertura ofertas remozamientos juzgados	15 días	mié 22/06/16	mar 12/07/16	mié 22/06/16	mar 12/07/16	100%	241								
NOB evaluación	37 días	mié 13/07/16	lun 05/09/16	mié 13/07/16	lun 05/09/16	100%	242								
Firma de contrato	69 días	mar 06/09/16	mar 13/12/16	mar 06/09/16	mar 13/12/16	100%	243								
<b>Etapas de Ejecución: Lote 1</b>															
Entrega del sitio de obra 2 Remozamientos Senahú A.V. y Morales, Izabal	55 días	lun 30/01/17	lun 17/04/17	lun 30/01/17	NOD	35%			88,900.00		20,885.00	0.23492688			
Orden de Inicio 2 Remozamientos Senahú A.V. y Morales, Izabal	3 días	lun 30/01/17	mié 01/02/17	lun 30/01/17	mié 01/02/17	100%	244FC+28 días								
Primer pago conforme a contrato	1 día	lun 06/02/17	lun 06/02/17	lun 06/02/17	lun 06/02/17	100%	246								
Segundo Pago conforme a contrato	12 días	jue 16/02/17	vie 03/03/17	jue 16/02/17	vie 03/03/17	100%	247		20,885.00		20,885.00	1			
Entrega y Recepción Final	10 días	lun 06/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	0%	248		56,770.00		0.00	0			
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	lun 20/03/17	vie 31/03/17	NOD	NOD	0%	249								
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	NOD	NOD	0%	250		8,245.00		0.00	0			
<b>Etapas de Ejecución: Lote 2</b>															
Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Uspantán, Cubulco y San Miguel Chicaj	57 días	jue 02/02/17	lun 24/04/17	NOD	NOD	0%			107,561.00		0.00	0			
Orden de Inicio 3 Remozamientos Uspantán, Cubulco y San Miguel Chicaj	2 días	jue 02/02/17	vie 03/02/17	NOD	NOD	0%									
Primer pago conforme a contrato	5 días	lun 06/02/17	vie 10/02/17	NOD	NOD	0%	253								
Segundo Pago conforme a contrato	20 días	lun 13/02/17	vie 10/03/17	NOD	NOD	0%	254		53,909.00		0.00	0			
Entrega y Recepción Final	10 días	lun 13/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	0%	255		51,804.00		0.00	0			
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	lun 27/03/17	lun 10/04/17	NOD	NOD	0%	256								
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	mar 11/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD	0%	257		1,548.00		0.00	0			
<b>Etapas de Ejecución: Lote 3</b>															
Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Taxisco, Sanarate y San Antonio La Paz	64 días	mar 17/01/17	lun 17/04/17	mar 17/01/17	NOD	33%			10,360.00		24,991.00	2.41225869			
Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Taxisco, Sanarate y San Antonio La Paz	2 días	mar 17/01/17	mié 18/01/17	mar 17/01/17	mié 18/01/17	100%									

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP)  
 Programa de Apoyo al Sector Judicial Penal (BID 1905/OC-GU)  
 En USD

Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Inicio real	Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Orden de Inicio 3 Remozamientos Taxico, Sanarate y San Antonio La Paz	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	260								
Primer pago conforme a contrato	12 días	jue 16/02/17	vie 03/03/17	jue 16/02/17	vie 03/03/17	100%	261		24,991.00		24,991.00	1			
Segundo Pago conforme a contrato	10 días	lun 06/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	0%	262		62,014.00		0.00	0			
Entrega y Recepcion Final	10 días	lun 20/03/17	vie 31/03/17	NOD	NOD	0%	263								
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	NOD	NOD	0%	264		16,595.00		0.00	0			
<b>Etapas de Ejecución: Lote 4</b>	<b>63 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>lun 24/04/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>	<b>36%</b>			<b>106,698.00</b>		<b>23,449.00</b>	<b>0.21976982</b>			
Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos San Pedro Sac., Tacaná y Tecún Uman	3 días	mié 25/01/17	vie 27/01/17	mié 25/01/17	vie 27/01/17	100%									
Orden de Inicio 3 Remozamientos San Pedro Sac., Tacaná y Tecún Uman	5 días	jue 26/01/17	vie 03/02/17	jue 26/01/17	vie 03/02/17	100%	267								
Primer pago conforme a contrato	12 días	jue 16/02/17	vie 03/03/17	jue 16/02/17	vie 03/03/17	100%	268		23,449.00		23,449.00	1			
Segundo Pago conforme a contrato	10 días	lun 06/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	0%	269		67,295.00		0.00	0			
Entrega y Recepcion Final	15 días	lun 20/03/17	lun 10/04/17	NOD	NOD	0%	270								
Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	10 días	mar 11/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD	0%	271		15,954.00		0.00	0			
<b>Proceso de Contratación: Supervisión de 11 remozamientos en Juzgados de Paz</b>	<b>352 días</b>	<b>mar 08/12/15</b>	<b>mié 03/05/17</b>	<b>mar 08/12/15</b>	<b>NOD</b>	<b>44%</b>			<b>20,682.00</b>		<b>681.00</b>	<b>0.03292718</b>			
<b>Etapas de Adquisición:</b>	<b>255 días</b>	<b>mar 08/12/15</b>	<b>jue 08/12/16</b>	<b>mar 08/12/15</b>	<b>jue 08/12/16</b>	<b>100%</b>									
TDR elaborados	23 días	mar 08/12/15	vie 15/01/16	mar 08/12/15	vie 15/01/16	100%									
TDR revisados	10 días	lun 18/01/16	vie 29/01/16	lun 18/01/16	vie 29/01/16	100%	275								
No Objeción a TDR y proceso	36 días	vie 29/01/16	mié 16/03/16	vie 29/01/16	mié 16/03/16	100%	276								
Publicación / Invitación	18 días	vie 15/07/16	jue 11/08/16	vie 15/07/16	jue 11/08/16	100%	277								
Ofertas recibidas	20 días	vie 12/08/16	jue 08/09/16	vie 12/08/16	jue 08/09/16	100%	278								
Apertura	1 día	jue 22/09/16	jue 22/09/16	jue 22/09/16	jue 22/09/16	100%	279								
Evaluación y recomendación adjudicación	1 día	vie 23/09/16	vie 23/09/16	vie 23/09/16	vie 23/09/16	100%	280								
NOB evaluación	6 días	lun 26/09/16	lun 03/10/16	lun 26/09/16	lun 03/10/16	100%	281								
Firma de contrato	47 días	mar 04/10/16	jue 08/12/16	mar 04/10/16	jue 08/12/16	100%	282								
<b>Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 1</b>	<b>87 días</b>	<b>vie 03/06/16</b>	<b>jue 06/10/16</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>0%</b>			<b>7,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
10% Avance	40 días	vie 03/06/16	vie 29/07/16	NOD	NOD	0%			760.00		0.00	0			
40% avance	10 días	lun 01/08/16	lun 15/08/16	NOD	NOD	0%	285		3,040.00		0.00	0			
40% Avance	20 días	mar 16/08/16	lun 12/09/16	NOD	NOD	0%	286		3,040.00		0.00	0			
10% fin contrato	17 días	mar 13/09/16	jue 06/10/16	NOD	NOD	0%	287		760.00		0.00	0			
<b>Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 3</b>	<b>188 días</b>	<b>lun 01/08/16</b>	<b>mié 03/05/17</b>	<b>lun 01/08/16</b>	<b>NOD</b>	<b>20%</b>			<b>6,682.00</b>		<b>681.00</b>	<b>0.10191559</b>			
10% Avance	10 días	mar 07/03/17	lun 20/03/17	mar 07/03/17	lun 20/03/17	100%			681.00		681.00	1			
40% avance	10 días	lun 01/08/16	lun 15/08/16	NOD	NOD	0%	285		2,667.00		0.00	0			
40% avance	20 días	mar 21/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD	0%	295		2,667.00		0.00	0			
10% fin contrato	10 días	mié 19/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD	0%	297		667.00		0.00	0			
<b>Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 4</b>	<b>174 días</b>	<b>lun 01/08/16</b>	<b>mié 12/04/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>0%</b>			<b>640.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
10% Avance	50 días	vie 09/12/16	jue 23/02/17	NOD	NOD	0%			640.00		0.00	0			
40% avance	10 días	lun 01/08/16	lun 15/08/16	NOD	NOD	0%	285		2,560.00		0.00	0			
40% avance	20 días	vie 24/02/17	jue 23/03/17	NOD	NOD	0%	300		2,560.00		0.00	0			
10% fin contrato	13 días	vie 24/03/17	mié 12/04/17	NOD	NOD	0%	302		640.00		0.00	0			
<b>Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)</b>	<b>983 días</b>	<b>mar 04/02/14</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>mar 04/02/14</b>	<b>NOD</b>	<b>77%</b>			<b>13,699.00</b>		<b>5,846,322.00</b>	<b>426.769983</b>			
<b>P1. Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones</b>	<b>983 días</b>	<b>mar 04/02/14</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>mar 04/02/14</b>	<b>NOD</b>	<b>77%</b>			<b>13,699,644.00</b>		<b>5,846,322.00</b>	<b>0.42674992</b>			
<b>Interconexión en OJ</b>	<b>876 días</b>	<b>mar 20/05/14</b>	<b>jue 02/11/17</b>	<b>mar 20/05/14</b>	<b>NOD</b>	<b>66%</b>			<b>1,260,812.00</b>		<b>1,103,490.00</b>	<b>0.87522168</b>			
<b>Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionando (OI)</b>	<b>876 días</b>	<b>mar 20/05/14</b>	<b>jue 02/11/17</b>	<b>mar 20/05/14</b>	<b>NOD</b>	<b>66%</b>			<b>1,260,812.00</b>		<b>1,103,490.00</b>	<b>0.87522168</b>			
<b>Proceso de Adquisición: Software especializado (Sistemas estadísticos, Business Intelligence, etc.) tableu</b>	<b>160 días</b>	<b>mar 08/11/16</b>	<b>mié 28/06/17</b>	<b>mar 08/11/16</b>	<b>NOD</b>	<b>43%</b>			<b>61,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
<b>Etapas de Adquisición:</b>	<b>140 días</b>	<b>mar 08/11/16</b>	<b>mié 31/05/17</b>	<b>mar 08/11/16</b>	<b>NOD</b>	<b>50%</b>									

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP)  
Programa de Apoyo al Sector Judicial Penal (BID 1905/OC-GU)  
En USD

Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Inicio real	Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Preparación de bases de licitación	3 días	mar 08/11/16	jue 10/11/16	mar 08/11/16	jue 10/11/16	100%									
Solicitud de No Objeción a las bases y al proceso	12 días	vie 11/11/16	lun 28/11/16	mar 08/11/16	jue 10/11/16	100%									
Publicación	21 días	lun 13/02/17	lun 13/03/17	lun 13/02/17	lun 13/03/17	100%	1129								
Nombramiento de junta receptora	20 días	mié 01/02/17	vie 10/03/17	mié 01/02/17	vie 10/03/17	100%	1130								
Recepción y Evaluación	15 días	lun 13/03/17	mar 04/04/17	lun 13/03/17	NOD	0%	1131								
No Objeción a la adjudicación	10 días	mié 05/04/17	mar 18/04/17	NOD	NOD	0%	1133								
Contratación	30 días	mié 19/04/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	0%	1134								
<b>Etapa de Ejecución de Pago:</b>															
Entrega del Bien	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			61,250.00		0.00	0			
<b>Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fas</b>	<b>176 días</b>	<b>mar 25/10/16</b>	<b>jue 06/07/17</b>	<b>mar 25/10/16</b>	<b>NOD</b>	<b>49%</b>	<b>1135</b>		<b>61,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
<b>Etapa de Adquisición:</b>	<b>111 días</b>	<b>mar 25/10/16</b>	<b>mié 05/04/17</b>	<b>mar 25/10/16</b>	<b>NOD</b>	<b>90%</b>			<b>2,631.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
Preparación de TDR's	10 días	mar 25/10/16	lun 07/11/16	mar 25/10/16	lun 07/11/16	100%									
No Objeción a Tdr's	2 días	mar 08/11/16	mié 09/11/16	mar 08/11/16	mié 09/11/16	100%	1140								
Aprobación y Nombramiento de Comisión	5 días	jue 10/11/16	mié 16/11/16	jue 10/11/16	mié 16/11/16	100%	1141								
Evaluación CV's	53 días	lun 09/01/17	mié 22/03/17	lun 09/01/17	mié 22/03/17	100%	1142								
No Objeción a Evaluación	3 días	vie 24/03/17	mar 28/03/17	vie 24/03/17	NOD	0%	1143								
Contratación	5 días	mié 29/03/17	mié 05/04/17	NOD	NOD	0%	1144								
<b>Etapa de Ejecución de Pago:</b>	<b>65 días</b>	<b>jue 06/04/17</b>	<b>jue 06/07/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>0%</b>			<b>2,631.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
Pago 1	15 días	jue 06/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	0%	1145		2,631.00		0.00	0			
Pago 2	20 días	jue 27/04/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	0%	1147				0.00	0			
Pago 3 y fin del contrato	30 días	vie 26/05/17	jue 06/07/17	NOD	NOD	0%	1148								
<b>Proceso de Contratación: Capacitación (Administración de Base de Datos, Herramienta Estadística y BI)</b>	<b>233 días</b>	<b>lun 28/11/16</b>	<b>jue 02/11/17</b>	<b>lun 28/11/16</b>	<b>NOD</b>	<b>26%</b>			<b>4,941.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
<b>Etapa de Adquisición:</b>	<b>213 días</b>	<b>lun 28/11/16</b>	<b>mié 04/10/17</b>	<b>lun 28/11/16</b>	<b>NOD</b>	<b>29%</b>									
Preparación de TDR's	15 días	lun 28/11/16	vie 16/12/16	lun 28/11/16	vie 16/12/16	100%									
Solicitud y No Objeción a TDR's	14 días	lun 19/12/16	jue 12/01/17	lun 19/12/16	jue 12/01/17	100%	1152								
Nombramiento de Junta Calificadora	31 días	mié 18/01/17	mié 01/03/17	mié 18/01/17	mié 01/03/17	100%	1153								
Evaluación y adjudicación	10 días	jue 02/03/17	mié 15/03/17	mar 21/03/17	NOD	0%	1154								
Solicitud de No Objeción a la adjudicación	10 días	jue 16/03/17	mié 29/03/17	NOD	NOD	0%	1155								
Contratación	40 días	jue 30/03/17	vie 26/05/17	NOD	NOD	0%	1156								
Entrega del Bien	90 días	lun 29/05/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	0%	1157								
<b>Etapa de Ejecución de Pago:</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 05/10/17</b>	<b>jue 02/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>0%</b>			<b>4,941.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
Pago 1	20 días	jue 05/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	1158		4,941.00		0.00	0			
<b>Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Interconexión de Flujos Alternos entre el OJ e Instituciones del Sector Justicia 2017 (CONSULTOR 1)</b>	<b>75 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>	<b>15%</b>			<b>11,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
<b>Etapa de Adquisición:</b>	<b>45 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 17/03/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>	<b>26%</b>									
Elaboración de Tdr's	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	lun 16/01/17	vie 20/01/17	100%									
Solicitud y No objeción a TDRs	6 días	mié 25/01/17	mié 01/02/17	mié 25/01/17	mié 01/02/17	100%	1174								
Evaluación y adjudicación	12 días	jue 02/02/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	0%	1175								
Solicitud de No objeción a la adjudicación	10 días	lun 20/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	0%	1176								
Contratación	10 días	lun 06/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	0%	1177								
<b>Etapa de Ejecución de Pago:</b>	<b>30 días</b>	<b>lun 20/03/17</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>0%</b>			<b>11,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
Pagos	30 días	lun 20/03/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	0%	1178		11,750.00		0.00	0			
<b>Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Interconexión de Flujos Principales entre el OJ e Instituciones del Sector Justicia Penal 2017 (CONSULTOR 2)</b>	<b>118 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 30/06/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>	<b>14%</b>			<b>11,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>			
<b>Etapa de Adquisición:</b>	<b>88 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 19/05/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>	<b>23%</b>									
Elaboración de Tdr's	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	lun 16/01/17	vie 20/01/17	100%									
Solicitud y No objeción a TDRs	6 días	mié 25/01/17	mié 01/02/17	mié 25/01/17	mié 01/02/17	100%	1183								
Evaluación y adjudicación	12 días	mar 28/03/17	jue 13/04/17	mar 28/03/17	NOD	0%	1184								
Solicitud de No objeción a la adjudicación	15 días	vie 14/04/17	vie 05/05/17	NOD	NOD	0%	1185								
Contratación	10 días	lun 08/05/17	vie 19/05/17	NOD	NOD	0%	1186								

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP)  
Programa de Apoyo al Sector Judicial Penal (BID 1905/OC-GU)  
En USD

Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Inicio real	Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
<b>Etapas de Ejecución de Pago:</b>	30 días	lun 22/05/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%									
Pagos	30 días	lun 22/05/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%			11,750.00		0.00	0			
<b>Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Interconexión para el INACIF Y EL OJ 2017 (CONSULTOR 3)</b>	113 días	lun 16/01/17	vie 23/06/17	lun 16/01/17	NOD	15%	1187		11,750.00		0.00	0			
<b>Etapas de Adquisición:</b>	83 días	lun 16/01/17	vie 12/05/17	lun 16/01/17	NOD	26%			3,250.00		0.00	0			
Elaboración de Tdr's	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	lun 16/01/17	vie 20/01/17	100%									
Solicitud y No objeción a TDRs	6 días	mié 25/01/17	mié 01/02/17	mié 25/01/17	mié 01/02/17	100%									
Evaluación y adjudicación	12 días	mar 28/03/17	jue 13/04/17	mar 28/03/17	NOD	0%	1192								
Solicitud de No objeción a la adjudicación	10 días	vie 14/04/17	jue 27/04/17	NOD	NOD	0%	1193								
Contratación	10 días	vie 28/04/17	vie 12/05/17	NOD	NOD	0%	1194								
<b>Etapas de Ejecución de Pago:</b>	30 días	lun 15/05/17	vie 23/06/17	NOD	NOD	0%	1195								
Pagos	30 días	lun 15/05/17	vie 23/06/17	NOD	NOD	0%			32,500.00		0.00	0			
<b>Proceso de contratación: Desarrollo de Módulo de Interconexión entre OJ e Instituciones del Sector Justicia Penal 2017 (CONSULTOR 4)</b>	102 días	lun 16/01/17	jue 08/06/17	lun 16/01/17	NOD	38%	1196		32,500.00		0.00	0			
<b>Etapas de Adquisición:</b>	72 días	lun 16/01/17	mié 26/04/17	lun 16/01/17	NOD	54%			3,250.00		0.00	0			
Elaboración de Tdr's	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	lun 16/01/17	vie 20/01/17	100%									
Solicitud y No objeción a TDRs	33 días	mié 25/01/17	vie 10/03/17	mié 25/01/17	vie 10/03/17	100%	1201								
Evaluación y adjudicación	12 días	lun 13/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	0%	1202								
Solicitud de No objeción a la adjudicación	10 días	mié 29/03/17	mié 12/04/17	NOD	NOD	0%	1203								
Contratación	10 días	jue 13/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	0%	1204								
<b>Etapas de Ejecución de Pago:</b>	30 días	jue 27/04/17	jue 08/06/17	NOD	NOD	0%			3,250.00		0.00	0			
Pagos	30 días	jue 27/04/17	jue 08/06/17	NOD	NOD	0%	1205		3,250.00		0.00	0			
<b>Administración</b>	1333 días	lun 10/06/13	vie 07/09/18	lun 10/06/13	NOD	69%			2,945,902.00		1,932,532.00	0.65600689			
<b>Gastos indirectos e imprevistos (OJ)</b>	1147 días	mar 16/07/13	vie 19/01/18	mar 16/07/13	NOD	83%			265,997.00		202,677.00	0.7619522			
<b>Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)</b>	379 días	mar 12/01/16	jue 06/07/17	NOD	NOD	0%			5,000.00		0.00	0			
<b>Adquisición</b>	60 días	mié 01/03/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	0%					0.00	0			
Elaboración de Especificaciones Tecnicas	10 días	mié 01/03/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	0%									
Especificaciones revisados	10 días	mié 15/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	0%									
No Objeción a Especificaciones y proceso	6 días	mié 29/03/17	jue 06/04/17	NOD	NOD	0%	3422								
Publicación / Invitación	5 días	vie 07/04/17	jue 13/04/17	NOD	NOD	0%	3423								
Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	15 días	vie 14/04/17	vie 05/05/17	NOD	NOD	0%	3424								
Solicitud de NOB evaluación	8 días	lun 08/05/17	mié 17/05/17	NOD	NOD	0%	3425								
Elaboración y Firma de Orden Compra	5 días	jue 18/05/17	mié 24/05/17	NOD	NOD	0%	3426								
Entrega de Equipo con mantenimiento y reparación	1 día	jue 25/05/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	0%	3427								
<b>Etapas de Ejecución de pagos:</b>	30 días	vie 26/05/17	jue 06/07/17	NOD	NOD	0%	3428								
Pago 1	30 días	vie 26/05/17	jue 06/07/17	NOD	NOD	0%			5,000.00		0.00	0			
<b>Personal de la Unidad Coejecutora</b>	1147 días	mar 16/07/13	vie 19/01/18	mar 16/07/13	NOD	81%	3429		5,000.00		0.00	0			
<b>Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017</b>	249 días	lun 23/01/17	vie 19/01/18	lun 23/01/17	NOD	13%			69,564.00		56,244.00	0.80852165			
<b>Etapas de Adquisición:</b>	29 días	lun 23/01/17	jue 02/03/17	lun 23/01/17	jue 02/03/17	100%			16,034.00		2,714.00	0.16926531			
Solicitud de Recontratación	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	lun 23/01/17	vie 27/01/17	100%									
No Objeción a recontratación	3 días	lun 30/01/17	mié 01/02/17	lun 30/01/17	mié 01/02/17	100%	3514								
Contratación	21 días	jue 02/02/17	jue 02/03/17	jue 02/02/17	jue 02/03/17	100%	3515								
<b>Etapas de ejecución de pagos</b>	211 días	jue 16/03/17	vie 19/01/18	jue 16/03/17	NOD	0%			16,034.00		2,714.00	0.16926531			
Pago 1 enero	1 día	jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17	100%			1,357.00		1,357.00	1			
Pago 2 febrero	0 días	jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17	100%			1,357.00		1,357.00	1			
Pago 3 marzo	23 días	jue 23/03/17	mar 25/04/17	jue 23/03/17	NOD	0%	3519		1,332.00		0.00	0			
Pago 4 abril	19 días	mié 26/04/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	0%	3520		1,332.00		0.00	0			
Pago 5 mayo	22 días	mié 24/05/17	jue 22/06/17	NOD	NOD	0%	3521		1,332.00		0.00	0			
Pago 6 junio	22 días	vie 23/06/17	lun 24/07/17	NOD	NOD	0%	3522		1,332.00		0.00	0			
Pago 7 Julio	20 días	mié 26/07/17	mié 23/08/17	NOD	NOD	0%	3523		1,332.00		0.00	0			
Pago 8 agosto	22 días	jue 24/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	3524		1,332.00		0.00	0			

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP)  
 Programa de Apoyo al Sector Judicial Penal (BID 1905/OC-GU)  
 En USD

Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Inicio real	Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Pago 9 septiembre	20 días	mar 26/09/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	3525		1,332.00		0.00	0			
Pago 10 octubre	21 días	mié 25/10/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	3526		1,332.00		0.00	0			
Pago 11 Noviembre	22 días	jue 23/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	3527		1,332.00		0.00	0			
Pago 12 diciembre	15 días	lun 01/01/18	vie 19/01/18	NOD	NOD	0%	3528		1,332.00		0.00	0			
IMPREVISTOS	240 días	lun 02/01/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			45,000.00		0.00	0			
Imprevistos	240 días	lun 02/01/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			45,000.00		0.00	0			

①  
/
