


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Noviembre / 2017**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/12/2017
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,879,175.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,879,175.00	Meses de Prorroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	28,473,144.50	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31 62.65%	Monto por desembolsar USDS	1,448,734.69 37.35%

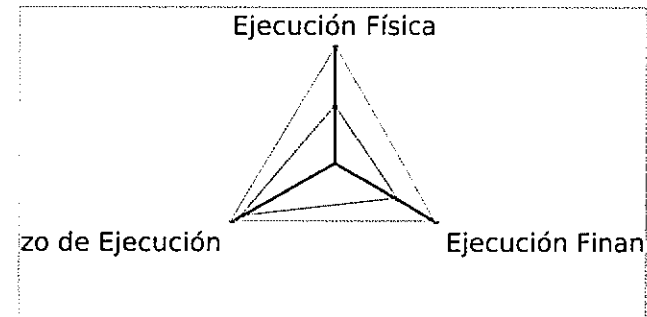

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Handwritten signature or initials.

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	43,636,371.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	47,507,152.48	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	3,663,824.50	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	97.83% / 97.83%		
Porcentaje de Ejecución	7.71%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

90

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	0		11		0	8	11	8
Informes de Supervision de Remozamientos	Unidad	6	6	6	3	0		12	9
Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	Unidad	0		15	2	15	6	30	8
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)	Unidad	0		1	1	0		1	1
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	0		1	1	0	0	1	1
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II	Unidad	0		1		0	1	1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	18/01/2017	18/01/2017	24/03/2017	27/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	23/05/2017	26/05/2017	28/08/2017
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)											
Bien	Licitación Pública Nacional	11/11/2016	11/11/2016	14/02/2017	15/05/2017	13/03/2017	13/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	30/05/2017	
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/10/2016	07/11/2016	13/12/2016	13/12/2016	04/01/2017	09/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	15/05/2017	26/06/2017
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/11/2016	16/12/2016	21/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	19/05/2017	28/04/2017	12/06/2017	15/05/2017	13/09/2017
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Bienes, insumos y/o Servicios	Comparación de Precios	04/01/2017	04/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	12/04/2017	12/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	05/05/2017


Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	347,610.00	2,863,432.00	195,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,394.00
Informes de Supervision de Remozamientos													
Servicios	0.00	102,000.00	81,600.00	20,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,007.00
Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva													
Servicios	4,807.00	0.00	0.00	50,625.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,807.00
Total componente	4,807.00	449,610.00	2,945,032.00	266,384.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,208.00
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	555,589.00
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	189,000.00
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II													

90 =

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,057.00	0.00	0.00	37,057.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	140,109.00	103,052.00	103,052.00	1,241,421.00
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Bienes, insumos y/o Servicios	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
Total componente	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
Total	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	492,990.00	113,042.00	150,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00	5,207,741.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Re.

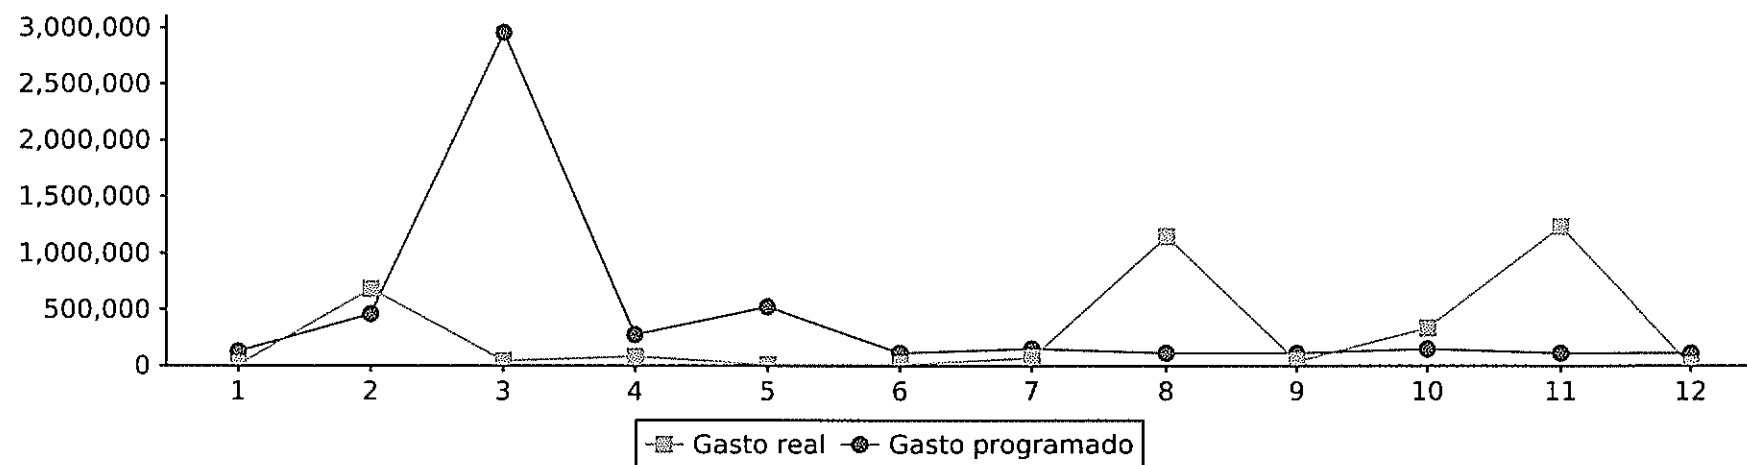

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	681,279.26	43,153.33	82,500.00	10,000.00	10,000.00	67,526.52	1,148,403.69	38,000.00	337,838.40	1,235,323.30	0.00
Gasto programado	127,529.00	459,600.00	2,955,022.00	276,374.00	523,365.00	113,042.00	150,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00
Total Gasto real												3,654,024.50
Total Gasto programado												5,207,741.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id	% Avance	Fuente	PMR/Pr/Identifica empresa	EDT	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula Costo Real	Anticipo
0	89%			No 0	PEP_SMART_1905,0	mié 02/01/13	jun 23/04/18	mié 02/01/13		NOD	\$2,157,232 Fin	\$1,840,593	\$0
1	89%	BID		No 1	Componente 1: Acceso a la Justicia	mié 02/01/13	jue 14/12/17	mié 02/01/13		NOD	\$562,259 Fin	\$422,610	\$0
2	100%	BID		No 1.1	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
3	100%	BID		No 1.1.1	Centros Integrados de Justicia funcionando	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
4	100%	BID		No 1.1.1.1	CIJ de Villa Nueva, Guatemala	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
5	100%	BID		No 1.1.1.1.1	Proceso de contratación: Consultores Dibujantes (2 consultores) Villa Nueva	jue 17/03/16	mié 14/12/17	jue 17/03/16	mié 14/12/16		\$6,243 Fin	\$6,243	\$0
16	100%	BID		No 1.1.1.1.2	Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)	vie 20/05/16	lun 26/12/16	vie 20/05/16	lun 26/12/16		\$689 Fin	\$689	\$0
30	100%	BID		No 1.1.1.1.3	Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y/o 1 Ingeniero)	mié 02/01/13	mar 29/07/17	mié 02/01/13	mar 29/07/14		\$11,509 Fin	\$11,509	\$0
38	89%	BID		No 1.2	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	mar 03/11/15	jue 14/12/17	mar 03/11/15		NOD	\$543,818 Fin	\$404,169	\$0
39	89%	BID		No 1.2.1	Juzgados de Paz funcionando	mar 03/11/15	jue 14/12/17	mar 03/11/15		NOD	\$543,818 Fin	\$404,169	\$0
40	100%			No 1.2.1.1	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	lun 07/12/15	lun 25/01/16	lun 07/12/15	lun 25/01/16		\$0 Fin	\$0	\$0
41	89%	BID		No 1.2.1.2	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de	mar 03/11/15	jue 14/12/17	mar 03/11/15		NOD	\$522,674 Fin	\$385,094	\$0
42	100%			No 1.2.1.2.1	Etapas de Adquisición:	mar 03/11/15	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
51	100%	BID		No 1.2.1.2.2	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$107,727 Fin	\$107,727	\$0
64	26%	BID		No 1.2.1.2.3	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	vie 13/05/16	jue 14/12/17	vie 13/05/16		NOD	\$159,561 Fin	\$21,981	\$0
78	100%	BID		No 1.2.1.2.4	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$132,994 Fin	\$132,994	\$0
92	100%	BID		No 1.2.1.2.5	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$122,392 Fin	\$122,392	\$0
106	86%	BID		No 1.2.1.3	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	mar 08/12/15	mar 14/11/17	mar 08/12/15		NOD	\$21,144 Fin	\$19,075	\$0
107	100%			No 1.2.1.3.1	Etapas de Adquisición:	mar 08/12/15	jue 08/12/16	mar 08/12/15	jue 08/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
117	61%	BID		No 1.2.1.3.2	Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 1/Lester Antonio Orellana Mejía	jue 20/04/17	mar 14/11/17	jue 20/04/17		NOD	\$7,792 Fin	\$7,015	\$0
127	74%	BID		No 1.2.1.3.4	Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 3/ Julio César Morales Cermeño	mar 07/03/17	mar 14/11/17	mar 07/03/17		NOD	\$6,791 Fin	\$6,153	\$0
132	69%	BID		No 1.2.1.3.5	Etapas de Ejecución: Supervisor Lote 4/ Leonel Alberto Paiz Montenegro	jue 20/04/17	mar 14/11/17	jue 20/04/17		NOD	\$6,561 Fin	\$5,907	\$0
137	83%	BID		No 2	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	mar 20/05/14	lun 23/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,789 Fin	\$1,182,325	\$0
138	83%	BID		No 2.1	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	mar 20/05/14	lun 23/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,789 Fin	\$1,182,325	\$0
139	83%	BID		No 2.1.1	Interconexión en OJ	mar 20/05/14	lun 23/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,789 Fin	\$1,182,325	\$0
140	83%	BID		No 2.1.1.1	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionando (OJ)	mar 20/05/14	lun 23/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,275,789 Fin	\$1,182,325	\$0
141	100%	BID		No 2.1.1.1.1	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
149	100%	BID		No 2.1.1.1.2	Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	mar 20/05/14	jue 06/08/15	mar 20/05/14	jue 06/08/15		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
156	100%	BID		No 2.1.1.1.3	Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	mar 08/11/16	mar 31/10/17	mar 08/11/16	mar 31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
167	70%	BID		No 2.1.1.1.4	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	mar 25/10/16	lun 23/04/18	mar 25/10/16		NOD	\$28,446 Fin	\$18,589	\$0
185	100%	BID		No 2.1.1.1.5	Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	lun 28/11/16	vie 01/12/17	lun 28/11/16	vie 01/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
195	100%	BID		No 2.1.1.1.6	Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
205	100%	BID		No 2.1.1.1.7	Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia Penal	jue 05/05/16	mar 23/08/16	jue 05/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
214	53%	BID		No 2.1.1.1.8	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	lun 16/01/17	vie 08/12/17	lun 16/01/17		NOD	\$5,717 Fin	\$1,771	\$0
225	66%	BID		No 2.1.1.1.9	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17		NOD	\$11,457 Fin	\$5,742	\$0

4º Trimestre

Project: PEP_SMART_1905,0 Date: mar 05/12/17	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Margin de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	

Handwritten signature and initials.



Id	% Avance	Fuente	PMR/P/Identificativa empresa	EDT	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
239	75%	BID	No 2.1.1.1.10		Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17		NOD	\$11,459 Fin	\$7,513	\$0
253	100%	BID	No 2.1.1.1.11		Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
255	0%	BID	No 2.1.1.1.12			mié 29/11/17	vie 16/02/18			NOD	\$70,000 Fin	\$0	\$0
277	94%	BID	No 3		Administración	mar 16/07/15	jue 15/03/16	mar 16/07/13		NOD	\$319,184 Fin	\$235,657	\$0
278	94%	BID	No 3.1		Gastos indirectos e imprevistos (OI)	mar 16/07/15	jue 15/03/16	mar 16/07/13		NOD	\$319,184 Fin	\$235,657	\$0
279	100%	BID	No 3.1.1		Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
280	100%	BID	No 3.1.1.1		Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del Edificio Palacio de Justicia	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
295	90%	BID	No 3.1.2		Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	vie 27/06/14	jue 15/03/16	vie 27/06/14		NOD	\$144,968 Fin	\$62,773	\$0
296	100%	BID	No 3.1.2.1		Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	mar 30/12/14	mar 09/02/16	mar 30/12/14	mar 09/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
309	100%	BID	No 3.1.2.2		Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	mar 30/12/14	lun 13/07/15	mar 30/12/14	lun 13/07/15		\$276 Fin	\$276	\$0
322	100%	BID	No 3.1.2.3		Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	mar 22/12/14	lun 26/12/16	mar 22/12/14	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
334	100%	BID	No 3.1.2.4		Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2014	mar 08/07/14	vie 31/10/14	mar 08/07/14	vie 31/10/14		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
347	100%	BID	No 3.1.2.5		Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2016	lun 08/08/16	lun 26/12/16	lun 08/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0
360	100%	BID	No 3.1.2.6		Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
374	100%	BID	No 3.1.2.7		Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
387	100%	BID	No 3.1.2.8		Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	mar 12/01/16	mié 11/01/17	mar 12/01/16	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0
399	100%	BID	No 3.1.2.9		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2014	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
413	100%	BID	No 3.1.2.10		Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año 2014	vie 01/08/14	lun 22/12/14	vie 01/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0
427	100%	BID	No 3.1.2.11		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0
440	100%	BID	No 3.1.2.12		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	lun 21/09/15	mié 06/01/16	lun 21/09/15	mié 06/01/16		\$322 Fin	\$322	\$0
453	100%	BID	No 3.1.2.13		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16		\$934 Fin	\$934	\$0
466	100%	BID	No 3.1.2.14		Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15		\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
479	100%	BID	No 3.1.2.15		Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15		\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
492	100%	BID	No 3.1.2.16		Proceso de Adquisición: Toner 2016	mar 02/08/16	lun 26/12/16	mar 02/08/16	lun 26/12/16		\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
505	100%	BID	No 3.1.2.17		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	mar 02/08/16	mar 20/12/16	mar 02/08/16	mar 20/12/16		\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
518	100%	BID	No 3.1.2.18		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	lun 03/11/14	vie 05/12/14	lun 03/11/14	vie 05/12/14		\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
524	100%	BID	No 3.1.2.19		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15		\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
531	100%	BID	No 3.1.2.20		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	lun 01/02/16	mié 30/11/16	lun 01/02/16	mié 30/11/16		\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
543	100%	BID	No 3.1.2.21		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17		\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
551	77%	BID	No 3.1.2.22		Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	mié 08/11/17	jue 14/12/17	mié 08/11/17		NOD	\$15,000 Fin	\$4,525	\$0
557	56%	BID	No 3.1.2.23		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	lun 03/07/17	mié 29/11/17	lun 03/07/17		NOD	\$10,846 Fin	\$3,749	\$0
563	100%	BID	No 3.1.2.24		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		\$0 Fin	\$0	\$0
573	10%	BID	No 3.1.2.25		Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	lun 06/11/17	mar 05/12/17	lun 06/11/17		NOD	\$4,623 Fin	\$0	\$0
587	0%	BID	No 3.1.2.26		Proceso de Adquisición: Dos vehículos tipo Pick Up	mié 22/11/17	jue 15/03/18			NOD	\$60,000 Fin	\$0	\$0
599	99%	BID	No 3.1.3		Personal de la Unidad CoEjecutora	mar 16/07/13	jue 14/12/13	mar 16/07/13		NOD	\$68,876 Fin	\$67,544	\$0
600	100%	BID	No 3.1.3.1		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2014)	vie 29/11/13	mar 08/07/14	vie 29/11/13	mar 08/07/14		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
613	100%	BID	No 3.1.3.2		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	jue 07/07/16	lun 26/12/16	jue 07/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
626	100%	BID	No 3.1.3.3		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura (año 2014)	mar 16/07/13	jue 24/04/14	mar 16/07/13	jue 24/04/14		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
639	100%	BID	No 3.1.3.4		Proceso de contratación: Contable financiero 2015	mar 06/01/15	mié 23/12/15	mar 06/01/15	mié 23/12/15		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
662	100%	BID	No 3.1.3.5		Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	vie 22/01/16	jue 22/12/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
677	91%	BID	No 3.1.3.6		Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	lun 21/11/16	jue 14/12/16	lun 21/11/16		NOD	\$16,262 Fin	\$14,930	\$0

4º trimestre


Project: PEP_SMART_1905.0	Division crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Margin de demora
Date: mar 05/12/17	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Francisco Rafael Gonzalez Flores 

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Ángel Arnoldo Pineda Avila / Secretario de Área /
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

9/12/2017 - 12:49 PM
