

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	10/09/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,090,618.61	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,090,618.61	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	15,805,076.69	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31	116.25%	Monto por desembolsar USD\$ -339,821.70 -16.25%

**Gráfica de Ejecución**

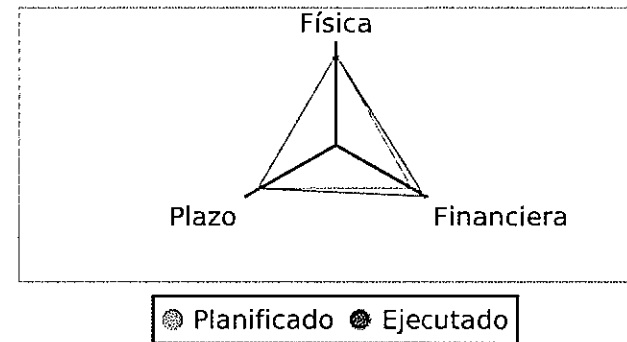


Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD



*[Firma manuscrita]*

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	43,378,689.41	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1,020,814.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	33.56% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	2.35%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		



## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3		0	3	0		3	3
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial	Unidad	0		4	4	0		4	4
<b>Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>									
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2	2	0		0		2	2
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultaría de Des arrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias del Organismo Judicial	Unidad	0		2	2	0		2	2

## Plan Adquisiciones Año Fisca.

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>											
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	30/03/2018	30/03/2018
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	25/04/2018
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriental y Región Nor-occidental)											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	13/04/2018	03/04/2018	20/04/2018
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	06/04/2018		13/04/2018		27/04/2018		04/05/2018		11/05/2018	
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango											
Bienes	Comparación de Precios	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	23/04/2018	13/04/2018		20/04/2018	
<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>											
Informes de consultoría de Sistematizador											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	08/02/2018	15/01/2018	12/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	09/02/2018	23/02/2018
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas											
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	12/02/2018	22/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	14/02/2018	09/02/2018	21/02/2018

Adquisición	Metodo	Propiedad		Lanzamiento de evento		Resolución y ejecución de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"</b>											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	09/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	31/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
<b>VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ</b>											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	22/01/2018	05/02/2018	31/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	15/02/2018
<b>Informes de Consultaría de Des arrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial</b>											
Servicios	Selección Directa (SD)	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	09/04/2018	30/03/2018	17/04/2018
<b>Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango</b>											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
<b>Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia</b>											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
<b>Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados</b>											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
<b>Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial</b>											
Bienes e insumos	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	06/04/2018		13/04/2018	
<b>Administración</b>											
<b>Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa</b>											
Consulta Asistente Contable-Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	21/03/2018
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	Comparación de Precios	05/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/03/2018	19/02/2018		28/02/2018	


9/10

Adquisición	Método	Preparación documental		Lanzamiento de evento		Recepción y validación		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Adquisición de boletos aéreos 2018											
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018		24/01/2018		29/01/2018		31/01/2018		06/02/2018	
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional											
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	22/02/2018	15/02/2018	16/03/2018	22/02/2018	09/04/2018	26/02/2018		28/02/2018	
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	12/04/2018	27/03/2018		13/04/2018	
Informes Consultoría Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	25/05/2018

9.10

## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>													
<b>Remozamiento de Juzgados de Paz</b>													
Servicios	0.00	0.00	466,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.86
<b>Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	61,111.00	91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,777.00
<b>Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
<b>Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-orient e y Región Nor-occidente)</b>													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial</b>													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango</b>													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,580.86</b>	<b>77,311.00</b>	<b>642,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,357.86</b>
<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>													
<b>Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial</b>													



Inicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
<b>Informes de consultoría de Sistematizador</b>													
Servicios	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00
<b>Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas</b>													
Servicios de Consultoría	0.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,992.00
<b>TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"</b>													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,811.00
<b>VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ</b>													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
<b>Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
<b>Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango</b>													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia</b>													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados</b>													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00


② P. H.



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial</b>													
Bienes e insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Total componente</b>	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,648.00
<b>Administración</b>													
<b>Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa</b>													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
<b>Adquisición de boletos aéreos 2018</b>													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
<b>Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional</b>													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
<b>1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados</b>													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
<b>Informes Consulta Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	78,478.00	290,443.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,521.00
<b>Total</b>	0.00	101,478.00	1,228,171.80	77,311.00	1,034,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,520.80

9  
10

### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Re

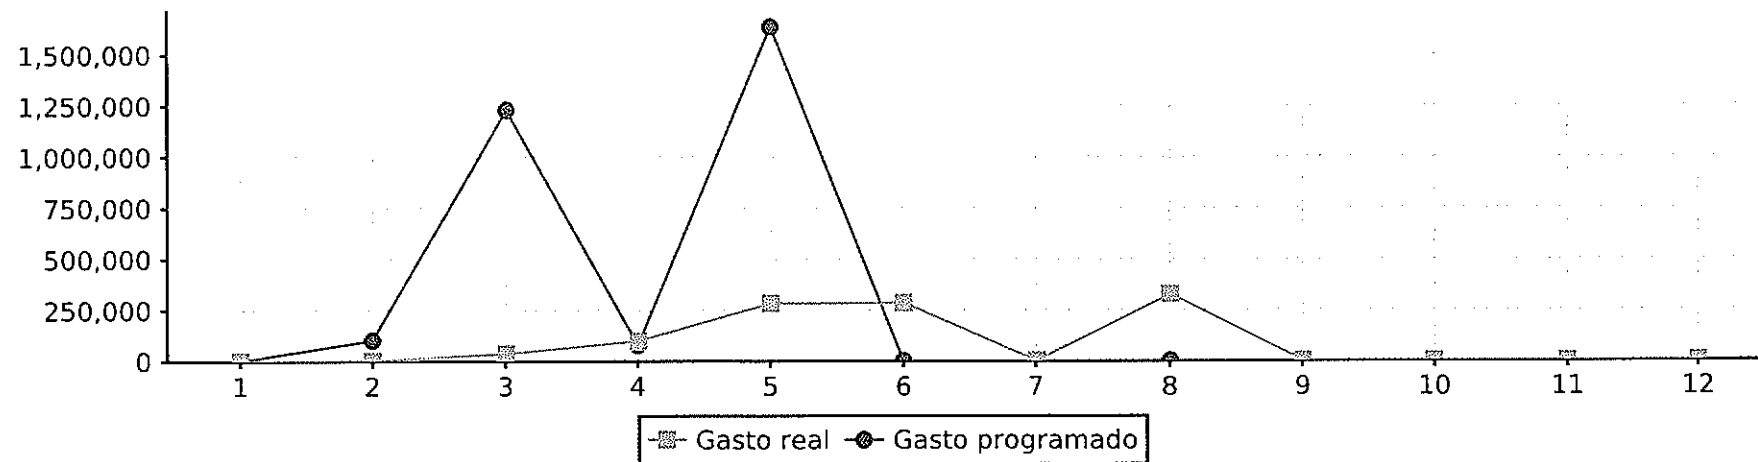

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	0.00	34,516.13	96,360.00	280,106.07	283,516.10	0.00	326,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	101,478.00	1,228,171.86	77,311.00	1,634,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												1,020,814.72
<b>Total Gasto programado</b>												3,041,526.86

9.  
10

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9/10

ID	% Completo a fin de año actual	Fuente	Identificación	EDT	% Avance	Hito	PMR/P. Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo		
0	0%	No	99%	No			PEP_SMART_1905_31 8 2018	0	11472 días	mié 02/01/13	dom 30/09/14	mié 02/01/13			NOO	\$2,040,690 Fin	\$2,040,690	\$0	2007	2008	2009
1	100%	BID	No 1	100%	No		Componente 1: Acceso a la Justicia	0	0 1451 días	mié 02/01/13	vie 31/08/18	mié 02/01/13	vie 31/08/18			\$531,017 Fin	\$531,017	\$0			
2	100%	BID	No 1.1	100%	No		P1. Centros Integrados de Justicia Penal (O)	0	0 1387 días	mié 02/01/13	jue 31/05/18	mié 02/01/13	jue 31/05/18			\$50,676 Fin	\$50,676	\$0			
3	100%	BID	No 1.1.1	100%	No		Centros Integrados de Justicia funcionando	0	0 1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16			\$18,441 Fin	\$18,441	\$0			
4	100%	BID	No 1.1.1.1	100%	No		CII de Villa Nueva, Guatemala	0	0 1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16			\$18,441 Fin	\$18,441	\$0			
5	100%	BID	No 1.1.1.1.1	100%	No		Proceso de Contratación: Consultores Dibujantes (2 consultores) Villa Nueva	0	0 191 días	jue 17/03/16	mié 14/12/16	jue 17/03/16	mié 14/12/16			\$6,243 Fin	\$6,243	\$0			
16	100%	BID	No 1.1.1.1.1	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)	0	0 152 días	vie 20/05/16	lun 26/12/16	vie 20/05/16	lun 26/12/16			\$689 Fin	\$689	\$0			
30	100%	BID	No 1.1.1.1.1	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y/o 1 Ingeniero)	0	0 410 días	mié 02/01/13	mar 29/07/14	mié 02/01/13	mar 29/07/14			\$11,509 Fin	\$11,509	\$0			
38	100%	BID	No 1.1.2	100%	No		Procesos Cámara Penal:	0	0 64 días	vie 02/03/18	jue 31/05/18	vie 02/03/18	jue 31/05/18			\$32,235 Fin	\$32,235	\$0			
39	100%	BID	No 1.1.2.1	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para la Elaboración Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 62 días	mar 06/03/18	jue 31/05/18	mar 06/03/18	jue 31/05/18			\$20,786 Fin	\$20,786	\$0			
49	100%	BID	No 1.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador para Apoyo en los Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 58 días	lun 12/03/18	jue 31/05/18	lun 12/03/18	jue 31/05/18			\$2,139 Fin	\$2,139	\$0			
59	100%	BID	No 1.1.2.3	100%	No		Proceso de Contratación: 6 Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ (Región Nor Oriente) (Región Central) (Región Occidente)	0	0 64 días	vie 02/03/18	jue 31/05/18	vie 02/03/18	jue 31/05/18			\$9,310 Fin	\$9,310	\$0			
69	100%	BID	No 1.2	100%	No		P3. Juzgados de Paz Remodelados (O)	0	0 720 días	mar 03/11/15	vie 31/08/18	mar 03/11/15	vie 31/08/18			\$480,341 Fin	\$480,341	\$0			
77	100%	BID	No 1.2.1	100%	No		Juzgados de Paz funcionando	0	0 720 días	mar 03/11/15	vie 31/08/18	mar 03/11/15	vie 31/08/18			\$480,341 Fin	\$480,341	\$0			
78	100%	BID	No 1.2.1.1	100%	No		Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	0	0 30 días	lun 07/12/15	lun 25/01/16	lun 07/12/15	lun 25/01/16			\$0 Fin	\$0	\$0			
79	100%	BID	No 1.2.1.1.1	100%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz	0	0 720 días	mar 03/11/15	vie 31/08/18	mar 03/11/15	vie 31/08/18			\$459,154 Fin	\$459,154	\$0			
80	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 284 días	mar 03/11/15	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16			\$0 Fin	\$0	\$0			
81	100%	BID	No 1.2.1.2.1	100%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17			\$107,727 Fin	\$107,727	\$0			
90	100%	BID	No 1.2.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	0	0 585 días	vie 13/05/16	vie 31/08/18	vie 13/05/16	vie 31/08/18			\$96,041 Fin	\$96,041	\$0			
103	100%	BID	No 1.2.1.2.1	100%	No		KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	0	0 585 días	vie 13/05/16	vie 31/08/18	vie 13/05/16	vie 31/08/18			\$96,041 Fin	\$96,041	\$0			
104	100%	BID	No 1.2.1.2.1	100%	No		Publicación / Invitación	0	0 20 días	vie 13/05/16	jue 09/06/16	vie 13/05/16	jue 09/06/16			\$0 Fin	\$0	\$0			
105	100%	BID	No 1.2.1.2.2	100%	No		Juzgado de Paz, Lano El Pino, -90.6271937711941,15.1062769849853	0	0 155 días	lun 07/08/17	mar 13/03/18	lun 07/08/17	mar 13/03/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
106	100%	BID	No 1.2.1.2.1	100%	No		Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115,15.0951973574367	0	0 155 días	lun 07/08/17	mar 13/03/18	lun 07/08/17	mar 13/03/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
107	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.8705552920673,15.3469439521427	0	0 155 días	lun 07/08/17	mar 13/03/18	lun 07/08/17	mar 13/03/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
108	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Firma de contrato	0	0 69 días	mar 06/09/16	mar 13/12/16	mar 06/09/16	mar 13/12/16			\$0 Fin	\$0	\$0			
109	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17			\$0 Fin	\$0	\$0			
110	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Orden de Inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 5 días	lun 07/08/17	vie 11/08/17	lun 07/08/17	vie 11/08/17			\$0 Fin	\$0	\$0			
111	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Anticipo	0	0 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17			\$21,981 Fin	\$21,981	\$0			
112	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Primer pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17			\$19,095 Fin	\$19,095	\$0			
113	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Segundo Pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17			\$11,867 Fin	\$11,867	\$0			
114	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Entrega y Recepcion Final	0	0 2 días	mié 14/03/18	jue 15/03/18	mié 14/03/18	jue 15/03/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
115	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	0	0 4 días	mar 28/08/16	vie 31/08/18	mar 28/08/16	vie 31/08/18			\$43,098 Fin	\$43,098	\$0			
116	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17			\$132,994 Fin	\$132,994	\$0			
117	100%	BID	No 1.2.1.2	100%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17			\$122,392 Fin	\$122,392	\$0			
131	100%	BID	No 1.2.1.3	100%	No		Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	0	0 512 días	mar 08/12/15	vie 15/12/17	mar 08/12/15	vie 15/12/17			\$21,187 Fin	\$21,187	\$0			
145	100%	BID	No 1.2.1.4	100%	No		Proceso de Adquisición: Motocicletas para el Desplazamiento del Personal de los Juzgados de Paz, Juzgados Remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan de	0	0 41 días	vie 02/03/18	lun 30/04/18	vie 02/03/18	lun 30/04/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
176	100%	BID	No 2	100%	No		Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18			\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0			

Project: PEP_SMART_1905_31 8 2	División crítica	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margen de demora
Date: mar 04/09/18	Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
	Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas críticas
	Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

910

ID	% Completado a fin de año actual	% Fuente	Identificador	EDT	% Avance	Hito	FMR/PP	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo
189	100%	BID	No.2.1	100%	No			P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las Instituciones	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18			\$1,247,199	Fin	\$1,247,199	\$0
190	100%	BID	No.2.1.1	100%	No			Interconexión en OJ	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18			\$1,247,199	Fin	\$1,247,199	\$0
191	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Sistema Integrado de Información y Estadística Penal fundonando (OJ)	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18			\$1,247,199	Fin	\$1,247,199	\$0
192	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	0	0 469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16			\$586,294	Fin	\$586,294	\$0
200	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	0	0 317 días	mar 20/05/14	jue 06/08/15	mar 20/05/14	jue 06/08/15			\$472,692	Fin	\$472,692	\$0
207	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	0	0 247 días	mar 08/11/16	mar 31/10/17	mar 08/11/16	mar 31/10/17			\$34,992	Fin	\$34,992	\$0
218	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	0	0 374 días	mar 25/10/16	jue 12/04/18	mar 25/10/16	jue 12/04/18			\$28,476	Fin	\$28,476	\$0
236	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	0	0 265 días	lun 28/11/16	jue 14/12/17	lun 28/11/16	jue 14/12/17			\$4,905	Fin	\$4,905	\$0
246	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	0	0 176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15			\$25,496	Fin	\$25,496	\$0
256	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia	0	0 77 días	jue 05/05/16	mar 23/08/16	jue 05/05/16	mar 23/08/16			\$24,332	Fin	\$24,332	\$0
265	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	0	0 235 días	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17	jue 14/12/17			\$5,722	Fin	\$5,722	\$0
276	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	0	0 240 días	lun 16/01/17	jue 21/12/17	lun 16/01/17	jue 21/12/17			\$11,464	Fin	\$11,464	\$0
290	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	0	0 234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17			\$11,464	Fin	\$11,464	\$0
304	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	0	0 159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17			\$0	Fin	\$0	\$0
316	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Logística para la Realización del Taller "Encuentro Pueblos Indígenas del OJ"	0	0 80 días	vie 09/02/18	jue 31/05/18	vie 09/02/18	jue 31/05/18			\$12,965	Fin	\$12,965	\$0
324	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Central	0	0 93 días	mar 23/01/18	jue 31/05/18	mar 23/01/18	jue 31/05/18			\$3,432	Fin	\$3,432	\$0
332	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Oriente	0	0 93 días	mar 23/01/18	jue 31/05/18	mar 23/01/18	jue 31/05/18			\$1,342	Fin	\$1,342	\$0
340	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Occidente	0	0 93 días	mar 23/01/18	jue 31/05/18	mar 23/01/18	jue 31/05/18			\$1,574	Fin	\$1,574	\$0
348	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Taller Preparatorio para el Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0 60 días	mié 07/02/18	lun 30/04/18	mié 07/02/18	lun 30/04/18			\$5,860	Fin	\$5,860	\$0
356	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional de Pueblos Indígenas para realizar el Taller Preparatorio del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas	0	0 83 días	jue 08/02/18	lun 04/06/18	jue 08/02/18	lun 04/06/18			\$9,237	Fin	\$9,237	\$0
366	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador como apoyo al OJ para realización del Taller Preparatorio al Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0 81 días	jue 08/02/18	jue 31/05/18	jue 08/02/18	jue 31/05/18			\$1,337	Fin	\$1,337	\$0
375	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias	0	0 75 días	vie 02/03/18	vie 15/06/18	vie 02/03/18	vie 15/06/18			\$5,615	Fin	\$5,615	\$0
385	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipo de Cómputo para Fortalecer 5 de los 11 Juzgados de Paz Remozados y el Juzgado de Santa Eufalia, Huehuetenango	0	0 43 días	vie 02/03/18	mié 02/05/18	vie 02/03/18	mié 02/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0
396	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 12 Pantallas para la Proyección de la Agenda Única de Audiencias de la Corte Suprema de	0	0 44 días	vie 02/03/18	jue 03/05/18	vie 02/03/18	jue 03/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0
407	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipo de Audio para las Salas de Audiencia de 7 de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0 45 días	vie 02/03/18	vie 04/05/18	vie 02/03/18	vie 04/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0
418	100%	BID	No.2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 4 Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del OJ	0	0 51 días	vie 02/03/18	lun 14/05/18	vie 02/03/18	lun 14/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0
429	100%	BID	No.3	100%	No			Administración	0	0 1248 días	mar 16/07/11	jue 31/05/18	mar 16/07/11	jue 31/05/18			\$262,475	Fin	\$262,475	\$0
430	100%	BID	No.3.1	100%	No			Gastos Indirectos e Imprevistos (OJ)	0	0 1248 días	mar 16/07/11	jue 31/05/18	mar 16/07/11	jue 31/05/18			\$262,475	Fin	\$262,475	\$0
431	100%	BID	No.3.1.1	100%	No			Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	0	0 295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16			\$105,340	Fin	\$105,340	\$0

Project: PEP\_SMART\_1905\_31 8 2  
Date: mar 04/09/18

División crítica: Summary Inactive Task Duration-only Finish-only Margen de demora  
 Task Project Summary Inactive Milestone Manual Summary Rollup Deadline Retrasada  
 Split External Tasks Inactive Summary Manual Summary Progress Tareas criticas  
 Milestone External Milestone Manual Task Start-only Progreso manual

Handwritten initials and marks at the bottom left corner.

ID	% Complejis a fin de co año actual	% Fuen Ident empr	% Avanc	Hito PMA/P/Nombre de la Tarea	Activi/Activi Duración Inicio Fin Comienzo real Fin real Pred	Financiamien Acumula Costo Real Anticipo
432	...	BID	No 3.1.1.1 100% No	Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del	0 0 295 días vie 25/09/15 mar 22/11/16 vie 25/09/15 mar 22/11/16	\$105,340 Fin \$105,340 \$0
447	...	BID	No 3.1.2 100% No	Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	0 0 995 días vie 27/06/14 vie 25/05/18 vie 27/06/14 vie 25/05/18	\$81,637 Fin \$81,637 \$0
448	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	0 0 278 días mar 30/12/13 mar 09/02/16 mar 30/12... mar 09/02/16	\$9,947 Fin \$9,947 \$0
461	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	0 0 139 días mar lun 13/07/15 mar lun 13/07/15	\$276 Fin \$276 \$0
474	...	BID	No 3.1.2.3 100% No	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	0 0 256 días mar 22/12/15 lun 26/12/16 mar 22/12... lun 26/12/16	\$3,557 Fin \$3,557 \$0
486	...	BID	No 3.1.2.4 100% No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año	0 0 84 días mar 08/07/13 vie 31/10/14 mar 08/07... vie 31/10/14	\$2,459 Fin \$2,459 \$0
499	...	BID	No 3.1.2.5 100% No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año	0 0 98 días lun 08/08/16 lun 26/12/16 lun 08/08/16 lun 26/12/16	\$2,331 Fin \$2,331 \$0
512	...	BID	No 3.1.2.6 100% No	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	0 0 106 días lun 25/07/16 lun 26/12/16 lun 25/07/16 lun 26/12/16	\$5,459 Fin \$5,459 \$0
526	...	BID	No 3.1.2.7 100% No	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	0 0 82 días vie 24/04/15 mar 25/08/15 vie 24/04/15 mar 25/08/15	\$4,718 Fin \$4,718 \$0
539	...	BID	No 3.1.2.8 100% No	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	0 0 255 días mar 12/01/13 mié 11/01/17 mar 12/01... mié 11/01/17	\$739 Fin \$739 \$0
551	...	BID	No 3.1.2.9 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 201	0 0 127 días vie 27/06/14 lun 22/12/14 vie 27/06/14 lun 22/12/14	\$1,254 Fin \$1,254 \$0
565	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, añ	0 0 102 días vie 01/08/14 lun 22/12/14 vie 01/08/14 lun 22/12/14	\$266 Fin \$266 \$0
579	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	0 0 68 días lun 21/09/15 mar 29/12/15 lun 21/09/15 mar 29/12/15	\$939 Fin \$939 \$0
592	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	0 0 72 días lun 21/09/15 mié 06/01/16 lun 21/09/15 mié 06/01/16	\$322 Fin \$322 \$0
605	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	0 0 80 días lun 21/09/15 lun 18/01/16 lun 21/09/15 lun 18/01/16	\$934 Fin \$934 \$0
618	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 201	0 0 68 días lun 19/02/18 vie 25/05/18 lun 19/02/18 vie 25/05/18	\$4,908 Fin \$4,908 \$0
632	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	0 0 70 días vie 24/07/15 mar 10/11/15 vie 24/07/15 mar 10/11/15	\$2,877 Fin \$2,877 \$0
645	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	0 0 71 días vie 24/07/15 mié 11/11/15 vie 24/07/15 mié 11/11/15	\$1,321 Fin \$1,321 \$0
658	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Toner 2016	0 0 101 días mar 02/08/14 lun 26/12/16 mar 02/08... lun 26/12/16	\$5,277 Fin \$5,277 \$0
671	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 201	0 0 98 días mar 02/08/11 mar 20/12/16 mar 02/08... mar 20/12/16	\$4,387 Fin \$4,387 \$0
684	...	BID	No 3.1.2.1 100% No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	0 0 24 días lun 03/11/14 vie 05/12/14 lun 03/11/14 vie 05/12/14	\$1,232 Fin \$1,232 \$0
690	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	0 0 134 días lun 11/05/15 vie 20/11/15 lun 11/05/15 vie 20/11/15	\$1,859 Fin \$1,859 \$0
697	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	0 0 216 días lun 01/02/16 mié 30/11/16 lun 01/02/16 mié 30/11/16	\$3,234 Fin \$3,234 \$0
709	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	0 0 21 días lun 20/02/17 lun 20/03/17 lun 20/02/17 lun 20/03/17	\$1,111 Fin \$1,111 \$0
717	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	0 0 17 días mié 08/11/17 jue 30/11/17 mié 08/11/... jue 30/11/17	\$4,525 Fin \$4,525 \$0
722	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viajes) 2017	0 0 113 días lun 03/07/17 lun 11/12/17 lun 03/07/17 lun 11/12/17	\$13,621 Fin \$13,621 \$0
734	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	0 0 5 días lun 17/07/17 vie 21/07/17 lun 17/07/17 vie 21/07/17	\$0 Fin \$0 \$0
744	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	0 0 39 días lun 06/11/17 vie 29/12/17 lun 06/11/17 vie 29/12/17	\$4,084 Fin \$4,084 \$0
756	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Adquisición: 1 vehículo tipo Pick Up para la comunicación entre Santa Eufalia y la Aldea Ixquisí, para uso de los Jueces	0 0 87 días mar 02/01/18 mié 02/05/18 mar mié 02/05/18 02/01/18	\$0 Fin \$0 \$0
768	...	BID	No 3.1.2.2 100% No	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora	0 0 57 días lun 19/02/18 mié 09/05/18 lun 19/02/18 mié 09/05/18	\$0 Fin \$0 \$0
781	...	BID	No 3.1.2.3 100% No	Proceso de Adquisición: 1 Vehículo para la Supervisión de la Sostenibilidad en la Operación y Mantenimiento de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0 0 44 días vie 02/03/18 jue 03/05/18 vie 02/03/18 jue 03/05/18	\$0 Fin \$0 \$0
793	...	BID	No 3.1.3 100% No	Personal de la Unidad Coejecutora	0 0 1248 días mar 16/07/13 jue 31/05/18 mar 16/07... jue 31/05/18	\$75,498 Fin \$75,498 \$0
794	...	BID	No 3.1.3.1 100% No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 20	0 0 158 días vie 29/11/13 mar 08/07/14 vie 29/11/13 mar 08/07/14	\$16,880 Fin \$16,880 \$0
807	...	BID	No 3.1.3.2 100% No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 20	0 0 118 días jue 07/07/16 lun 26/12/16 jue 07/07/16 lun 26/12/16	\$5,844 Fin \$5,844 \$0
820	...	BID	No 3.1.3.3 100% No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura (año	0 0 203 días mar 16/07/13 jue 24/04/14 mar 16/07... jue 24/04/14	\$3,655 Fin \$3,655 \$0
833	...	BID	No 3.1.3.4 100% No	Proceso de contratación: Contable financiero 2015	0 0 244.88 d mar 06/01/11 mié 23/12/15 mar 06/01... mié 23/12/15	\$10,720 Fin \$10,720 \$0
856	...	BID	No 3.1.3.5 100% No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	0 0 238 días vie 22/01/16 jue 22/12/16 vie 22/01/16 jue 22/12/16	\$15,516 Fin \$15,516 \$0
871	...	BID	No 3.1.3.6 100% No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2017	0 0 273 días lun 21/11/16 mar 19/12/17 lun 21/11/16 mar 19/12/17	\$15,545 Fin \$15,545 \$0
889	...	BID	No 3.1.3.7 100% No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2018	0 0 123 días lun 11/12/17 jue 31/05/18 lun 11/12/17 jue 31/05/18	\$7,338 Fin \$7,338 \$0
930	100%	...	No 4 0% Sí	Fin del Programa	0 1 día dom 30/09/1 dom 30/09/18 NOD NOD	\$0 Fin \$0 \$0

Project: PEP_SMART_1905_31 8 2 Date: mar 04/09/18	División crítica	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margen de demora
	Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
	Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas críticas
	Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

PK

## Observaciones / Desafíos

## Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Francisco Rafael González Flores



Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Karen Betzabeth Cobos Bran / Encargada de  
Despacho / Secretaría de Fortalecimiento



Fecha de actualización

10/9/2018 - 2:19 PM
