

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado Julio / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL


Organismo ejecutor: Organismo Judicial

Numero de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	16/08/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,090,618.61	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,090,618.61	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora @	15,637,827.20	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31	116.25%	Monto por desembolsar USD\$ -339,821.70 -16.25%

Gráfica de Ejecución

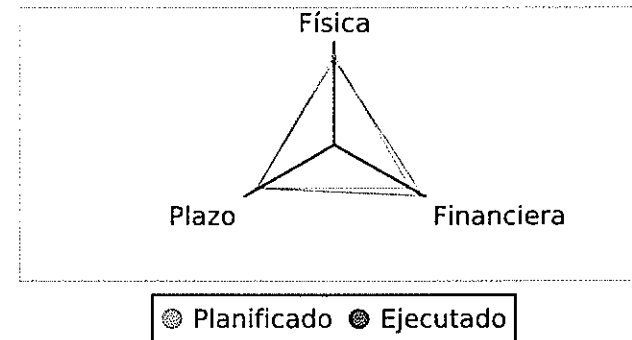

Tipo de cambio: 7.48 X 1 USD



[Firma manuscrita]

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	43,378,689.41	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	694,498.30	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	22.83% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	1.60%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal

Proyecto	Unidad de medida	Metas trimestre I		Metas trimestre II		Metas trimestre III		Metas anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3		0		0		3	
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial	Unidad	0		4	4	0		4	4
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2	2	0		0		2	2
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultaría de Des arrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias del Organismo Judicial	Unidad	0		2	2	0		2	2

97

Plan Adquisiciones Año Fisco.

Adquisición	Método	Reservación de documento		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	30/03/2018	30/03/2018
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	25/04/2018
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriental y Región Nor-occidental)											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	13/04/2018	03/04/2018	20/04/2018
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	06/04/2018		13/04/2018		27/04/2018		04/05/2018		11/05/2018	
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango											
Bienes	Comparación de Precios	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	23/04/2018	13/04/2018		20/04/2018	
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de consultoría de Sistematizador											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	08/02/2018	15/01/2018	12/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	09/02/2018	23/02/2018
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas											
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	12/02/2018	22/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	14/02/2018	09/02/2018	21/02/2018

9.

Adquisición	Método	Requisitos		Lanzamiento de evento		Recepción y aforo		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	09/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	31/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	22/01/2018	05/02/2018	31/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	15/02/2018
Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial											
Servicios	Selección Directa (SD)	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	09/04/2018	30/03/2018	17/04/2018
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial											
Bienes e insumos	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	06/04/2018		13/04/2018	
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Consulta ría Asistente Contable-Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	21/03/2018
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	Comparación de Precios	05/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/03/2018	19/02/2018		28/02/2018	

9

Adquisición	Método	Planificación		Ejecución		Resolución		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Adquisición de boletos aéreos 2018											
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018		24/01/2018		29/01/2018		31/01/2018		06/02/2018	
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional											
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	22/02/2018	15/02/2018	16/03/2018	22/02/2018	09/04/2018	26/02/2018		28/02/2018	
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	12/04/2018	27/03/2018		13/04/2018	
Informes Consultoría Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	25/05/2018

Ejecución Financiera Anual

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	0.00	466,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.86
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	61,111.00	91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,777.00
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriente y Región Nor-occidente)													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	0.00	466,580.86	77,311.00	642,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,357.86
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													


9

Inicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
Informes de consultoría de Sistematizador													
Servicios	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas													
Servicios de Consultoría	0.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,992.00
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,811.00
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00

9.

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial													
Bienes e insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,648.00
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
Adquisición de boletos aéreos 2018													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Informes Consulta Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total componente	0.00	78,478.00	290,443.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,521.00
Total	0.00	101,478.00	1,221,171.00	77,311.00	1,694,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,388.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Re

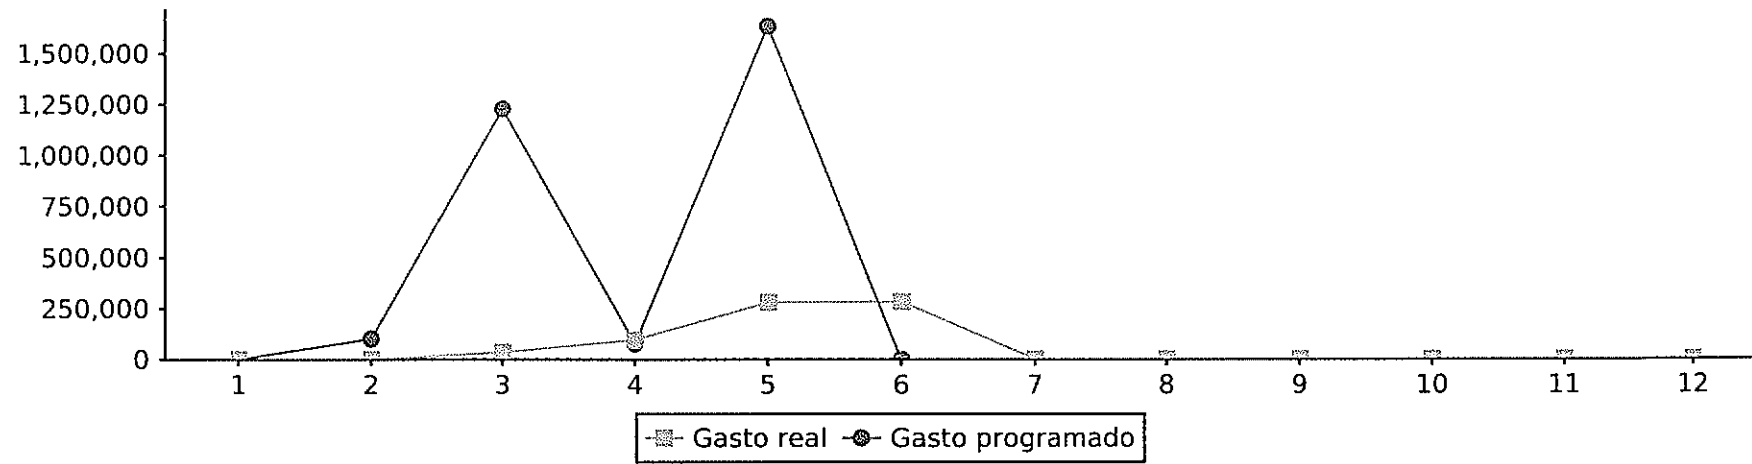

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	34,516.13	96,360.00	280,106.07	283,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	101,478.00	1,228,171.86	77,311.00	1,634,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												694,498.30
Total Gasto programado												3,041,526.86



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g.

ID	Activo	Det % Completado Esperado Fin año	% Completo a fin de año actual	% Fuen Ident	EDT emp	% Avanc	Hito	PMR/PJ/Nombre de la Tarea	Activ	Activ Atras	Duración Próxim Mes	Inicio	Fin	Comento real	Fin real	Precl	Financiamen	Acumula	Costo Real	Anticipo
0	SI	Estado Retrasada	1	0%	No	99%	No	PEP_SMART_1905_30 6 2018	5	2 1448 días	mié 2/01/13	mar 28/08/18	mié 2/01/13	NOD			\$2,100,913 Fin	\$1,997,592	\$0	
1	SI	Retrasada C	1	...	BID	No 1	99%	No	Componente 1: Acceso a la Justicia	5	0 1448 días	mié 2/01/13	mar 28/08/18	mié 2/01/13	NOD		\$576,238 Fin	\$487,919	\$0	
2	SI	Retrasada P	1	...	BID	No 1.1	96%	No	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	5	0 1404 días	mié 2/01/13	lun 25/06/18	mié 2/01/13	NOD		\$75,576 Fin	\$50,676	\$0	
3	SI	Completada	1	...	BID	No 1.1.1	100%	No	Centros Integrados de Justicia funcionando	0	0 1023 días	mié 2/01/13	lun 26/12/16	mié 2/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0	
38	SI	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2	93%	No	Proceso Cámara Penal:	5	0 81 días	vie 2/03/18	lun 25/06/18	vie 2/03/18	NOD		\$57,135 Fin	\$32,235	\$0	
39	SI	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para la Elaboración Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 62 días	mar 6/03/18	jue 31/05/18	mar 6/03/18	jue 31/05/18		\$20,786 Fin	\$20,786	\$0	
49	SI	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.2	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador para Apoyo en los Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 58 días	lun 12/03/18	jue 31/05/18	lun 12/03/18	jue 31/05/18		\$2,139 Fin	\$2,139	\$0	
59	SI	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.3	100%	No	Proceso de Contratación: 6 Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ (Región Nor Oriente) (Región Central) (Región Nor-Occidente)	0	0 64 días	vie 2/03/18	jue 31/05/18	vie 2/03/18	jue 31/05/18		\$9,310 Fin	\$9,310	\$0	
69	SI	Retrasada	1	...	BID	No 1.1.2.4	0%	No	Proceso de Contratación: Diseño, Diagramación, Impresión y reproducción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	5	0 17 días	vie 1/06/18	lun 25/06/18		NOD	NOD	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
70	SI	Retrasada	1	No 1.1.2.4	0%	No	Eta de Adquisición:	3	0 13 días	vie 1/06/18	mar 19/06/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
71	SI	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	SI A	Elaboración de Especificaciones Técnicas, Invitación y Adjudicación	1	0 2 días	vie 1/05/18	lun 4/06/18		NOD	NOD 48	\$0 Fin	\$0	\$0	
72	SI	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	SI	No Objeción a Especificaciones y Adjudicación	1	0 5 días	mar 5/06/18	lun 11/06/18		NOD	NOD 71	\$0 Fin	\$0	\$0	
73	SI	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	SI F	Elaboración y Firma de Orden Compra	1	0 5 días	mar 12/06/18	mar 19/06/18		NOD	NOD 72	\$0 Fin	\$0	\$0	
74	SI	Retrasada	1	...	BID	No 1.1.2.4	0%	No	Eta de Ejecución de pagos:	2	0 4 días	mié 20/06/18	lun 25/06/18		NOD	NOD	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
75	SI	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	No	Entrega	1	0 2 días	mié 20/06/18	jue 21/06/18		NOD	NOD 73	\$0 Fin	\$0	\$0	
76	SI	Retrasada	1	100%	...	BID	No 1.1.2.4	0%	Pago	1	0 2 días	vie 22/06/18	lun 25/06/18		NOD	NOD 75	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
77	SI	Retrasada P	1	...	BID	No 1.2	99%	No	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0	0 717 días	mar 3/11/15	mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD		\$500,662 Fin	\$437,243	\$0	
78	SI	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1	99%	No	Juzgados de Paz funcionando	0	0 717 días	mar 3/11/15	mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD		\$500,662 Fin	\$437,243	\$0	
79	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.1	100%	No	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	0	0 30 días	lun 7/12/15	lun 25/01/16	lun 7/12/15	lun 25/01/16		\$0 Fin	\$0	\$0	
80	SI	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1.2	99%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz	0	0 717 días	mar 3/11/15	mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD		\$479,476 Fin	\$416,056	\$0	
81	SI	Completada	1	No 1.2.1.2	100%	No	Eta de Adquisición:	0	0 284 días	mar 3/11/15	mar 13/12/16	mar 3/11/15	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0	
90	SI	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$107,727 Fin	\$107,727	\$0	
103	SI	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1.2	99%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	0	0 582 días	vie 13/05/16	mar 28/08/18	vie 13/05/16	NOD		\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
104	SI	Según lo pre	1	100%	...	BID	SI 1.2.1.2	99%	KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	0	0 582 días	vie 13/05/16	mar 28/08/18	vie 13/05/16	NOD		\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
105	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	SI A	Publicación / Invitación	0	0 20 días	vie 13/05/16	jue 9/06/16	vie 13/05/16	jue 9/06/16		\$0 Fin	\$0	\$0	
106	SI	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, Lano El Pino, -90.627193771941,15.1062769849853	0	0 155 días	lun 7/08/17	mar 13/03/18	lun 7/08/17	mar 13/03/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
107	SI	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115,15.0951973574367	0	0 155 días	lun 7/08/17	mar 13/03/18	lun 7/08/17	mar 13/03/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
108	SI	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.870552920673,15.3469439521427	0	0 155 días	lun 7/08/17	mar 13/03/18	lun 7/08/17	mar 13/03/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
109	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	SI F	Firma de contrato	0	0 69 días	mar 6/09/16	mar 13/12/16	mar 6/09/16	mar 13/12/16	105	\$0 Fin	\$0	\$0	
110	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17		\$0 Fin	\$0	\$0	
111	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	SI	Orden de Inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 5 días	lun 7/08/17	vie 11/08/17	lun 7/08/17	vie 11/08/17	110	\$0 Fin	\$0	\$0	
112	SI	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	Anticipo	0	0 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17	111	\$21,981 Fin	\$21,981	\$0	
113	SI	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	Primer pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	112FC+	\$19,095 Fin	\$19,095	\$0	
114	SI	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	Segundo Pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	113	\$11,867 Fin	\$11,867	\$0	
115	SI	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Entrega y Recepcion Final	0	0 2 días	mié 14/03/18	jue 15/03/18	mié 14/03/18	jue 15/03/18	114FC+	\$0 Fin	\$0	\$0	
116	SI	Tarea futura	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	0%	Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	0	0 1 día	mar 28/08/18	mar 28/08/18		NOD	NOD 115FC+	\$63,419 Fin	\$0	\$0	
117	SI	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$132,994 Fin	\$132,994	\$0	
131	SI	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	0	0 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$122,392 Fin	\$122,392	\$0	
145	SI	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.3	100%	No	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	0	0 512 días	mar 8/12/15	vie 15/12/17	mar 8/12/15	vie 15/12/17		\$21,187 Fin	\$21,187	\$0	
176	SI	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.4	100%	No	Proceso de Adquisición: Motocicletas para el Desplazamiento del Personal de los Juzgados de Paz, Juzgados Remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan de	0	0 45 días	vie 2/03/18	vie 4/05/18	vie 2/03/18	vie 4/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
188	SI	Completada C	1	...	BID	No 2	100%	No	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	
189	SI	Completada P	1	...	BID	No 2.1	100%	No	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las Instituciones	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	
190	SI	Completada E	1	...	BID	No 2.1.1	100%	No	Interconexión en OJ	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	


9.

ID	Activo	Det % Completado Esperado Fin año	% Comple a fin de año actual	% Fuen Ident emp	EDT emp	% Avanc	Hto PMT/PT	Nombre de la Tarea	Actw Atras	Activ Próxim Mes	Duración Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiam ent	Acumula Costo Real	Anticipo
191	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0
192	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
200	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 317 días	mar 20/05/14	mar 6/08/15	mar 20/05/14	mar 6/08/15		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
207	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 247 días	mar 8/11/16	mar 31/10/17	mar 8/11/16	mar 31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
218	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 374 días	mar 25/10/16	mar 12/04/18	mar 25/10/16	mar 12/04/18		\$28,476 Fin	\$28,476	\$0
236	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 265 días	lun 28/11/16	lun 14/12/17	lun 28/11/16	lun 14/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
246	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
256	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 77 días	mar 5/05/16	mar 23/08/16	mar 5/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
265	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 235 días	lun 16/01/17	lun 14/12/17	lun 16/01/17	lun 14/12/17		\$5,722 Fin	\$5,722	\$0
276	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 240 días	lun 16/01/17	lun 21/12/17	lun 16/01/17	lun 21/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
290	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
304	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
316	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 80 días	vie 9/02/18	mar 31/05/18	vie 9/02/18	mar 31/05/18		\$12,965 Fin	\$12,965	\$0
324	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$3,432 Fin	\$3,432	\$0
332	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$1,342 Fin	\$1,342	\$0
340	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$1,574 Fin	\$1,574	\$0
348	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 60 días	mié 7/02/18	lun 30/04/18	mié 7/02/18	lun 30/04/18		\$5,860 Fin	\$5,860	\$0
356	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 83 días	mar 8/02/18	lun 4/06/18	mar 8/02/18	lun 4/06/18		\$9,237 Fin	\$9,237	\$0
366	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 81 días	mar 8/02/18	mar 31/05/18	mar 8/02/18	mar 31/05/18		\$1,337 Fin	\$1,337	\$0
375	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 75 días	vie 2/03/18	vie 15/06/18	vie 2/03/18	vie 15/06/18		\$5,615 Fin	\$5,615	\$0
385	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 43 días	vie 2/03/18	mié 2/05/18	vie 2/03/18	mié 2/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
396	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 44 días	vie 2/03/18	mar 3/05/18	vie 2/03/18	mar 3/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
407	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 45 días	vie 2/03/18	vie 4/05/18	vie 2/03/18	vie 4/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
418	SI	✓	1	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No	0	0 51 días	vie 2/03/18	lun 14/05/18	vie 2/03/18	lun 14/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
429	SI	Retrasada	GP	1	...	BID	No 3	99%	No	2 1290 días	mar 16/07/15	mar 31/07/18	mar 16/07/15	NOD		\$277,475 Fin	\$262,475	\$0
430	SI	Retrasada		1	...	BID	No 3.1	99%	No	2 1290 días	mar 16/07/15	mar 31/07/18	mar 16/07/15	NOD		\$277,475 Fin	\$262,475	\$0
431	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.1	100%	No	0	0 295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
432	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.1.1	100%	No	0	0 295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
447	SI	Retrasada		1	...	BID	No 3.1.2	98%	No	2 1042 días	vie 27/06/14	mar 31/07/18	vie 27/06/14	NOD		\$96,637 Fin	\$81,637	\$0
448	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.2.1	100%	No	0	0 278 días	mar 30/12/14	mar 9/02/16	mar 30/12/14	mar 9/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
461	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.2.2	100%	No	0	0 139 días	mar 30/12/14	mar 13/07/15	mar 30/12/14	mar 13/07/15		\$276 Fin	\$276	\$0
474	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.2.3	100%	No	0	0 256 días	mar 22/12/14	lun 26/12/16	mar 22/12/14	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
486	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.2.4	100%	No	0	0 84 días	mar 8/07/14	vie 31/10/14	mar 8/07/14	vie 31/10/14		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
499	SI	✓	1	...	BID	No 3.1.2.5	100%	No	0	0 98 días	lun 8/08/16	lun 26/12/16	lun 8/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0


ID	Activo	Det % Completado Esperado Fin año	% Completo a fin de año actual	% Fuen Ident emp	EDT	% Avanz	Hito PMR/PI/Nombre de la Tarea	Activ Atras Prog	Activ Duración Mes	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamen Acumula	Costo Real	Anticipo	
512	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.6 100%	No	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	0	0 106 días	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
526	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.7 100%	No	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	0	0 82 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
539	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.8 100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	0	0 255 días	mar 12/01/16	mié 11/01/17	mar 12/01/16	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0
551	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.9 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2014	0	0 127 días	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
565	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año	0	0 102 días	vie 1/08/14	lun 22/12/14	vie 1/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0
579	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	0	0 68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0
592	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	0	0 72 días	lun 21/09/15	mié 6/01/16	lun 21/09/15	mié 6/01/16		\$322 Fin	\$322	\$0
605	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	0	0 80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16		\$934 Fin	\$934	\$0
618	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2018	0	0 83 días	lun 19/02/18	jue 14/06/18	lun 19/02/18	jue 14/06/18		\$4,908 Fin	\$4,908	\$0
632	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	0	0 70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15		\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
645	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	0	0 71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15		\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
658	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Toner 2016	0	0 101 días	mar 2/08/16	lun 26/12/16	mar 2/08/16	lun 26/12/16		\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
671	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	0	0 98 días	mar 2/08/16	mar 20/12/16	mar 2/08/16	mar 20/12/16		\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
684	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	0	0 24 días	lun 3/11/14	vie 5/12/14	lun 3/11/14	vie 5/12/14		\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
692	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	0	0 134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15		\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
697	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.1 100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	0	0 216 días	lun 1/02/16	mié 30/11/16	lun 1/02/16	mié 30/11/16		\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
709	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	0	0 21 días	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17		\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
717	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	0	0 17 días	mié 8/11/17	jue 30/11/17	mié 8/11/17	jue 30/11/17		\$4,525 Fin	\$4,525	\$0
722	✓	Sí	Retrasada	1	L... BID	No 3.1.2.2 0%	No	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2018	0	0 22 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD		\$15,000 Fin	\$0	\$0
723	✓	Sí	Retrasada	1	L... BID	No 3.1.2.2 0%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 12 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
724	✓	Sí	Retrasada	1	100% L...	No 3.1.2.2 0%	No	Solicitud de cotización	0	0 12 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
725	✓	Sí	Retrasada	1	L... BID	No 3.1.2.2 0%	No	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0 12 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD		\$15,000 Fin	\$0	\$0
726	✓	Sí	Retrasada	1	100% L...	No 3.1.2.2 0%	No	Pendiente de ejecutar	0	0 12 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD		\$15,000 Fin	\$0	\$0
727	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	0	0 113 días	lun 3/07/17	lun 11/12/17	lun 3/07/17	lun 11/12/17		\$13,621 Fin	\$13,621	\$0
734	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	0	0 5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		\$0 Fin	\$0	\$0
744	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	0	0 39 días	lun 6/11/17	vie 29/12/17	lun 6/11/17	vie 29/12/17		\$4,084 Fin	\$4,084	\$0
756	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Adquisición: 1 vehículo tipo Pick Up para la comunicación entre Santa Eulalia y la Aldea Ixquisis, para uso de los Jueces	0	0 87 días	mar 2/01/18	mié 2/05/18	mar 2/01/18	mié 2/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
768	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.2 100%	No	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora	0	0 57 días	lun 19/02/18	mié 9/05/18	lun 19/02/18	mié 9/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
781	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.2.3 100%	No	Proceso de Adquisición: 1 Vehículo para la Supervisión de la Sostenibilidad en la Operación y Mantenimiento de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0 44 días	vie 2/03/18	jue 3/05/18	vie 2/03/18	jue 3/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
793	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3 100%	No	Personal de la Unidad Coejecutora	0	0 1248 días	mar 16/07/11	jue 31/05/18	mar 16/07/11	jue 31/05/18		\$75,498 Fin	\$75,498	\$0
794	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.1 100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 201	0	0 158 días	vie 29/11/13	mar 8/07/14	vie 29/11/13	mar 8/07/14		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
807	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.2 100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 201	0	0 118 días	jue 7/07/16	lun 26/12/16	jue 7/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
820	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.3 100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en infraestructura (año 21	0	0 203 días	mar 16/07/11	jue 24/04/14	mar 16/07/11	jue 24/04/14		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
833	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.4 100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2015	0	0 244.88 d	mar 6/01/15	mié 23/12/15	mar 6/01/15	mié 23/12/15		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
856	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.5 100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	0	0 238 días	vie 22/01/16	jue 22/12/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
871	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.6 100%	No	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	0	0 273 días	lun 21/11/16	mar 19/12/17	lun 21/11/16	mar 19/12/17		\$15,545 Fin	\$15,545	\$0
889	✓	Sí	Completada	1	L... BID	No 3.1.3.7 100%	No	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2018	0	0 123 días	lun 11/12/17	jue 31/05/18	lun 11/12/17	jue 31/05/18		\$7,338 Fin	\$7,338	\$0

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Francisco Rafael González Flores



Aprobado por: (nombre y firma)  Dr. William Gilberto Bobadilla López / Secretario de Área / Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

16/8/2018 - 9:56 AM
