



Oficio N° SFJYC-02185-2018/AEPE

Guatemala, 15 de noviembre de 2018
Ref. 0570-frgf

Licenciada
Sofia Ciraiz Morales de Figueroa
Coordinadora Unidad de Información
Pública
Edificio

Ref.: Traslado de Informe Mensual del Plan Anual de Ejecución del Préstamo BID 1905/OC-GU, a cargo del Organismo Judicial, correspondiente al mes de octubre 2018.

Estimada Licenciada Morales

En cumplimiento al Artículo 69 del Decreto 50-2016 ley del presupuesto de ingresos y egresos del Estado ejercicio fiscal 2017 vigente para el período 2018, adjunto encontrara el Informe Mensual del Plan Anual de Ejecución del Préstamo BID 1905/OC-GU, correspondiente al mes de octubre 2018, para su publicación.


Agradeciendo el favor de su atención y apoyo, es grato suscribirnos con muestras de nuestra consideración y estima.

Cordialmente.

Dr.

William Gilberto Bobadilla López
Secretario de Área

Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación



Q/SFJC/AEPE/GIVS/FRGF
C/c. Archivo
Anexos: Lo indicado.

Carmen Acú Ruf. gafete 26756

Mes reportado


Octubre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL

Organismo ejecutor: Organismo Judicial

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	15/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,090,618.61	Fecha de Cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,090,618.61	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	16,160,481.86	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31	Montos por desembolsar USD\$	-339,821.70
			-16.25%

Gráfica de Ejecución

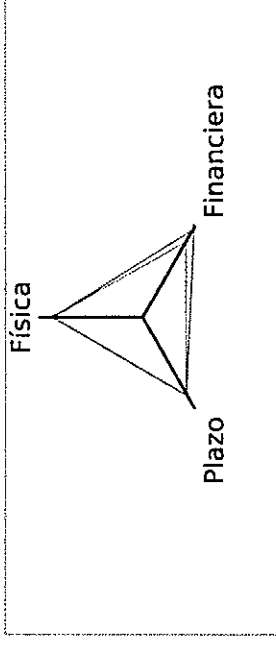

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD



[Firma manuscrita]

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	43,378,689.41	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%	
Presupuesto Devengado	1,020,814.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	33.56% / 100.00%	
Porcentaje de Ejecución	2.35%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%	
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0	

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3		0	3	0		3	3
Informes de Consultoría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial	Unidad	0		4	4	0		4	4
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Productos Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2	2	0		0		2	2
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias del Organismo Judicial	Unidad	0		2	2	0		2	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Banzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Aprobación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Informes de Consultoría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	30/03/2018
Informes de Consultoría Sistemizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	25/04/2018
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-orient y Región Nor-occidente)											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	13/04/2018	20/04/2018
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	06/04/2018		13/04/2018		27/04/2018		04/05/2018			11/05/2018
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango											
Bienes	Comparación de Precios	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	23/04/2018	13/04/2018			20/04/2018
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de consultoría de Sistemizador											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	08/02/2018	15/01/2018	12/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	09/02/2018	23/02/2018
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas											
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	12/02/2018	22/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	14/02/2018	09/02/2018	21/02/2018

9

Adquisición	Método	Preparación de materiales		Bancamiento de evento		Recuperación y evaluación de		Acreditación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	09/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	31/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	22/01/2018	05/02/2018	31/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	15/02/2018
Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial											
Servicios	Selección Directa (SD)	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	09/04/2018	30/03/2018	17/04/2018
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial											
Bienes e insumos	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	06/04/2018		13/04/2018	
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Consultoría Asistente Contable-Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	21/03/2018
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	Comparación de Precios	05/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/03/2018	19/02/2018		28/02/2018	

8

Adquisición	Método	Preparación de Presupuestos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firmado contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Adquisición de boletos aéreos 2018											
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018		24/01/2018		29/01/2018		31/01/2018		06/02/2018	
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional											
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	22/02/2018	15/02/2018	16/03/2018	22/02/2018	09/04/2018	26/02/2018		28/02/2018	
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	12/04/2018	27/03/2018		13/04/2018	
Informes Consulto ria Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	25/05/2018

9

Ejecución Financiera Anual


Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	0.00	465,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,580.86
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	61,111.00	91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,777.00
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriental y Región Nor-occidental)													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los Juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	0.00	465,580.86	77,311.00	642,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,357.86
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Informes de consultoría de Sistematizador													
Servicios	0.00	23.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.000.00
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas													
Servicios	0.00	0.00	58.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.820.00
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183.811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.811.00
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73.525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.525.00
Informes de Consultoría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	44.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.100.00
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda Única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.600.00

Índice	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial													
Bienes e insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,648.00
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
Adquisición de boletos aéreos 2018													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Informes Consultoría Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total componente	0.00	78,478.00	250,443.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,521.00
Total	0.00	101,478.00	1,225,176.00	77,611.00	1,162,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,365.00

9.

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

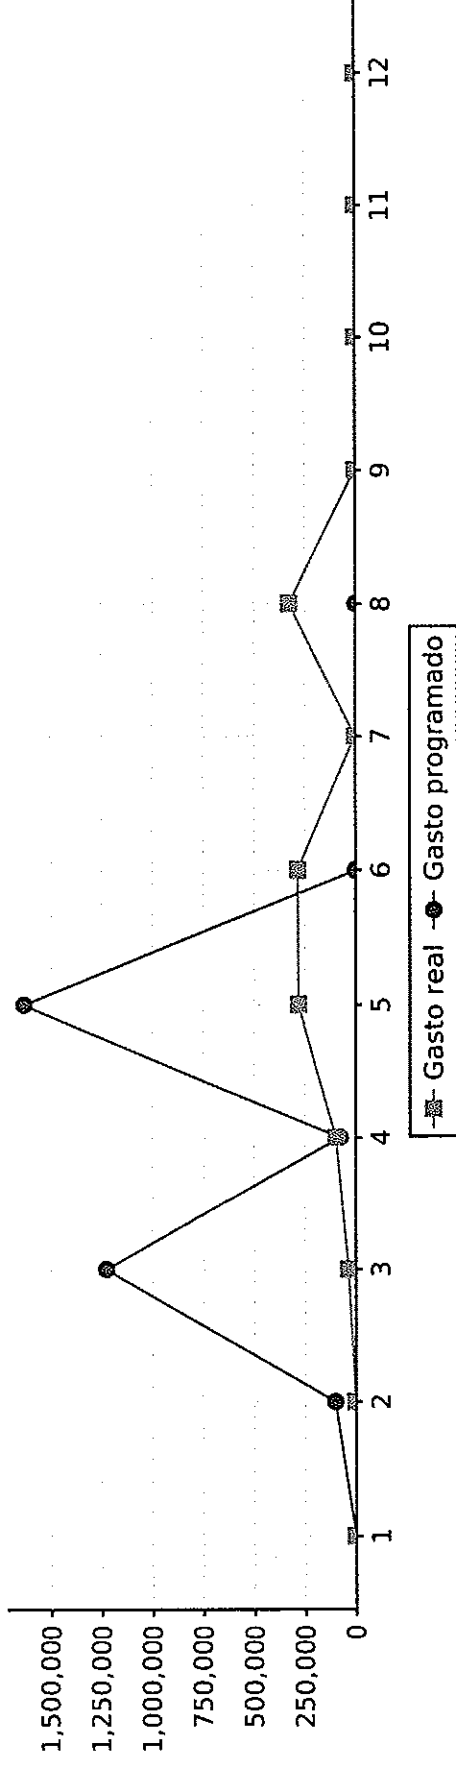

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	34,516.13	95,360.00	280,106.07	283,516.10	0.00	326,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	101,476.00	1,228,171.86	77,311.00	1,634,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	1,020,814.72											
Total Gasto programado	3,041,526.86											

9

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ID	%	N. Fuen Ident	DT	%	Hito	PKID	Nombre de la Tarea	Mes	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comentario real	Finicial	Prid	Financiamen	Acumulad	Costo Real	Anticipo
189	100%	No 2.1	100%	No			P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las Instituciones Interconexión en OJ	0	0	1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199	Fin	\$1,247,199	\$0
190	100%	No 2.1.1	100%	No			Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionando (OJ)	0	0	1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199	Fin	\$1,247,199	\$0
191	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema MicroSOFT	0	0	669 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294	Fin	\$586,294	\$0
192	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	0	0	317 días	mar 20/05/14	mar 06/08/15	mar 20/05/14	mar 06/08/15		\$472,692	Fin	\$472,692	\$0
207	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Software para el uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	0	0	247 días	mar 08/11/16	mar 31/10/17	mar 08/11/16	mar 31/10/17		\$34,992	Fin	\$34,992	\$0
218	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase 1 para el OJ	0	0	374 días	mar 25/10/16	mar 12/04/18	mar 25/10/16	mar 12/04/18		\$28,476	Fin	\$28,476	\$0
236	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	0	0	265 días	lun 28/11/16	lun 14/12/17	lun 28/11/16	lun 14/12/17		\$4,905	Fin	\$4,905	\$0
246	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión de Flujos Principales OJ	0	0	176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496	Fin	\$25,496	\$0
256	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia	0	0	77 días	jun 05/05/16	mar 23/08/16	jun 05/05/16	mar 23/08/16		\$24,332	Fin	\$24,332	\$0
265	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Módulo de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	0	0	235 días	lun 16/01/17	jun 14/12/17	lun 16/01/17	jun 14/12/17		\$5,722	Fin	\$5,722	\$0
276	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	0	0	240 días	lun 16/01/17	jun 21/12/17	lun 16/01/17	jun 21/12/17		\$11,464	Fin	\$11,464	\$0
290	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	0	0	236 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464	Fin	\$11,464	\$0
304	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	0	0	159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0	Fin	\$0	\$0
316	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Logística para la realización del Taller "Encuentro Pueblos Indígenas del OJ"	0	0	80 días	vie 09/02/18	vie 31/05/18	vie 09/02/18	vie 31/05/18		\$12,965	Fin	\$12,965	\$0
324	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Central	0	0	93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$3,432	Fin	\$3,432	\$0
332	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Oriente	0	0	93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$1,342	Fin	\$1,342	\$0
340	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Occidente	0	0	93 días	mar 23/01/18	mar 31/05/18	mar 23/01/18	mar 31/05/18		\$1,574	Fin	\$1,574	\$0
348	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Taller Preparatorio para el Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0	60 días	mié 07/02/18	mié 30/04/18	mié 07/02/18	mié 30/04/18		\$5,860	Fin	\$5,860	\$0
356	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional de Pueblos Indígenas para realizar el Taller Preparatorio del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas	0	0	83 días	vie 08/02/18	lun 04/06/18	vie 08/02/18	lun 04/06/18		\$9,237	Fin	\$9,237	\$0
366	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Sistemizador como apoyo al OJ para realización del Taller Preparatorio al Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0	81 días	vie 08/02/18	jun 31/05/18	vie 08/02/18	jun 31/05/18		\$1,337	Fin	\$1,337	\$0
375	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias	0	0	75 días	vie 02/03/18	vie 15/06/18	vie 02/03/18	vie 15/06/18		\$5,615	Fin	\$5,615	\$0
385	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipo de Computo para Fortalecer 5 de los 11 Juzgados de Paz Remozados y el Juzgado de Santa Fe de la Huertamarango	0	0	43 días	vie 02/03/18	mié 02/05/18	vie 02/03/18	mié 02/05/18		\$0	Fin	\$0	\$0
396	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 12 Pantallas para la Proyección de la Agenda Única de Audiencias de la Corte Suprema de	0	0	44 días	vie 02/03/18	jun 03/05/18	vie 02/03/18	jun 03/05/18		\$0	Fin	\$0	\$0
407	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipo de Audio para las Salas de Audiencia de 7 de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0	45 días	vie 02/03/18	vie 04/05/18	vie 02/03/18	vie 04/05/18		\$0	Fin	\$0	\$0
418	100%	No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: 4 Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del OJ	0	0	51 días	vie 02/03/18	lun 14/05/18	vie 02/03/18	lun 14/05/18		\$0	Fin	\$0	\$0
429	100%	No 3	100%	No			Administración	0	0	1248 días	mar 16/07/15	jun 16/07/18	mar 16/07/15	jun 16/07/18		\$362,475	Fin	\$362,475	\$0
430	100%	No 3.1	100%	No			Gastos indirectos e imprevisos (OJ)	0	0	1248 días	mar 16/07/15	jun 16/07/18	mar 16/07/15	jun 16/07/18		\$362,475	Fin	\$362,475	\$0
431	100%	No 3.1.1	100%	No			Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	0	0	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340	Fin	\$105,340	\$0

Project: PEP SMART_1905_31 B.2 Tasa
 Date: mar 04/09/18

Summary Inactive Task Inactive Milestone Manual Task
 External Task External Milestone Manual Task

Duration only Manual Summary Rollup Manual Summary Start only Progress Progress manual

Finish only Deadline

Margen de demora Retrasado Tareas criticas

Page 2

ID	% Completado	% Fuente	ID	Nombre de la Tarea	Activos	Activos	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento Acumulado	Costo Real	Anticipo
432	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del Bienes y servicios apoyo a la Unidad Ejecutora	0	0 295 días	vie 27/06/18	vie 25/09/15	vie 25/09/15	mar 22/11/16	mar 22/11/16	\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
437	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de cómputo año 2015	0	0 278 días	mar 30/12/17	mar 09/04/16	vie 27/06/18	vie 25/09/18	vie 25/09/18	\$81,637 Fin	\$81,637	\$0
448	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	0	0 139 días	mar 30/12/17	mar 13/07/15	mar 30/12/17	mar 30/12/17	mar 30/12/17	\$276 Fin	\$276	\$0
461	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de cómputo año 2016	0	0 256 días	mar 22/12/17	mar 26/12/16	mar 22/12/17	mar 22/12/17	mar 26/12/16	\$3,857 Fin	\$3,857	\$0
474	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2016	0	0 84 días	mar 08/08/16	mar 31/10/14	mar 08/08/16	mar 08/08/16	mar 31/10/14	\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
486	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2016	0	0 84 días	mar 08/08/16	mar 31/10/14	mar 08/08/16	mar 08/08/16	mar 31/10/14	\$2,331 Fin	\$2,331	\$0
499	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	0	0 106 días	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16	\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
512	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Fotocopadora multifuncional	0	0 83 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15	mar 25/08/15	\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
526	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	0	0 255 días	mar 22/03/17	mar 11/03/17	mar 22/03/17	mar 11/03/17	mar 11/03/17	\$739 Fin	\$739	\$0
539	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 201	0	0 127 días	vie 27/06/18	vie 27/06/18	vie 27/06/18	vie 27/06/18	vie 27/06/18	\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
551	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año 2015, lote 1	0	0 102 días	vie 01/08/14	lun 23/12/14	vie 01/08/14	lun 23/12/14	lun 23/12/14	\$266 Fin	\$266	\$0
565	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	0	0 68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15	mar 29/12/15	\$939 Fin	\$939	\$0
579	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	0	0 72 días	lun 21/09/15	mié 06/01/16	lun 21/09/15	mié 06/01/16	mié 06/01/16	\$322 Fin	\$322	\$0
592	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	0	0 80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 18/01/16	\$934 Fin	\$934	\$0
605	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Toner para equipo XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	0	0 68 días	lun 19/02/16	vie 25/05/18	lun 19/02/16	vie 25/05/18	vie 25/05/18	\$4,908 Fin	\$4,908	\$0
618	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	0	0 70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15	mar 10/11/15	\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
632	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Toner 2016	0	0 71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15	mié 11/11/15	\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
645	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2016	0	0 101 días	mar 02/08/17	lun 26/12/16	mar 02/08/17	lun 26/12/16	lun 26/12/16	\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
658	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Utiles y materiales de oficina año 2016	0	0 98 días	mar 02/08/17	mar 20/12/16	mar 02/08/17	mar 20/12/16	mar 20/12/16	\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
671	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	0	0 24 días	lun 03/11/14	vie 05/12/14	lun 03/11/14	vie 05/12/14	vie 05/12/14	\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
684	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	0	0 134 días	lun 11/05/15	lun 11/05/15	lun 11/05/15	lun 11/05/15	lun 11/05/15	\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
690	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	0	0 216 días	lun 03/02/16	mié 30/11/16	lun 03/02/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
697	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	0	0 21 días	lun 20/02/17	lun 20/02/17	lun 20/02/17	lun 20/02/17	lun 20/02/17	\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
709	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Boletos Aéreo 2017	0	0 17 días	mié 08/11/17	jue 30/11/17	mié 08/11/17	jue 30/11/17	jue 30/11/17	\$4,525 Fin	\$4,525	\$0
717	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	0	0 113 días	lun 03/07/17	lun 11/12/17	lun 03/07/17	lun 11/12/17	lun 11/12/17	\$13,621 Fin	\$13,621	\$0
722	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (Competo y de oficina)	0	0 5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17	vie 21/07/17	\$0 Fin	\$0	\$0
734	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	0	0 39 días	lun 06/11/17	vie 29/12/17	lun 06/11/17	vie 29/12/17	vie 29/12/17	\$4,084 Fin	\$4,084	\$0
744	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: 1 vehículo tipo Pick Up para la comunicación entre Santa Eulalia y la Aldea Inquisit, para uso de los jueces	0	0 87 días	mar 02/01/18	mar 02/05/18	mar 02/01/18	mar 02/05/18	\$0 Fin	\$0	\$0	
756	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: Fotocopadora	0	0 57 días	lun 19/02/18	mié 09/05/18	lun 19/02/18	mié 09/05/18	mié 09/05/18	\$0 Fin	\$0	\$0
768	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Adquisición: 1 Vehículo para la Supervisión de la Sostenibilidad en la Operación y Mantenimiento de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0 44 días	vie 02/03/18	jue 03/05/18	vie 02/03/18	jue 03/05/18	jue 03/05/18	\$0 Fin	\$0	\$0
781	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2018)	0	0 1248 días	mar 16/07/17	jue 31/05/18	mar 16/07/17	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$75,498 Fin	\$75,498	\$0
793	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2018)	0	0 158 días	vie 29/11/13	mar 08/07/14	vie 29/11/13	mar 08/07/14	mar 08/07/14	\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
794	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en infraestructura (año 2018)	0	0 118 días	jue 07/07/16	lun 26/12/16	jue 07/07/16	lun 26/12/16	lun 26/12/16	\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
807	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en infraestructura (año 2018)	0	0 203 días	mar 16/07/15	jue 24/04/14	mar 16/07/15	jue 24/04/14	jue 24/04/14	\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
820	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2015	0	0 244 días	mar 06/07/15	mié 23/12/15	mar 06/07/15	mié 23/12/15	mié 23/12/15	\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
833	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	0	0 238 días	vie 22/01/16	vie 22/01/16	vie 22/01/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16	\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
856	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2017	0	0 273 días	lun 11/11/16	mar 19/12/17	lun 11/11/16	mar 19/12/17	mar 19/12/17	\$15,545 Fin	\$15,545	\$0
871	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Proceso de Contratación: Contable financiero 2018	0	0 123 días	lun 11/12/17	jue 31/05/18	lun 11/12/17	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$7,338 Fin	\$7,338	\$0
889	100%	100%	No 3.1.2.1100%	No	Fin del Programa	0	0 1 día	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18	\$0 Fin	\$0	\$0

Project: PEP SMART_1905_31 81 Task Split Milestone

Date: mar 04/09/18

Summary External Task Manual Task Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary External Milestone

Duration only Manual Summary Rollup Manual Summary Start only Progress manual

Finish only Deadline Progress

Margen de demora Retrasada Tareas críticas

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



[Handwritten signature of Francisco Rafael González Flores]

Elaborado por: (nombre y firma) Francisco Rafael González Flores

[Handwritten signature of William Gilberto Bobadilla López]

Aprobado por: (nombre y firma) Dr. William Gilberto Bobadilla López / Secretario de Área / Secretaría de Fortalecimiento Judicial y

Fecha de actualización

15/11/2018 - 11:16 AM
