

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Junio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/07/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,090,618.61	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,090,618.61	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	15,658,733.39	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31	Monto por desembolsar US\$	-339,821.70 -16.25%

Gráfica de Ejecución

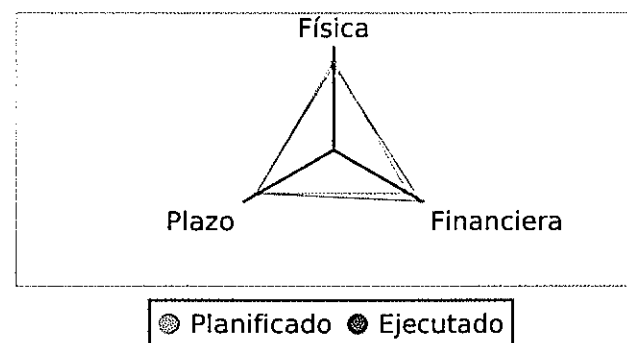

Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	43,378,689.41	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	694,498.30	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	22.83% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	1.60%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

90

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3		0		0		3	
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial	Unidad	0		4	4	0		4	4
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2	2	0		0		2	2
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	2		0	2	0		2	2
Informes de Consultaría de Des arrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial	Unidad	0		2	2	0		2	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adujudación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	30/03/2018	30/03/2018
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	25/04/2018
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriental y Región Nor-occidental)											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	13/04/2018	03/04/2018	20/04/2018
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial											
Insumos y Servicios	Comparación de Precios	06/04/2018		13/04/2018		27/04/2018		04/05/2018		11/05/2018	
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango											
Bienes	Comparación de Precios	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	23/04/2018	13/04/2018		20/04/2018	
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de consultoría de Sistematizador											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	08/02/2018	15/01/2018	12/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	09/02/2018	23/02/2018
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas											
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	12/02/2018	22/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	14/02/2018	09/02/2018	21/02/2018

Adquisición	Método	Elaboración de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y validación de		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	09/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	31/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	22/01/2018	05/02/2018	31/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	15/02/2018
Informes de Consultaría de Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial											
Servicios	Selección Directa (SD)	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	09/04/2018	30/03/2018	17/04/2018
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados											
Bienes	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	18/04/2018	27/03/2018		06/04/2018	
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial											
Bienes e insumos	Comparación de Precios	09/03/2018	21/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	19/04/2018	06/04/2018		13/04/2018	
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Consulta Asistente Contable-Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	21/03/2018
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	Comparación de Precios	05/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/03/2018	19/02/2018		28/02/2018	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Adquisición de boletos aéreos 2018											
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018		24/01/2018		29/01/2018		31/01/2018		06/02/2018	
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional											
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	22/02/2018	15/02/2018	16/03/2018	22/02/2018	09/04/2018	26/02/2018		28/02/2018	
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados											
Bien	Comparación de Precios	09/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	12/04/2018	27/03/2018		13/04/2018	
Informes Consultoría Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial											
Servicios	Contratación Directa	23/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	25/05/2018




Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	0.00	466,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.86
Informes de Consultaría Internacional para Elaboración, Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	61,111.00	91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,777.00
Informes de Consultaría Sistematizador para apoyo de los Talleres de Validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
Talleres de validación de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial (Región Central, Región Nor-oriental y Región Nor-occidental)													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Diseño, Diagramación, impresión y reproducción de la Política de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial													
Insumos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Motocicletas para el desplazamiento del personal de los juzgados de Paz remozados y Juzgados de Paz de Santa Eufalia y San Mateo Ixtatan, ambos de Huehuetenango													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	0.00	466,580.86	77,311.00	642,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,357.86
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
Informes de consultoría de Sistematizador													
Servicios	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas													
Servicios de Consultoría	0.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,992.00
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,811.00
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Informes de Consultoría de Des arrollador de Módulos de Visualización de Agenda única de Audiencias del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
Equipo de computo para fortalecimiento de 5 de los 11 juzgados de paz remozados y el de Santa Eulalia Huehuetenango													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Adquisición de Pantallas para la Proyección de la Agenda única de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Equipo de Audio para las Salas de Audiencias de 7 de los 11 juzgados de Paz remozados													
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del Organismo Judicial													
Bienes e insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Total componente	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,648.00
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
Adquisición de boletos aéreos 2018													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
1 vehículo para la supervisión de la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los 11 juzgados de paz remozados													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
Informes Consulta Asistente Contable-Financiero para la Coejecutora del Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total componente	0.00	78,478.00	290,443.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,521.00
Total	0.00	101,478.00	1,228,171.00	77,311.00	1,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,359.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

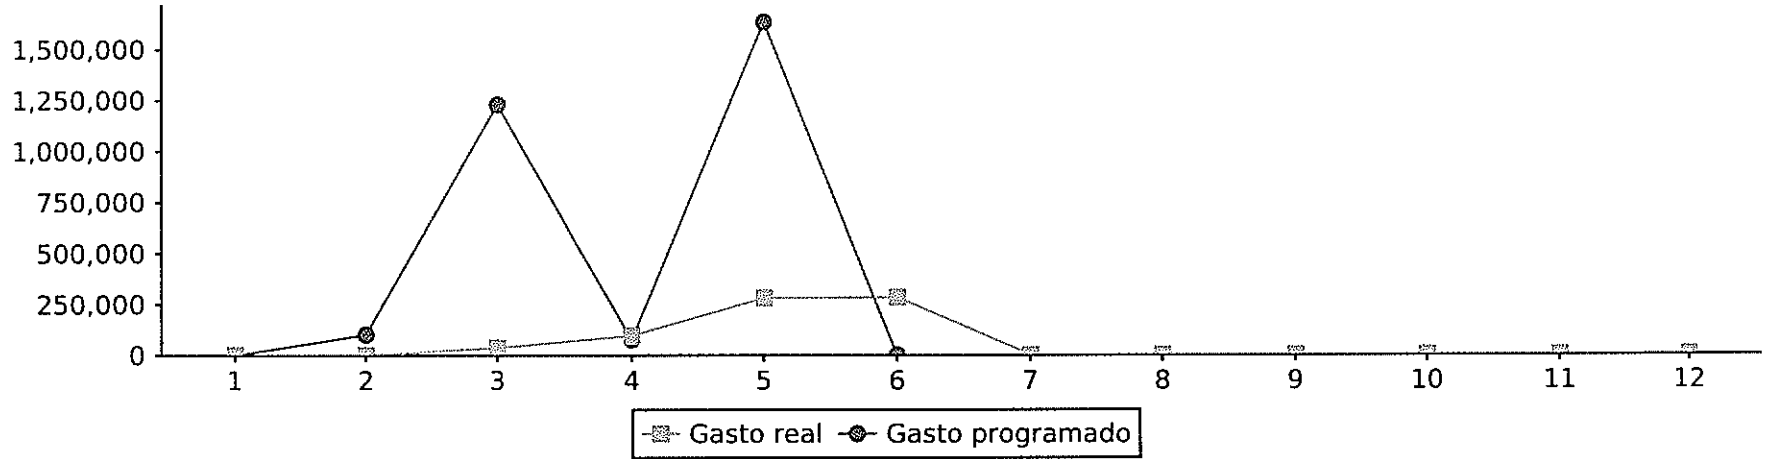

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	34,516.13	96,360.00	280,106.07	283,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	101,478.00	1,228,171.86	77,311.00	1,634,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												694,498.30
Total Gasto programado												3,041,526.86



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ID	Activo	Det %	% Completado Esperado Fin año	% Fuen a fin de año actual	% Identifi empi	% EDT	% Avanc	Hitos	PMR/PV	Nombre de la Tarea	Actv Atras Próxim Mes	Duración Inicio Fin	Comenzos real Fin real	Pred	Financiament	Acumula Costo Real	Anticipo		
0	Sí	Estado atrasada	1	0%	No	99%	No			PEP_SMART_1905_30 6 2018	5	0 1448 días	mié 2/01/13 mar 28/08/18	mié 2/01/13	NOD	\$1,300,812 Fin	\$1,997,592	\$0	
1	Sí	Retrasada C	1	...	BID	No 1	99%	No		Componente 1: Acceso a la Justicia	5	0 1448 días	mié 2/01/13 mar 28/08/18	mié 2/01/13	NOD	\$576,238 Fin	\$487,919	\$0	
2	Sí	Retrasada P	1	...	BID	No 1.1	96%	No		P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	0	0 1404 días	mié 2/01/13 lun 25/06/18	mié 2/01/13	NOD	\$75,576 Fin	\$50,676	\$0	
3	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.1.1	100%	No	Centros Integrados de Justicia funcionando	0	0 1023 días	mié 2/01/13 lun 26/12/16	mié 2/01/13 lun 26/12/16	NOD	\$18,441 Fin	\$18,441	\$0	
38	✓	Sí	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2	93%	No	Proceso Cámara Penal:	5	0 81 días	vie 2/03/18 lun 25/06/18	vie 2/03/18	NOD	\$57,135 Fin	\$32,235	\$0	
39	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para la Elaboración Validación y Plan de Acción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 62 días	mar 6/03/18 jue 31/05/18	mar 6/03/18 jue 31/05/18	NOD	\$20,786 Fin	\$20,786	\$0	
49	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.2	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador para Apoyo en los Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	0	0 58 días	lun 12/03/18 jue 31/05/18	lun 12/03/18 jue 31/05/18	NOD	\$2,139 Fin	\$2,139	\$0	
59	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.1.2.3	100%	No	Proceso de Contratación: 6 Talleres de Validación de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ (Región Nor Oriente) (Región Central) (Región Nor-Occidente)	0	0 64 días	vie 2/03/18 jue 31/05/18	vie 2/03/18 jue 31/05/18	NOD	\$9,310 Fin	\$9,310	\$0	
69	Sí	Retrasada	1	...	BID	No 1.1.2.4	0%	No		Proceso de Contratación: Diseño, Diagramación, Impresión y reproducción de la Política de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del OJ	5	0 17 días	vie 1/06/18 lun 25/06/18	NOD	NOD	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
70	Sí	Retrasada	1	No 1.1.2.4	0%	No		Etapas de Adquisición:	3	0 13 días	vie 1/06/18 mar 19/06/18	NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
71	✓	Sí	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	Sí A	Elaboración de Especificaciones Técnicas, Invitación y Adjudicación	1	0 2 días	vie 1/06/18 lun 4/06/18	NOD	NOD 48	\$0 Fin	\$0	\$0	
72	Sí	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	Sí	F	No Objeción a Especificaciones y Adjudicación	1	0 5 días	mar 5/06/18 lun 11/06/18	NOD	NOD 71	\$0 Fin	\$0	\$0	
73	Sí	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	Sí	F	Elaboración y Firma de Orden Compra	1	0 5 días	mar 12/06/18 mar 19/06/18	NOD	NOD 72	\$0 Fin	\$0	\$0	
74	Sí	Retrasada	1	...	BID	No 1.1.2.4	0%	No		Etapas de Ejecución de pagos:	2	0 4 días	mié 20/06/18 lun 25/06/18	NOD	NOD	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
75	✓	Sí	Retrasada	1	100%	...	No 1.1.2.4	0%	No	Entrega	1	0 2 días	mié 20/06/18 jue 21/06/18	NOD	NOD 73	\$0 Fin	\$0	\$0	
76	Sí	Retrasada	1	100%	...	BID	No 1.1.2.4	0%	No	Pago	1	0 2 días	vie 22/06/18 lun 25/06/18	NOD	NOD 75	\$24,900 Fin	\$0	\$0	
77	Sí	Retrasada P	1	...	BID	No 1.2	99%	No		P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0	0 717 días	mar 3/11/15 mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0	
78	Sí	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1	99%	No		Juzgados de Paz funcionando	0	0 717 días	mar 3/11/15 mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0	
79	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.1	100%	No	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	0	0 30 días	lun 7/12/15 lun 25/01/16	lun 7/12/15 lun 25/01/16	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
80	✓	Sí	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1.2	99%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz	0	0 717 días	mar 3/11/15 mar 28/08/18	mar 3/11/15	NOD	\$479,476 Fin	\$416,056	\$0	
81	✓	Sí	Completada	1	No 1.2.1.2	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 284 días	mar 3/11/15 mar 13/12/16	mar 3/11/15 mar 13/12/16	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
90	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	0	0 392 días	vie 13/05/16 jue 30/11/17	vie 13/05/16 jue 30/11/17	NOD	\$107,727 Fin	\$107,727	\$0	
103	Sí	Retrasada	1	...	BID	No 1.2.1.2	99%	No		Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	0	0 582 días	vie 13/05/16 mar 28/08/18	vie 13/05/16	NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
104	Sí	Según lo prc	1	100%	...	BID	Sí 1.2.1.2	99%	No	KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	0	0 582 días	vie 13/05/16 mar 28/08/18	vie 13/05/16	NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
105	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	Sí A	Publicación / Invitación	0	0 20 días	vie 13/05/16 jue 9/06/16	vie 13/05/16 jue 9/06/16	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
106	✓	Sí	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, Leno El Pino, -90.6271937711941,15.1062769849853	0	0 155 días	lun 7/08/17 mar 13/03/18	lun 7/08/17 mar 13/03/18	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
107	✓	Sí	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115,15.0951973574367	0	0 155 días	lun 7/08/17 mar 13/03/18	lun 7/08/17 mar 13/03/18	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
108	✓	Sí	Completada E	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.8705552920673,15.3469439521427	0	0 155 días	lun 7/08/17 mar 13/03/18	lun 7/08/17 mar 13/03/18	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
109	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	Sí F	Firma de contrato	0	0 69 días	mar 6/09/16 mar 13/12/16	mar 6/09/16 mar 13/12/16	105	\$0 Fin	\$0	\$0	
110	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 7 días	lun 20/03/17 mar 28/03/17	lun 20/03/17 mar 28/03/17	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
111	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	Sí	Orden de Inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	0	0 5 días	lun 7/08/17 vie 11/08/17	lun 7/08/17 vie 11/08/17	110	\$0 Fin	\$0	\$0	
112	✓	Sí	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Anticipo	0	0 7 días	lun 20/03/17 mar 28/03/17	lun 20/03/17 mar 28/03/17	111	\$21,981 Fin	\$21,981	\$0
113	✓	Sí	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Primer pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17 vie 29/12/17	jue 28/12/17 vie 29/12/17	112FC+	\$19,095 Fin	\$19,095	\$0
114	✓	Sí	Completada	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Segundo Pago conforme a contrato	0	0 2 días	jue 28/12/17 vie 29/12/17	jue 28/12/17 vie 29/12/17	113	\$11,867 Fin	\$11,867	\$0
115	✓	Sí	Completada	1	100%	...	No 1.2.1.2	100%	No	Entrega y Recepción Final	0	0 2 días	mié 14/03/18 jue 15/03/18	mié 14/03/18 jue 15/03/18	114FC+	\$0 Fin	\$0	\$0	
116	✓	Sí	Tarea futura	1	100%	...	BID	No 1.2.1.2	0%	No	Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	0	0 1 día	mar 28/08/18 mar 28/08/18	NOD	NOD 115FC+	\$63,419 Fin	\$0	\$0
117	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	0	0 392 días	vie 13/05/16 jue 30/11/17	vie 13/05/16 jue 30/11/17	NOD	\$132,994 Fin	\$132,994	\$0	
131	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.2	100%	No	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	0	0 392 días	vie 13/05/16 jue 30/11/17	vie 13/05/16 jue 30/11/17	NOD	\$122,392 Fin	\$122,392	\$0	
145	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.3	100%	No	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	0	0 512 días	mar 8/12/15 vie 15/12/17	mar 8/12/15 vie 15/12/17	NOD	\$21,187 Fin	\$21,187	\$0	
176	✓	Sí	Completada	1	...	BID	No 1.2.1.4	100%	No	Proceso de Adquisición: Motocicletas para el Desplazamiento del Personal de los Juzgados de Paz, Juzgados Remozados y Juzgados de Paz de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatan de	0	0 45 días	vie 2/03/18 vie 4/05/18	vie 2/03/18 vie 4/05/18	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
188	✓	Sí	Completada C	1	...	BID	No 2	100%	No	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	0	0 1039 días	mar 20/05/14	mar 20/05/14	NOD	\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	
189	✓	Sí	Completada P	1	...	BID	No 2.1	100%	No	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	0	0 1039 días	mar 20/05/14	mar 20/05/14	NOD	\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	
190	✓	Sí	Completada E	1	...	BID	No 2.1.1	100%	No	Interconexión en OJ	0	0 1039 días	mar 20/05/14	mar 20/05/14	NOD	\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0	

Id	Activo	Det %	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuen Ident emp	EDT	% Avanc	Intro	PMR/PA	Nombre de la Tarea	Actv Atr: Próxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamt Acumula	Costo Real	Anticipo
191	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionando (OI)	0	0 1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/14	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	\$0
192	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	0	0 469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
200	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	0	0 317 días	mar 20/05/14	mar 20/05/14	mar 20/05/14	mar 20/05/14		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
207	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	0	0 247 días	mar 8/11/16	mar 31/10/17	mar 8/11/16	mar 31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
218	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	0	0 374 días	mar 25/10/16	mar 25/10/16	mar 25/10/16	mar 25/10/16		\$28,476 Fin	\$28,476	\$0
236	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	0	0 265 días	lun 28/11/16	lun 14/12/17	lun 28/11/16	lun 14/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
246	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	0	0 176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
256	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia	0	0 77 días	jun 5/05/16	mar 23/08/16	jun 5/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
265	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	0	0 235 días	lun 16/01/17	lun 14/12/17	lun 16/01/17	lun 14/12/17		\$5,722 Fin	\$5,722	\$0
276	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	0	0 240 días	lun 16/01/17	lun 21/12/17	lun 16/01/17	lun 21/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
290	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	0	0 234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
304	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	0	0 159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
316	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Logística para la Realización del Taller "Encuentro Pueblos Indígenas del OJ"	0	0 80 días	vie 9/02/18	jun 31/05/18	vie 9/02/18	jun 31/05/18		\$12,965 Fin	\$12,965	\$0
324	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Central	0	0 93 días	mar 23/01/18	jun 31/05/18	mar 23/01/18	jun 31/05/18		\$3,432 Fin	\$3,432	\$0
332	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Oriente	0	0 93 días	mar 23/01/18	jun 31/05/18	mar 23/01/18	jun 31/05/18		\$1,342 Fin	\$1,342	\$0
340	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Occidente	0	0 93 días	mar 23/01/18	jun 31/05/18	mar 23/01/18	jun 31/05/18		\$1,574 Fin	\$1,574	\$0
348	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Taller Preparatorio para el Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0 60 días	mié 7/02/18	lun 30/04/18	mié 7/02/18	lun 30/04/18		\$5,860 Fin	\$5,860	\$0
356	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Internacional de Pueblos Indígenas para realizar el Taller Preparatorio del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas	0	0 83 días	jun 8/02/18	lun 4/06/18	jun 8/02/18	lun 4/06/18		\$9,237 Fin	\$9,237	\$0
366	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador como apoyo al OJ para realización del Taller Preparatorio al Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas	0	0 81 días	jun 8/02/18	jun 31/05/18	jun 8/02/18	jun 31/05/18		\$1,337 Fin	\$1,337	\$0
375	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Desarrollador de Módulos de Visualización de Agenda Única de Audiencias	0	0 75 días	vie 2/03/18	vie 15/06/18	vie 2/03/18	vie 15/06/18		\$5,615 Fin	\$5,615	\$0
385	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de Cómputo para Fortalecer 5 de los 11 Juzgados de Paz Remozados y el Juzgado de Santa Eulalia, Huehuetenango	0	0 43 días	vie 2/03/18	mié 2/05/18	vie 2/03/18	mié 2/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
396	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: 12 Pantallas para la Proyección de la Agenda Única de Audiencias de la Corte Suprema de	0	0 44 días	vie 2/03/18	jun 3/05/18	vie 2/03/18	jun 3/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
407	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de Audio para las Salas de Audiencia de 7 de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0 45 días	vie 2/03/18	vie 4/05/18	vie 2/03/18	vie 4/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
418	SI		1	100	BID	No	2.1.1.1	100%	No	Proceso de Adquisición: 4 Unidades de Circuito Cerrado de Televisión para los Juzgados Penales del OJ	0	0 51 días	vie 2/03/18	lun 14/05/18	vie 2/03/18	lun 14/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0
429	SI	Retrasada GP	1	99	BID	No	3.1	99%	No	Administración	0	2 1290 días	mar 16/07/18	mar 31/07/18	mar 16/07/...	NOD		\$277,475 Fin	\$262,475	\$0
430	SI	Retrasada	1	99	BID	No	3.1	99%	No	Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	0	2 1290 días	mar 16/07/18	mar 31/07/18	mar 16/07/...	NOD		\$277,475 Fin	\$262,475	\$0
431	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.1	100%	No	Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	0	0 295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
432	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.1.1	100%	No	Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del	0	0 295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
447	SI	Retrasada	1	98	BID	No	3.1.2	98%	No	Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	0	2 1042 días	vie 27/06/14	mar 31/07/18	vie 27/06/14	NOD		\$96,637 Fin	\$81,637	\$0
448	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.2.1	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	0	0 278 días	mar 30/12/14	mar 9/02/16	mar 30/12/...	mar 9/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
461	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.2.2	100%	No	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	0	0 139 días	mar 30/12/14	mar 13/07/15	mar 30/12/14	mar 13/07/15		\$276 Fin	\$276	\$0
474	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.2.3	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	0	0 256 días	mar 22/12/14	lun 26/12/16	mar 22/12/...	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
486	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.2.4	100%	No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2015	0	0 84 días	mar 8/07/14	vie 31/10/14	mar 8/07/14	vie 31/10/14		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
499	SI	Completada	1	100	BID	No	3.1.2.5	100%	No	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2016	0	0 98 días	lun 8/08/16	lun 26/12/16	lun 8/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0

90



ID	Activo	Det %	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuen Ident	EDT emp	% Avanz	Hito	PMR/Pr	Nombre de la Tarea	Actw Atras	Activw Proxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiament	Acumul Costo Real	Anticipo	
512	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.6	100%	No		Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	0	0	106 días	lun 25/07/15	lun 26/12/16	lun 25/07/15	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0	
526	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.7	100%	No		Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	0	0	82 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0	
539	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.8	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	0	0	255 días	mar 12/01/16	mié 11/01/17	mar 12/01/16	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0	
551	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.9	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2014	0	0	127 días	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0	
565	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año	0	0	102 días	vie 1/08/14	lun 22/12/14	vie 1/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0	
579	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	0	0	68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0	
592	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	0	0	72 días	lun 21/09/15	mié 6/01/16	lun 21/09/15	mié 6/01/16		\$322 Fin	\$322	\$0	
605	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	0	0	80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16		\$934 Fin	\$934	\$0	
618	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2018	0	0	83 días	lun 19/02/18	lun 14/06/18	lun 19/02/18	lun 14/06/18		\$4,908 Fin	\$4,908	\$0	
632	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	0	0	70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15		\$2,877 Fin	\$2,877	\$0	
645	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	0	0	71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15		\$1,321 Fin	\$1,321	\$0	
658	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Toner 2016	0	0	101 días	mar 2/08/16	lun 26/12/16	mar 2/08/16	lun 26/12/16		\$5,277 Fin	\$5,277	\$0	
671	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	0	0	98 días	mar 2/08/16	mar 20/12/16	mar 2/08/16	mar 20/12/16		\$4,387 Fin	\$4,387	\$0	
684	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.1	100%	No		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	0	0	24 días	lun 3/11/14	vie 5/12/14	lun 3/11/14	vie 5/12/14		\$1,232 Fin	\$1,232	\$0	
690	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	0	0	134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15		\$1,859 Fin	\$1,859	\$0	
697	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	0	0	216 días	lun 1/02/16	mié 30/11/16	lun 1/02/16	mié 30/11/16		\$3,234 Fin	\$3,234	\$0	
709	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	0	0	21 días	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17		\$1,111 Fin	\$1,111	\$0	
717	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	0	0	17 días	mié 8/11/17	lun 30/11/17	mié 8/11/17	lun 30/11/17		\$4,525 Fin	\$4,525	\$0	
722		Sí	0%	0%	L... BID	No 3.1.2.2	0%	No		Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2018	0	0	21 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18					\$15,000 Fin	\$0	\$0
723		Sí	0%	0%	L...	No 3.1.2.2	0%	No		Etapa de Adquisición:	0	0	121 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18					\$0 Fin	\$0	\$0
724		Sí	100%	0%	L... BID	No 3.1.2.2	0%	No		Solicitud de cotización	0	0	121 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18					\$0 Fin	\$0	\$0
725		Sí	100%	0%	L... BID	No 3.1.2.2	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	0	0	121 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18					\$15,000 Fin	\$0	\$0
726		Sí	100%	0%	L... BID	No 3.1.2.2	0%	No		Pendiente de ejecutar	0	0	121 días	lun 2/07/18	mar 31/07/18					\$15,000 Fin	\$0	\$0
727	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	0	0	113 días	lun 3/07/17	lun 11/12/17	lun 3/07/17	lun 11/12/17		\$13,621 Fin	\$13,621	\$0	
734	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	0	0	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		\$0 Fin	\$0	\$0	
744	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	0	0	39 días	lun 6/11/17	vie 29/12/17	lun 6/11/17	vie 29/12/17		\$4,084 Fin	\$4,084	\$0	
756	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Adquisición: 1 vehículo tipo Pick Up para la comunicación entre Santa Eulalia y la Aldea Ixquisil, para uso de los Jueces	0	0	87 días	mar 2/01/18	mié 2/05/18	mar 2/01/18	mié 2/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
768	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.2	100%	No		Proceso de Adquisición: Fotocopiadora	0	0	57 días	lun 19/02/18	mié 9/05/18	lun 19/02/18	mié 9/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
781	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.2.3	100%	No		Proceso de Adquisición: 1 Vehículo para la Supervisión de la Sostenibilidad en la Operación y Mantenimiento de los 11 Juzgados de Paz Remozados	0	0	44 días	vie 2/03/18	lun 3/05/18	vie 2/03/18	lun 3/05/18		\$0 Fin	\$0	\$0	
793	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3	100%	No		Personal de la Unidad Coejecutora	0	0	1248 días	mar 16/07/11	lun 31/05/18	mar 16/07/11	lun 31/05/18		\$75,498 Fin	\$75,498	\$0	
794	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.1	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	0	0	158 días	vie 29/11/13	mar 8/07/14	vie 29/11/13	mar 8/07/14		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0	
807	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.2	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	0	0	118 días	lun 7/07/16	lun 26/12/16	lun 7/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0	
820	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.3	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura (año 2016)	0	0	203 días	mar 16/07/11	lun 24/04/14	mar 16/07/11	lun 24/04/14		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0	
833	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.4	100%	No		Proceso de contratación: Contable financiero 2015	0	0	244.88 días	mar 6/01/15	mié 23/12/15	mar 6/01/15	mié 23/12/15		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0	
856	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.5	100%	No		Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	0	0	238 días	vie 22/01/16	lun 22/12/16	vie 22/01/16	lun 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0	
871	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.6	100%	No		Proceso de Contratación: Contable financiero 2017	0	0	273 días	lun 21/11/16	mar 19/12/17	lun 21/11/16	mar 19/12/17		\$15,545 Fin	\$15,545	\$0	
889	✓	Sí	100%	100%	L... BID	No 3.1.3.7	100%	No		Proceso de Contratación: Contable financiero 2018	0	0	123 días	lun 11/12/17	lun 31/05/18	lun 11/12/17	lun 31/05/18		\$7,338 Fin	\$7,338	\$0	




Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Francisco Rafael González Flores



Aprobado por: (nombre y firma) Dr. William Gilberto Bobadilla López / Secretario de Area / Secretaria de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

9/7/2018 - 9:04 AM
