

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	07/03/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,879,175.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,879,175.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q	28,628,311.50	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31 62.65%	Monto por desembolsar USD\$	1,448,734.69 37.35%

Gráfica de Ejecución

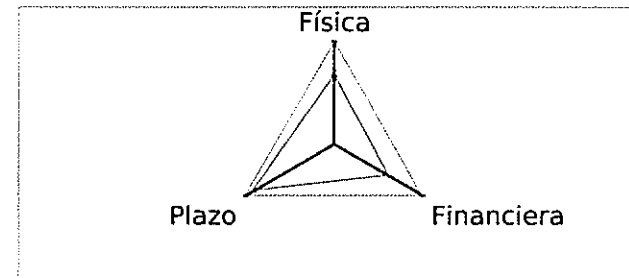

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.38 X 1 USD



Handwritten signature or initials.

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	39,136,371.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	7.63% / 7.63%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	104.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3		0		0		3	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Productos Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2		0		0		2	
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	1		0		0		1	
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de consultoría de Sistematizador											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	08/02/2018	15/01/2018	12/02/2018	31/01/2018		05/02/2018		09/02/2018	
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas											
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	12/02/2018	22/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	14/02/2018	09/02/2018	21/02/2018
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	09/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	31/01/2018	16/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ											
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	22/01/2018	05/02/2018	31/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	15/02/2018
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Consulta Asistente Contable-Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	16/02/2018	
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	Comparación de Precios	05/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	25/01/2018	09/02/2018		19/02/2018		28/02/2018	
Adquisición de boletos aéreos 2018											
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018		24/01/2018		29/01/2018		31/01/2018		06/02/2018	
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional											

Ejecución Financiera Anual

Insuño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	0.00	466,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.86
Total componente	0.00	0.00	466,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.86
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Productos Consultaría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
Informes de consultoría de Sistematizador													
Servicios	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas													
Servicios de Consultoría	0.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,992.00
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,811.00
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Total componente	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,148.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
Adquisición de boletos aéreos 2018													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios de OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Total componente	0.00	78,478.00	290,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,921.00
Total	0.00	101,473.00	1,228,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,649.88

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

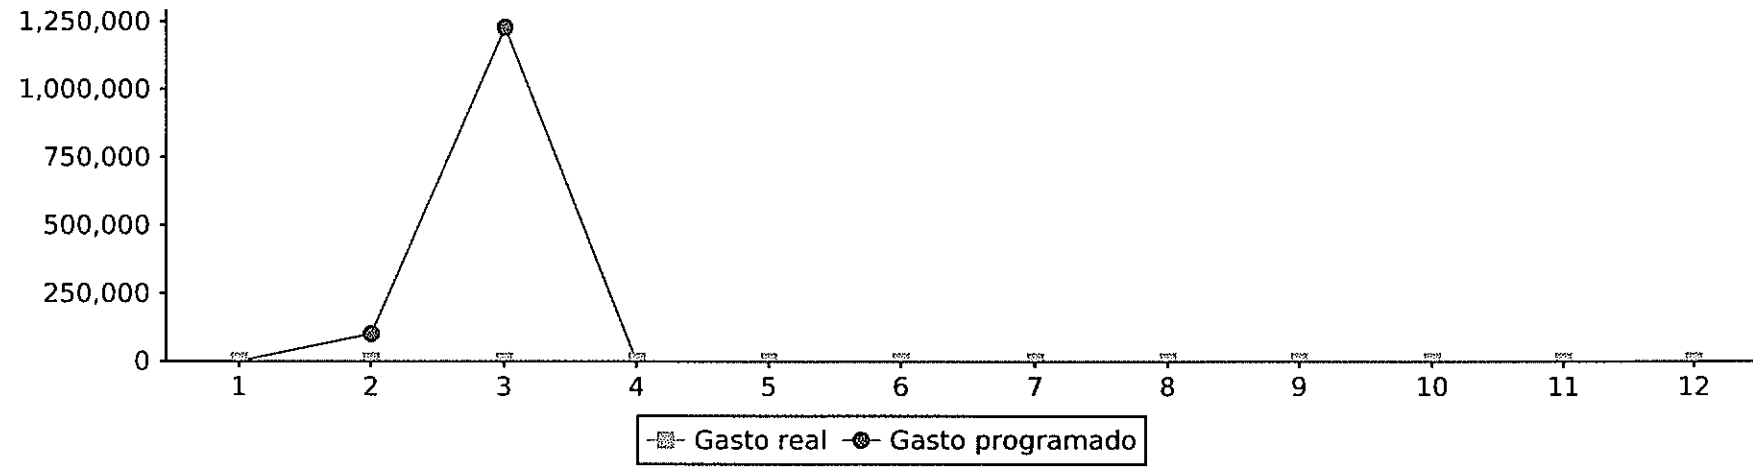

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	101,478.00	1,228,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												0.00
Total Gasto programado												1,329,649.86

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J
Q

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	22/02/2018	15/02/2018		22/02/2018		26/02/2018		28/02/2018	

Id	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acum Costo Real	Anticipo
0			No 0	91%	PEP_SMART_1905,0	1352 días	mié 02/01/13	vie 13/04/18	mié 02/01/13		NOD	\$2,108,106 Fin	\$1,908,974	\$0
1	BID		No 1	91%	Componente 1: Acceso a la Justicia	1334 días	mié 02/01/13	lun 19/03/16	mié 02/01/13		NOD	\$519,103 Fin	\$455,684	\$0
2	BID		No 1.1	100%	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
38	BID		No 1.2	91%	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	603 días	mar 03/11/15	lun 19/03/16	mar 03/11/15		NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0
39	BID		No 1.2.1	91%	Juzgados de Paz funcionando	603 días	mar 03/11/15	lun 19/03/16	mar 03/11/15		NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0
40			No 1.2.1.1	100%	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)	30 días	lun 07/12/15	lun 25/01/16	lun 07/12/15	lun 25/01/16		\$0 Fin	\$0	\$0
41	BID		No 1.2.1.2	90%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz	603 días	mar 03/11/15	lun 19/03/18	mar 03/11/15		NOD	\$479,476 Fin	\$416,056	\$0
42			No 1.2.1.2.1	100%	Etapas de Adquisición:	284 días	mar 03/11/15	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
51	BID		No 1.2.1.2.2	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)	392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$107,727 Fin	\$107,727	\$0
64	BID		No 1.2.1.2.3	29%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)	468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0
65	BID		SI 1.2.1.2.3.1	29%	KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0
66	A		No 1.2.1.2.3.1.1	100%	Publicación / Invitación	20 días	vie 13/05/16	jue 09/06/16	vie 13/05/16	jue 09/06/16		\$0 Fin	\$0	\$0
67			No 1.2.1.2.3.1.2	0%	Juzgado de Paz, Lano El Pino, -90.627193771941,15.1062769849853	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
68			No 1.2.1.2.3.1.3	0%	Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115,15.0951973574367	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
69			No 1.2.1.2.3.1.4	0%	Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.8705552920673,15.3469439521427	91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
70	F		No 1.2.1.2.3.1.5	100%	Firma de contrato	69 días	mar 06/09/16	mar 13/12/16	mar 06/09/16	mar 13/12/16	66	\$0 Fin	\$0	\$0
71			No 1.2.1.2.3.1.6	100%	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17		\$0 Fin	\$0	\$0
72			No 1.2.1.2.3.1.7	100%	Orden de Inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán	5 días	lun 07/08/17	vie 11/08/17	lun 07/08/17	vie 11/08/17	71	\$0 Fin	\$0	\$0
73	BID	I	No 1.2.1.2.3.1.8	100%	Anticipo	7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17	72	\$21,981 Fin	\$21,981	\$0
74	BID		No 1.2.1.2.3.1.9	100%	Primer pago conforme a contrato	2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	73FC+	\$19,095 Fin	\$19,095	\$0
75	BID		No 1.2.1.2.3.1.10	100%	Segundo Pago conforme a contrato	2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	74	\$11,867 Fin	\$11,867	\$0
76			No 1.2.1.2.3.1.11	100%	Entrega y Recepcion Final	2 días	jue 15/03/18	vie 16/03/18			NOD 75FC+	\$0 Fin	\$0	\$0
77	BID		No 1.2.1.2.3.1.12	0%	Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos	1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18			NOD 76	\$63,419 Fin	\$0	\$0
78	BID		No 1.2.1.2.4	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)	392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$132,994 Fin	\$132,994	\$0
92	BID		No 1.2.1.2.5	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)	392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$122,392 Fin	\$122,392	\$0
106	BID		No 1.2.1.3	100%	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados	512 días	mar 08/12/15	vie 15/12/17	mar 08/12/15	vie 15/12/17		\$21,187 Fin	\$21,187	\$0
137	BID		No 2	91%	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de información y Gestión Penal	990 días	mar 20/05/14	mar 10/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,279,071 Fin	\$1,198,674	\$0
138	BID		No 2.1	91%	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	990 días	mar 20/05/14	mar 10/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,279,071 Fin	\$1,198,674	\$0
139	BID		No 2.1.1	91%	Interconexión en OJ	990 días	mar 20/05/14	mar 10/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,279,071 Fin	\$1,198,674	\$0
140	BID		No 2.1.1.1	91%	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionando (OJ)	990 días	mar 20/05/14	mar 10/04/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,279,071 Fin	\$1,198,674	\$0
141	BID		No 2.1.1.1.1	100%	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
149	BID		No 2.1.1.1.2	100%	Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	317 días	mar 20/05/14	06/08/15	mar 20/05/14	jue 06/08/15		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
156	BID		No 2.1.1.1.3	100%	Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal	247 días	mar 08/11/16	mar 31/10/17	mar 08/11/16	mar 31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
167	BID		No 2.1.1.1.4	88%	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	364 días	mar 25/10/16	vie 30/03/18	mar 25/10/16		NOD	\$28,536 Fin	\$21,314	\$0

Project: PEP_SMART_1905,0 Date: mié 07/03/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	3	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	↓	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		

Id	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acum. Costo Real	Anticipo
168			No 2.1.1.1.4.1	100%	Etapa de Adquisición:	165 días	mar 25/10/14	mar 20/06/17	mar 25/10/16	mar 20/06/17		\$0 Fin	\$0	\$0
175	BID		No 2.1.1.1.4.2	62%	Etapa de Ejecución de Pago:	173 días	vie 28/07/17	vie 30/03/11	vie 28/07/17	NOD		\$28,536 Fin	\$21,314	\$0
176	BID		No 2.1.1.1.4.2.1	100%	Producto 1	2 días	vie 28/07/17	lun 31/07/11	vie 28/07/17	lun 31/07/17	174	\$4,120 Fin	\$4,120	\$0
177	BID		No 2.1.1.1.4.2.2	100%	Producto 2	5 días	vie 25/08/17	jue 31/08/11	vie 25/08/17	jue 31/08/17	176	\$3,022 Fin	\$3,022	\$0
178	BID		No 2.1.1.1.4.2.3	100%	Producto 3	17 días	vie 06/10/17	mar 31/10/11	vie 06/10/17	mar 31/10/17	177	\$2,861 Fin	\$2,861	\$0
179	BID		No 2.1.1.1.4.2.4	100%	Producto 4	0 días	mar 24/10/11	mar 24/10/11	mar 24/10/17	mar 24/10/17	178	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
180	BID		No 2.1.1.1.4.2.5	100%	Producto 5	6 días	mié 08/11/17	mié 15/11/11	mié 08/11/17	mié 15/11/17	179	\$2,864 Fin	\$2,864	\$0
181	BID		No 2.1.1.1.4.2.6	100%	Producto 6	6 días	jue 23/11/17	jue 30/11/11	jue 23/11/17	jue 30/11/17	180	\$2,997 Fin	\$2,997	\$0
182	BID		No 2.1.1.1.4.2.7	100%	Producto 7	0 días	vie 08/12/17	mié 13/12/11	vie 08/12/17	mié 13/12/17	181FC-	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
183	BID		No 2.1.1.1.4.2.8	0%	Producto 8	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/11	NOD	NOD	182FC-	\$3,216 Fin	\$0	\$0
184	BID		No 2.1.1.1.4.2.9	0%	Producto 9	2 días	jue 29/03/18	vie 30/03/11	NOD	NOD	183	\$4,006 Fin	\$0	\$0
185	BID		No 2.1.1.1.5	100%	Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	265 días	lun 28/11/16	jue 14/12/17	lun 28/11/16	jue 14/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
195	BID		No 2.1.1.1.6	100%	Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
205	BID		No 2.1.1.1.7	100%	Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector	77 días	jue 05/05/16	mar 23/08/16	jue 05/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
214	BID		No 2.1.1.1.8	100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal	235 días	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17	jue 14/12/17		\$5,722 Fin	\$5,722	\$0
225	BID		No 2.1.1.1.9	100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal	240 días	lun 16/01/17	jue 21/12/17	lun 16/01/17	jue 21/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
239	BID		No 2.1.1.1.10	100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal	234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
253	BID		No 2.1.1.1.11	100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal	159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
265	BID		No 2.1.1.1.12	24%	Proceso de Contratación: Logística para la Realización del Taller "Encuentro Pueblos Indígenas	41 días	jue 08/02/18	vie 06/04/18	jue 08/02/18	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
266			No 2.1.1.1.12.1	32%	Etapa de Adquisición:	18 días	jue 08/02/18	lun 05/03/11	jue 08/02/18	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
267			No 2.1.1.1.12.1.1	100%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	2 días	jue 08/02/18	vie 09/02/11	jue 08/02/18	vie 09/02/18		\$0 Fin	\$0	\$0
268			No 2.1.1.1.12.1.2	100%	Especificaciones revisados	1 día	lun 12/02/18	lun 12/02/11	lun 12/02/18	lun 12/02/18	267	\$0 Fin	\$0	\$0
269			No 2.1.1.1.12.1.3	0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	0 días	lun 12/02/18	lun 12/02/11	NOD	NOD	268	\$0 Fin	\$0	\$0
270	A		No 2.1.1.1.12.1.4	0%	Publicación / Invitación	5 días	mar 13/02/11	lun 19/02/11	NOD	NOD	269	\$0 Fin	\$0	\$0
271			No 2.1.1.1.12.1.5	0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	10 días	mar 20/02/11	lun 05/03/11	NOD	NOD	270	\$0 Fin	\$0	\$0
272			No 2.1.1.1.12.1.6	100%	NOB evaluación	0 días	mar 13/02/11	mar 13/02/11	mar 13/02/18	mar 13/02/18	271	\$0 Fin	\$0	\$0
273	F		No 2.1.1.1.12.1.7	100%	Elaboración y Firma de Orden Compra	1 día	lun 19/02/18	lun 19/02/11	lun 19/02/18	lun 19/02/18	272	\$0 Fin	\$0	\$0
274			No 2.1.1.1.12.1.8	100%	Realización de taller	3 días	mié 21/02/18	vie 23/02/11	mié 21/02/18	vie 23/02/18	273	\$0 Fin	\$0	\$0
275	BID		No 2.1.1.1.12.2	0%	Etapa de Ejecución de pagos:	7 días	mié 28/03/11	vie 06/04/11	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
276	BID		No 2.1.1.1.12.2.1	0%	Pago 1	7 días	mié 28/03/18	vie 06/04/11	NOD	NOD	274FC-	\$25,000 Fin	\$0	\$0
277	BID		No 2.1.1.1.13	0%	Proceso de Contratación: Adquisición de Equipo de Computo para el Juzgado de Santa Eulalia	79 días	mié 29/11/17	mar 20/03/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
278			No 2.1.1.1.13.1	0%	Etapa de Adquisición:	50 días	mié 29/11/17	mié 07/02/11	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
279			No 2.1.1.1.13.1.1	0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/11	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
280			No 2.1.1.1.13.1.2	0%	Especificaciones revisados	3 días	mié 13/12/17	vie 15/12/11	NOD	NOD	279	\$0 Fin	\$0	\$0
281			No 2.1.1.1.13.1.3	0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/11	NOD	NOD	280	\$0 Fin	\$0	\$0
282	A		No 2.1.1.1.13.1.4	0%	Publicación / Invitación	5 días	mar 26/12/11	lun 01/01/11	NOD	NOD	281	\$0 Fin	\$0	\$0
283			No 2.1.1.1.13.1.5	0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	10 días	mar 02/01/11	lun 15/01/11	NOD	NOD	282	\$0 Fin	\$0	\$0
284			No 2.1.1.1.13.1.6	0%	NOB evaluación	9 días	mar 16/01/11	vie 26/01/11	NOD	NOD	283	\$0 Fin	\$0	\$0
285	F		No 2.1.1.1.13.1.7	0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	3 días	lun 29/01/18	mié 31/01/11	NOD	NOD	284	\$0 Fin	\$0	\$0

19. 20. 20. 21.

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 07/03/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	J	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	3	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		



ID	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acum Costo Real	Anticipo
286				No 2.1.1.1.13.1.80%	Realización de taller	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18			NOD	NOD 285	\$0 Fin	\$0
287	BID			No 2.1.1.1.13.2.0%	Etapas de Ejecución de pagos:	7 días	lun 12/03/18	mar 20/03/18			NOD	NOD	\$25,000 Fin	\$0
288	BID			No 2.1.1.1.13.2.10%	Pago	7 días	lun 12/03/18	mar 20/03/18			NOD	NOD 286FC-	\$25,000 Fin	\$0
289	BID			No 2.1.1.1.14	55%	49 días	mar 23/01/18	vie 30/03/18	mar 23/01/18		NOD	NOD	\$3,500 Fin	\$0
Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Central														
290				No 2.1.1.1.14.1	100%	17 días	mar 23/01/18	mié 14/02/18	mar 23/01/18	mié 14/02/18			\$0 Fin	\$0
291	A			No 2.1.1.1.14.1.1	100%	3 días	mar 23/01/18	jue 25/01/18	mar 23/01/18	jue 25/01/18			\$0 Fin	\$0
Elaboración de Especificaciones Técnicas, Invitación y Adjudicación														
292				No 2.1.1.1.14.1.2	100%	6 días	vie 26/01/18	vie 02/02/18	vie 26/01/18	vie 02/02/18			\$0 Fin	\$0
293	F			No 2.1.1.1.14.1.3	100%	1 día	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18			\$0 Fin	\$0
294				No 2.1.1.1.14.1.4	100%	2 días	mar 13/02/18	mié 14/02/18	mar 13/02/18	mié 14/02/18			\$0 Fin	\$0
295	BID			No 2.1.1.1.14.2	0%	10 días	lun 19/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD	\$3,500 Fin	\$0
296	BID			No 2.1.1.1.14.2.10%		10 días	lun 19/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD 294FC-	\$3,500 Fin	\$0
297	BID			No 2.1.1.1.15	48%	49 días	mar 23/01/18	vie 30/03/18	mar 23/01/18		NOD	NOD	\$1,370 Fin	\$0
Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Oriente														
298				No 2.1.1.1.15.1	100%	15 días	mar 23/01/18	lun 12/02/18	mar 23/01/18	lun 12/02/18			\$0 Fin	\$0
299	A			No 2.1.1.1.15.1.1	100%	5 días	mar 23/01/18	lun 29/01/18	mar 23/01/18	lun 29/01/18			\$0 Fin	\$0
Elaboración de Especificaciones Técnicas, Invitación y Adjudicación														
300				No 2.1.1.1.15.1.2	100%	4 días	mar 30/01/18	vie 02/02/18	mar 30/01/18	vie 02/02/18			\$0 Fin	\$0
301	F			No 2.1.1.1.15.1.3	100%	1 día	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18			\$0 Fin	\$0
302				No 2.1.1.1.15.1.4	100%	1 día	dom 11/02/18	lun 12/02/18	dom 11/02/18	lun 12/02/18			\$0 Fin	\$0
303	BID			No 2.1.1.1.15.2	0%	12 días	jue 15/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD	\$1,370 Fin	\$0
304	BID			No 2.1.1.1.15.2.10%		12 días	jue 15/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD 302FC-	\$1,370 Fin	\$0
305	BID			No 2.1.1.1.16	55%	49 días	mar 23/01/18	vie 30/03/18	mar 23/01/18		NOD	NOD	\$1,605 Fin	\$0
Proceso de Contratación: Talleres de Revisión y Validación de la Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al OJ de la Región Nor Occidente														
306				No 2.1.1.1.16.1	100%	18 días	mar 23/01/18	jue 15/02/18	mar 23/01/18	jue 15/02/18			\$0 Fin	\$0
307	A			No 2.1.1.1.16.1.1	100%	5 días	mar 23/01/18	lun 29/01/18	mar 23/01/18	lun 29/01/18			\$0 Fin	\$0
308				No 2.1.1.1.16.1.2	100%	4 días	mar 30/01/18	vie 02/02/18	mar 30/01/18	vie 02/02/18			\$0 Fin	\$0
309	F			No 2.1.1.1.16.1.3	100%	0 días	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18	lun 05/02/18			\$0 Fin	\$0
310				No 2.1.1.1.16.1.4	100%	2 días	mié 14/02/18	jue 15/02/18	mié 14/02/18	jue 15/02/18			\$0 Fin	\$0
311	BID			No 2.1.1.1.16.2	0%	9 días	mar 20/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD	\$1,605 Fin	\$0
312	BID			No 2.1.1.1.16.2.10%		9 días	mar 20/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD 310FC-	\$1,605 Fin	\$0
313	BID			No 2.1.1.1.17	38%	38 días	mié 07/02/18	vie 30/03/18	mié 07/02/18		NOD	NOD	\$5,899 Fin	\$0
Proceso de Contratación: Taller Preparatorio para el Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas														
314				No 2.1.1.1.17.1	100%	8 días	mié 07/02/18	vie 16/02/18	mié 07/02/18	vie 16/02/18			\$0 Fin	\$0
315	A			No 2.1.1.1.17.1.1	100%	2 días	mié 07/02/18	jue 08/02/18	mié 07/02/18	jue 08/02/18			\$0 Fin	\$0
Elaboración de Especificaciones Técnicas, Invitación y Adjudicación														
316				No 2.1.1.1.17.1.2	100%	1 día	jue 08/02/18	vie 09/02/18	jue 08/02/18	vie 09/02/18			\$0 Fin	\$0
317	F			No 2.1.1.1.17.1.3	100%	1 día	jue 15/02/18	jue 15/02/18	jue 15/02/18	jue 15/02/18			\$0 Fin	\$0
318				No 2.1.1.1.17.1.4	100%	1 día	jue 15/02/18	vie 16/02/18	jue 15/02/18	vie 16/02/18			\$0 Fin	\$0
319	BID			No 2.1.1.1.17.2	0%	8 días	mié 21/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD	\$5,899 Fin	\$0
320	BID			No 2.1.1.1.17.2.10%		8 días	mié 21/03/18	vie 30/03/18			NOD	NOD 318FC-	\$5,899 Fin	\$0
321	BID			No 2.1.1.1.18	50%	29 días	vie 09/02/18	mié 21/03/18	vie 09/02/18		NOD	NOD	\$9,300 Fin	\$0
Proceso de Contratación: Consultor Internacional de Pueblos Indígenas para realizar el Taller Preparatorio del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas														
322				No 2.1.1.1.18.1	100%	11 días	vie 09/02/18	vie 23/02/18	vie 09/02/18	vie 23/02/18			\$0 Fin	\$0
323	A			No 2.1.1.1.18.1.1	100%	1 día	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18			\$0 Fin	\$0
324				No 2.1.1.1.18.1.2	100%	1 día	lun 12/02/18	lun 12/02/18	lun 12/02/18	lun 12/02/18			\$0 Fin	\$0
325				No 2.1.1.1.18.1.3	100%	1 día	mié 14/02/18	mié 14/02/18	mié 14/02/18	mié 14/02/18			\$0 Fin	\$0

19, 20, 20, 21

Project: PEP_SMART_1905.0	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
Date: mié 07/03/18	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only]	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	s	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		



Id	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acum Costo Real	Anticipo
326	F	No 2.1.1.1.18.1.4	100%		Elaboración y Firma de Contratato	0 días	mié 14/02/18	mié 14/02/18	mié 14/02/18	mié 14/02/18	325	\$0 Fin	\$0	\$0
327		No 2.1.1.1.18.1.5	100%		Realización de taller	2 días	jue 15/02/18	vie 16/02/18	jue 15/02/18	vie 16/02/18	326	\$0 Fin	\$0	\$0
328		No 2.1.1.1.18.1.6	100%		Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas	3 días	mié 21/02/18	vie 23/02/18	mié 21/02/18	vie 23/02/18		\$0 Fin	\$0	\$0
329	BID	No 2.1.1.1.18.2	0%		Etapas de Ejecución de pagos:	8 días	lun 12/03/18	mié 21/03/18	NOD	NOD		\$9,300 Fin	\$0	\$0
330	BID	No 2.1.1.1.18.2.10%			Pago	8 días	lun 12/03/18	mié 21/03/18	NOD	NOD	327FC-	\$9,300 Fin	\$0	\$0
331	BID	No 2.1.1.1.19	22%		Proceso de Contratación: Consultor Sistematizador como apoyo al OJ para realización del Taller	46 días	lun 05/02/18	mar 10/04/18	lun 05/02/18		NOD	\$1,500 Fin	\$0	\$0
332		No 2.1.1.1.19.1	33%		Preparatorio al Encuentro Nacional de Autoridades	16 días	lun 05/02/18	lun 26/02/18	lun 05/02/18		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
333	A	No 2.1.1.1.19.1.1	100%		Etapas de Adquisición:	4 días	lun 05/02/18	jue 08/02/18	lun 05/02/18	jue 08/02/18		\$0 Fin	\$0	\$0
334		No 2.1.1.1.19.1.2	100%		Elaboración de Tdr's y Contratación	1 día	lun 12/02/18	lun 12/02/18	lun 12/02/18	lun 12/02/18	333	\$0 Fin	\$0	\$0
335		No 2.1.1.1.19.1.3	0%		No Objeción a Tdr's y Contratación	5 días	mar 13/02/18	lun 19/02/18	NOD	NOD	334	\$0 Fin	\$0	\$0
336	F	No 2.1.1.1.19.1.4	0%		Resolución para Contratación	3 días	mar 20/02/18	jue 22/02/18	NOD	NOD	335	\$0 Fin	\$0	\$0
337		No 2.1.1.1.19.1.5	0%		Elaboración y Firma de Contratato	2 días	vie 23/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	336	\$0 Fin	\$0	\$0
338	BID	No 2.1.1.1.19.2	0%		Realización de taller	8 días	jue 29/03/18	mar 10/04/18	NOD	NOD		\$1,500 Fin	\$0	\$0
339	BID	No 2.1.1.1.19.2.10%			Etapas de Ejecución de pagos:	8 días	jue 29/03/18	mar 10/04/18	NOD	NOD	337FC-	\$1,500 Fin	\$0	\$0
340	BID	No 3	90%		Pago	1213 días	mar 16/07/11	vie 13/04/11	mar 16/07/11		NOD	\$309,932 Fin	\$254,615	\$0
341	BID	No 3.1	90%		Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	1213 días	mar 16/07/11	vie 13/04/11	mar 16/07/11		NOD	\$309,932 Fin	\$254,615	\$0
342	BID	No 3.1.1	100%		Administración	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/16	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
358	BID	No 3.1.2	88%		Bienes y servicios apoyo al Organismo Judicial	965 días	vie 27/06/14	vie 13/04/11	vie 27/06/14		NOD	\$131,729 Fin	\$81,116	\$0
359	BID	No 3.1.2.1	100%		Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	278 días	mar 30/12/11	mar 09/02/16	mar 30/12/11	mar 09/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
372	BID	No 3.1.2.2	100%		Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	139 días	mar 30/12/11	lun 13/07/16	mar 30/12/11	lun 13/07/16		\$276 Fin	\$276	\$0
385	BID	No 3.1.2.3	100%		Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento ext	256 días	mar 22/12/11	lun 26/12/16	mar 22/12/11	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
397	BID	No 3.1.2.4	100%		Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	84 días	mar 08/07/11	vie 31/10/16	mar 08/07/11	vie 31/10/16		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
410	BID	No 3.1.2.5	100%		Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora	98 días	lun 08/08/16	lun 26/12/16	lun 08/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0
423	BID	No 3.1.2.6	100%		Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora	106 días	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
437	BID	No 3.1.2.7	100%		Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	82 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
450	BID	No 3.1.2.8	100%		Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora	255 días	mar 12/01/11	mié 11/01/17	mar 12/01/11	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0
462	BID	No 3.1.2.9	100%		Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2015	127 días	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
476	BID	No 3.1.2.10	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015	102 días	vie 01/08/14	lun 22/12/14	vie 01/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0
490	BID	No 3.1.2.11	100%		Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación	68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0
503	BID	No 3.1.2.12	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015	72 días	lun 21/09/15	mié 06/01/16	lun 21/09/15	mié 06/01/16		\$322 Fin	\$322	\$0
516	BID	No 3.1.2.13	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015	80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16		\$934 Fin	\$934	\$0
529	BID	No 3.1.2.14	100%		Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15		\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
542	BID	No 3.1.2.15	100%		Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15		\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
555	BID	No 3.1.2.16	100%		Proceso de Adquisición: Toner 2016	101 días	mar 02/08/11	lun 26/12/16	mar 02/08/11	lun 26/12/16		\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
568	BID	No 3.1.2.17	100%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015	98 días	mar 02/08/11	mar 20/12/16	mar 02/08/11	mar 20/12/16		\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
581	BID	No 3.1.2.18	12%		Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015	34 días	lun 19/02/18	vie 06/04/18	lun 19/02/18		NOD	\$5,000 Fin	\$4,387	\$0
582		No 3.1.2.18.1	15%		Etapas de Adquisición:	27 días	lun 19/02/18	mar 27/03/18	lun 19/02/18		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
583		No 3.1.2.18.1.1	100%		Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 19/02/18	jue 22/02/18	lun 19/02/18	jue 22/02/18		\$0 Fin	\$0	\$0
584		No 3.1.2.18.1.2	0%		No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	vie 23/02/18	jue 01/03/18	NOD	NOD	583	\$0 Fin	\$0	\$0
585	A	No 3.1.2.18.1.3	0%		Publicación / Invitación	5 días	vie 02/03/18	jue 08/03/18	NOD	NOD	584	\$0 Fin	\$0	\$0
586		No 3.1.2.18.1.4	0%		Ofertas recibidas	1 día	vie 09/03/18	vie 09/03/18	NOD	NOD	585	\$0 Fin	\$0	\$0
587		No 3.1.2.18.1.5	0%		Apertura	1 día	lun 12/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	586	\$0 Fin	\$0	\$0
588		No 3.1.2.18.1.6	0%		Evaluación y recomendación adjudicación	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	587	\$0 Fin	\$0	\$0
589		No 3.1.2.18.1.7	0%		NOB evaluación	5 días	mar 20/03/18	lun 26/03/18	NOD	NOD	588	\$0 Fin	\$0	\$0
590	F	No 3.1.2.18.1.8	0%		Contratación	1 día	mar 27/03/18	mar 27/03/18	NOD	NOD	589	\$0 Fin	\$0	\$0
591	BID	No 3.1.2.18.2	0%		Etapas de Ejecución de pagos:	7 días	mié 28/03/18	vie 06/04/18	NOD	NOD		\$5,000 Fin	\$4,387	\$0
592	BID	No 3.1.2.18.2.1	0%		Fin del contrato	7 días	mié 28/03/18	vie 06/04/18	NOD	NOD	590	\$5,000 Fin	\$4,387	\$0

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 07/03/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	J	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	S	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		

Id	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	AcumCosto Real	Anticipo
593	BID		No 3.1.2.19	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2	24 días	lun 03/11/14	vie 05/12/14	lun 03/11/14	vie 05/12/14		\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
599	BID		No 3.1.2.20	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2	134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15		\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
606	BID		No 3.1.2.21	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2	216 días	lun 01/02/16	mié 30/11/16	lun 01/02/16	mié 30/11/16		\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
618	BID		No 3.1.2.22	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2	21 días	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17		\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
626	BID		No 3.1.2.23	100%	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	17 días	mié 08/11/17	jue 30/11/17	mié 08/11/17	jue 30/11/17		\$4,525 Fin	\$4,525	\$0
631	BID		No 3.1.2.24	0%	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2018	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$15,000 Fin	\$0	\$0
632			No 3.1.2.24.1	0%	Etapa de Adquisición:	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
633			No 3.1.2.24.1.1	0%	Solicitud de cotización	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
634	BID		No 3.1.2.24.2	0%	Etapa de Ejecución de pagos:	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$15,000 Fin	\$0	\$0
635	BID		No 3.1.2.24.2.1	0%	Pendiente de ejecutar	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$15,000 Fin	\$0	\$0
636	BID		No 3.1.2.25	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	113 días	lun 03/07/17	lun 11/12/17	lun 03/07/17	lun 11/12/17		\$13,621 Fin	\$13,621	\$0
643	BID		No 3.1.2.26	100%	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		\$0 Fin	\$0	\$0
653	BID		No 3.1.2.27	100%	Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	39 días	lun 06/11/17	vie 29/12/17	lun 06/11/17	vie 29/12/17		\$4,084 Fin	\$4,084	\$0
665	BID		No 3.1.2.28	29%	Proceso de Adquisición: 1 vehículo tipo Pick Up para la comunicación entre Santa Eulalia y la Aldea Ixquisis, para uso de los Jueces	63 días	mar 02/01/18	jue 29/03/18	mar 02/01/18		NOD	\$25,000 Fin	\$0	\$0
666			No 3.1.2.28.1	31%	Etapa de Adquisición:	58 días	mar 02/01/18	jue 22/03/18	mar 02/01/18		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
667			No 3.1.2.28.1.1	100%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	11 días	mar 02/01/18	mar 16/01/18	mar 02/01/18	mar 16/01/18		\$0 Fin	\$0	\$0
668			No 3.1.2.28.1.2	100%	Especificaciones revisados	2 días	mié 17/01/18	jue 18/01/18	mié 17/01/18	jue 18/01/18	667	\$0 Fin	\$0	\$0
669			No 3.1.2.28.1.3	100%	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	vie 19/01/18	jue 25/01/18	vie 19/01/18	jue 25/01/18	668	\$0 Fin	\$0	\$0
670	A		No 3.1.2.28.1.4	0%	Publicación / Invitación	5 días	vie 26/01/18	jue 01/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
671			No 3.1.2.28.1.5	0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	10 días	vie 02/02/18	jue 15/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
672			No 3.1.2.28.1.6	0%	NOB evaluación	5 días	vie 16/02/18	jue 22/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
673	F		No 3.1.2.28.1.7	0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	10 días	vie 23/02/18	jue 08/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
674			No 3.1.2.28.1.8	0%	Entrega del Equipo	10 días	vie 09/03/18	jue 22/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
675	BID		No 3.1.2.28.2	0%	Etapa de Ejecución de pagos:	5 días	vie 23/03/18	jue 29/03/18		NOD	NOD	\$25,000 Fin	\$0	\$0
676	BID		No 3.1.2.28.2.1	0%	Pago 1	5 días	vie 23/03/18	jue 29/03/18		NOD	NOD	\$25,000 Fin	\$0	\$0
677	BID		No 3.1.2.29	10%	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora	39 días	lun 19/02/18	vie 13/04/18	lun 19/02/18		NOD	\$10,000 Fin	\$0	\$0
678			No 3.1.2.29.1	12%	Etapa de Adquisición:	34 días	lun 19/02/18	vie 06/04/18	lun 19/02/18		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
679			No 3.1.2.29.1.1	100%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 19/02/18	jue 22/02/18	lun 19/02/18	jue 22/02/18		\$0 Fin	\$0	\$0
680			No 3.1.2.29.1.2	0%	Especificaciones revisados	3 días	vie 23/02/18	mar 27/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
681			No 3.1.2.29.1.3	0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	5 días	mié 28/02/18	mar 06/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
682	A		No 3.1.2.29.1.4	0%	Publicación / Invitación	5 días	mié 07/03/18	mar 13/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
683			No 3.1.2.29.1.5	0%	Ofertas recibidas	3 días	mié 14/03/18	vie 16/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
684			No 3.1.2.29.1.6	0%	Apertura	1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
685			No 3.1.2.29.1.7	0%	Evaluación y recomendación adjudicación	5 días	mar 20/03/18	lun 26/03/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
686			No 3.1.2.29.1.8	0%	NOB evaluación	5 días	mar 27/03/18	lun 02/04/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
687	F		No 3.1.2.29.1.9	0%	Firma de contrato	3 días	mié 04/04/18	vie 06/04/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
688	BID		No 3.1.2.29.2	0%	Etapa de Ejecución de pagos:	5 días	lun 09/04/18	vie 13/04/18		NOD	NOD	\$10,000 Fin	\$0	\$0
689	BID		No 3.1.2.29.2.1	0%	Pago 1	5 días	lun 09/04/18	vie 13/04/18		NOD	NOD	\$10,000 Fin	\$0	\$0
690	BID		No 3.1.3	92%	Personal de la Unidad Coejecutora	1204 días	mar 16/07/17	vie 30/03/18	mar 16/07/17		NOD	\$72,863 Fin	\$68,160	\$0
691	BID		No 3.1.3.1	100%	Proceso de Contratación: Especialista en planificación	158 días	vie 29/11/17	mar 08/07/18	vie 29/11/17	mar 08/07/18		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
704	BID		No 3.1.3.2	100%	Proceso de Contratación: Especialista en planificación	118 días	jue 07/07/16	lun 26/12/16	jue 07/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
717	BID		No 3.1.3.3	100%	Proceso de Contratación: Especialista en infraestructura	203 días	mar 16/07/17	jue 24/04/18	mar 16/07/17	jue 24/04/18		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
730	BID		No 3.1.3.4	100%	Proceso de contratación: Contable financiero 2015	244.88 días	mar 06/01/17	mié 23/12/17	mar 06/01/17	mié 23/12/17		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
753	BID		No 3.1.3.5	100%	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	238 días	vie 22/01/16	jue 22/12/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
768	BID		No 3.1.3.6	100%	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	273 días	lun 21/11/16	mar 19/12/17	lun 21/11/16	mar 19/12/17		\$15,545 Fin	\$15,545	\$0
786	BID		No 3.1.3.7	7%	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2018	278 días	mié 01/03/17	vie 30/03/17	mié 01/03/17		NOD	\$4,704 Fin	\$0	\$0

19: 20: 21

Project: PEP_SMART_1905,0	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
Date: mié 07/03/18	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	3	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	4	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		



Id	Fuente	PMR/P/Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acum Costo Real	Anticipo
787			No 3.1.3.7.1	23%	Etapas de Adquisición:	26 días	lun 11/12/17	mar 16/01/18	lun 11/12/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0
788			No 3.1.3.7.1.1	100%	Solicitud de Recontratación	2 días	lun 11/12/17	mar 12/12/17	lun 11/12/17	mar 12/12/17		\$0 Fin	\$0	\$0
789	NO		No 3.1.3.7.1.2	100%	No Objeción a recontratación	4 días	mié 13/12/17	lun 18/12/17	mié 13/12/17	lun 18/12/17	788	\$0 Fin	\$0	\$0
790	F		No 3.1.3.7.1.3	0%	Contratación	20 días	mar 19/12/17	mar 16/01/18	mar 19/12/17		NOD 789	\$0 Fin	\$0	\$0
791	BID		No 3.1.3.7.2	0%	Etapas de ejecución de pagos	278 días	mié 01/03/17	vie 30/03/18			NOD	\$4,704 Fin	\$0	\$0
792	BID		No 3.1.3.7.2.1	0%	Pago 1 enero	22 días	mié 01/03/17	jue 30/03/17			NOD	\$1,568 Fin	\$0	\$0
793	BID		No 3.1.3.7.2.2	0%	Pago 2 febrero	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18			NOD	\$1,568 Fin	\$0	\$0
794	BID		No 3.1.3.7.2.3	0%	Pago 3 marzo	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18			NOD	\$1,568 Fin	\$0	\$0


19: 20: 20: 21:


Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 07/03/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	J	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	4	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		




Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Francisco Rafael Gonzalez Flores

Aprobado por: (nombre y firma)  Lic. Angel Arnoldo Pineda Ávila / Secretario de Área /
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización 7/3/2018 - 2:19 PM
